

Solicitação de Empenho nº 0719		Ano: 2022
Recurso	_____	
Credor	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	
CNPJ/CPF	03.671.887/0001-38	
Endereço	Av. Doutor Francisco Correa N° 423 APT.101B, Centro – São Lourenço da Mata – PE.	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento – Referente ao 1º BM – cujo o objeto e a contratação de empresa de engenharia para os serviços de Infraestrututa da Usina de Asfalto , neste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	541	
Valor	R\$ 26.350,47 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos)	
Banco	Bradesco -237, Ag 1903, C/c.11.048-5.	
<p>Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Mat.: 48.911</p> <p>Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente Matricula - 48.911</p>		

15.08.22


**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LOURENÇO**

Secretaria da Fazenda

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça Doutor Araújo Sobrinho N° s/n - Centro, CEP 54735-565 - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE TEL.: (81)3525-9437 CNPJ: 11.251.832/0001-05



Número da Nota:

00000541

Competência:

AGO/2022

Data e Hora Emissão:

11/08/2022 11:07:14

Código de Verificação:

IWCZ-X4YLG

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.671.887/0001-38** Inscrição Municipal: **6626**

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP**

Endereço: **AV. DOUTOR FRANCISCO CORREA ,CENTRO. 423 APT.101B**

Município: **SÃO LOURENÇO DA MATA** UF: **PE** CEP: **54735000**

E-mail: **construtorasantaleonor@hotmail.com** TEL: **8196628011**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE PAUDALHO**

Endereço: **AV RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO**

Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO #QTD:1 - V.UIND.:R\$26.350,47 - TOTAL.:R\$26.350,47 - DED.:R\$15.810,28

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.

BOLETIM DE MEDICAO N 01
60% MATERIAIS
40% MAO DE OBRASCO - 237
IA 1903
ENTE - 11.048-5

ATESTO *11/08/22*

SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

U

Engenheiro de M. Filho
Engenheiro Civil
CREA 02065 D / PE
Mat. 41.498

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.350,47

Atividade Prestada:

Código CNAE:

199 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENT**Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.664,04	15.810,28	10.540,19	5,00%	527,01
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.159,42	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)	0,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar N°003/2009.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

613976731653848

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-saoulourenco/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022		Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		CNPJ 03671887/0001-38		Tomador RECURSO PRÓPRIO	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE					
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.					Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.350,47

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento Descrição	Unid	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 6.360,81							R\$ 2.298,96	R\$ 2.298,96	36,14%
1.1	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N.22.	M²	6,00	R\$ 468,17	R\$ 2.809,02									
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2016	M	61,20	R\$ 55,80	R\$ 3.414,96				41,20			R\$ 2.298,96	R\$ 2.298,96	67,32%
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	2,52	R\$ 54,30	R\$ 136,83									
2.0	TRABALHOS EM TERRA:				R\$ 1.548,36							R\$ 829,60	R\$ 829,60	53,58%
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	28,78	R\$ 41,48	R\$ 1.193,78				20,00	20,00		R\$ 829,60	R\$ 829,60	69,49%
2.2	REATERRO AF_10/2017 MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M³	7,12	R\$ 49,80	R\$ 354,58									
3.0	INFRAESTRUTURA:				R\$ 19.636,79									
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	14,75	R\$ 72,64	R\$ 1.071,44									
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	319,91	R\$ 24,54	R\$ 7.850,59									
3.3	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	30,63	R\$ 15,25	R\$ 467,10									
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	19,05	R\$ 537,41	R\$ 10.237,66									
4.0	ESTRUTURA:				R\$ 9.366,54							R\$ 2.999,32	R\$ 2.999,32	32,06%
4.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	27,78	R\$ 171,95	R\$ 4.776,77				3,68	3,68		R\$ 632,77	R\$ 632,77	13,25%
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,99	R\$ 21,81	R\$ 1.962,68				37,00	37,00		R\$ 806,97	R\$ 806,97	41,12%
4.3	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	34,65	R\$ 15,25	R\$ 528,41				11,39	11,39		R\$ 173,69	R\$ 173,69	32,87%

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos ...
Secretaria de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

PREFEITURA DO FAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022		Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021	
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			CNPJ 03671887/0001-38	Tomador RECURSO PRÓPRIO		
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE						
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.					Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.350,47	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento Descrição	Unid	Previsto no Orçamento		Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acum inclui o período
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	3,18	R\$ 556,82	R\$ 2.068,68				2,11	2,11		R\$ 1.385,89	R\$ 1.385,89	66,35%
5.0	PAREDES E REVESTIMENTOS:				R\$ 46.037,91							R\$ 19.392,91	R\$ 19.392,91	42,12%
5.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M²	67,01	R\$ 112,01	R\$ 7.505,79									
5.2	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.	M³	34,58	R\$ 522,78	R\$ 18.077,72				34,20	34,20		R\$ 17.879,07	R\$ 17.879,07	96,90%
5.3	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.	M³	41,17	R\$ 108,40	R\$ 4.462,83				0,74	0,74		R\$ 80,21	R\$ 80,21	1,80%
5.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M³	22,49	R\$ 89,68	R\$ 2.016,90				7,80	7,80		R\$ 699,50	R\$ 699,50	34,68%
5.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	256,23	R\$ 4,63	R\$ 1.186,34				15,61	15,61		R\$ 72,27	R\$ 72,27	6,09%
5.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	256,23	R\$ 42,40	R\$ 10.864,14				15,61	15,61		R\$ 661,86	R\$ 661,86	6,09%
5.7	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERÂMICA ESMALTADA 45X45CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	41,55	R\$ 46,31	R\$ 1.924,18									
6.0	PISOS:				R\$ 11.943,04							R\$ 829,68	R\$ 829,68	6,95%
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_09/2017	M²	4,61	R\$ 801,12	R\$ 2.771,16				0,59	0,59		R\$ 354,66	R\$ 354,66	12,80%
6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	72,30	R\$ 34,15	R\$ 2.469,04				13,91	13,91		R\$ 475,02	R\$ 475,02	19,24%

Lucas Cândido Gorzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 18.993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat. 41.436

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos F. de M. S. Araújo
Secretaria de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente
Mat. 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022	Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			CNPJ 03671887/0001-38	Tomador RECURSO PRÓPRIO
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.360,47

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M²	111,38	R\$ 60,18	R\$ 6.702,84									
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 3.800,49									
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	101,00	R\$ 29,80	R\$ 3.009,80									
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	18,50	R\$ 42,74	R\$ 790,69									
8	COBERTA / FORRO				R\$ 9.113,99									
8.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	33,00	R\$ 64,64	R\$ 2.133,12									
8.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IQAMENTO. AF_07/2019	M²	33,00	R\$ 87,64	R\$ 2.892,12									
8.3	FORRO EM PLAÇAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M²	111,38	R\$ 36,71	R\$ 4.068,75									
9	ESQUADRIAS:				R\$ 5.961,66									
9.1	ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.	M²	7,35	R\$ 620,87	R\$ 4.563,39									
9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,00	R\$ 405,77	R\$ 1.217,31									
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,36	R\$ 586,00	R\$ 210,96									
10.0	PINTURA:				R\$ 12.509,27									
10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	269,74	R\$ 14,13	R\$ 3.811,42									
10.2	PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR DE PAREDE.	M2	269,74	R\$ 19,97	R\$ 5.366,71									

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça-Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.198

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos S. Gouveia
Secretaria de Meio Ambiente
Mat.: 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022	Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA		CNPJ 03671887/0001-38	Tomador RECURSO PRÓPRIO	
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.350,47

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
10.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	8,82	R\$ 14,70	R\$ 129,64									
10.4	PINTURA COM VERNIZ ACRILICO, TRES DEMAOS, SOBRE TIJOLO NATURAL OU CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, UMA DEMA0.	M²	157,50	R\$ 20,20	R\$ 3.181,50									
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 34.870,78									
11.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	7,00	R\$ 156,42	R\$ 1.064,94									
11.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	10,00	R\$ 218,22	R\$ 2.182,20									
11.3	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, DE LED 36 W - 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20,00	R\$ 109,64	R\$ 2.192,80									
11.4	REFLETOR LED 200W FRI0, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 1950lm, PROTEÇÃO IP65 (SEE).	UND	15,00	R\$ 602,03	R\$ 9.030,45									
11.5	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	150,00	R\$ 19,80	R\$ 2.970,00									
11.6	FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO COM 1,90M.	UND	5,00	R\$ 107,10	R\$ 535,50									
11.7	POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPL0 T, 300/12, COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO DE 1,80 M, INCLUSIV ECOLÓGICO.	UND	5,00	R\$ 1.194,92	R\$ 5.974,60									
11.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA, INCLUSIVE FITA METALICA E PRESILHA PARA INSTALACAO DAS CAIXAS EM POSTE (PADRAO CELPE) SEM DISJUNTOR.	UND	1,00	R\$ 340,33	R\$ 340,33									
11.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 1.362,28	R\$ 1.362,28									

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE/181993558-2

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.499

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro dos Santos
Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022	Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			CNPJ 03671887/0101-38	Tomador RECURSO PRÓPRIO
CTEF- Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				
CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.360,47

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO ATE 30A,220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	15,00	R\$ 23,23	R\$ 348,45									
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 35 A 50A, 220V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	10,00	R\$ 27,94	R\$ 279,40									
11.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DE 60 A 100A, 380V, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALACAO EM QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UND	4,00	R\$ 150,83	R\$ 603,32									
11.13	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UM KA (TIPO AC)	UND	2,00	R\$ 187,33	R\$ 374,66									
11.14	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO.	UND	2,00	R\$ 184,55	R\$ 369,10									
11.15	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	250,00	R\$ 25,92	R\$ 6.460,00									
11.16	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M, SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE ESPESSURA, PAREDES EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CON CRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E REATERRO.	UND	5,00	R\$ 146,55	R\$ 732,75									
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 3.462,64									
12.1	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	Pt	4,00	R\$ 79,50	R\$ 318,00									
12.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.50 MM, PARA VENTILACAO DE ESGOTO.	M	15,00	R\$ 21,16	R\$ 317,40									
12.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDAVEIS, DIAM.100 MM, PARA COLUNAS DE ESGOTO, VENTILACAO OU AGUAS PLUVIAIS.	M	15,00	R\$ 35,29	R\$ 529,35									
12.4	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	Pt	1,00	R\$ 113,44	R\$ 113,44									

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022	Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA			CNPJ 03671887/0001-38	Tomador RECURSO PRÓPRIO
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE				
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.350,47

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.5	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	Pt	1,00	R\$ 106,11	R\$ 106,11									
12.6	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	Pt	2,00	R\$ 101,87	R\$ 203,74									
12.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UND	1,00	R\$ 454,36	R\$ 454,36									
12.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR,NAS DIMENSOES 15 X 15 CM.	UND	1,00	R\$ 48,29	R\$ 48,29									
12.9	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	0,28	R\$ 361,02	R\$ 101,08									
12.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DIM 42X32,5CM, DE LOUCA BRANCA, CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE ACESSORIOS CORRESPONDENTES.	UND	1,00	R\$ 160,66	R\$ 160,66									
12.11	FORNECIMENTO DE TORNEIRA DE PRESSAO PARA LAVATORIO, COM ACABAMENTO CROMADO, DIAM.1/2" REF.1190 C-40 DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00	R\$ 144,54	R\$ 144,54									
12.12	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00	R\$ 37,25	R\$ 37,25									
12.13	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF. 1509, LINHA ASCOT, FABRIMAR OU SIMILAR, DIAM. 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00	R\$ 96,10	R\$ 96,10									
12.14	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR O SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00	R\$ 93,21	R\$ 93,21									
12.15	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PLASTICO, DIAM. 1/2 POL. TIGRE OU SIMILAR, INCLUSIVE FIXACAO.	UND	1,00	R\$ 20,71	R\$ 20,71									

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos
Secretário de Meio Ambiente
Mat.: 48.911

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 01	BM - Data emissão 26/05/2022	BM - Período de referência da medição De 21/03/2022 até 24/05/2022	Nº do CT 065/2021	Data do CT 10/12/2021
Início da obra - data 21/03/2022	Previsão Término obra 19/07/2022	Empresa Contratada CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	CNPJ 03671887/0001-38		Tomador RECURSO PRÓPRIO	
CTEF - Valor total inicial (R\$) R\$ 172.000,00	CTEF - dt assinatura 10/12/2021	Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE				
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 145.649,53	CT-Dt último Adit.	Local da obra (Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 26.350,47

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
12.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	32,00	R\$ 15,94	R\$ 510,08									
12.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNAS DE AGUA.	M	12,00	R\$ 17,36	R\$ 208,32									
13	DESTINO FINAL DE ESGOTO:				R\$ 6.427,13									
13.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UND	1,00	R\$ 5.518,47	R\$ 5.518,47									
13.2	CAIXA COLETORA DE INSPECAO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, DIMENSÕES INTERNAS 0,50 X 0,50 M, COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.	UND	2,00	R\$ 454,33	R\$ 908,66									
14	DIVERSOS:				R\$ 950,60									
14.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA (POR METRO QUADRADO DE CONSTRUÇÃO) (SEE).	m²	485,00	R\$ 1,96	R\$ 950,60									
BDI (26,36%) INCLUSOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS														
TOTAIS					R\$ 172.000,00						R\$ 26.350,47	R\$ 26.350,47		

Observações

Prefeitura de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.936

Carlos Henrique Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Nome:

Cargo:

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Nome:

Cargo:

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 131993558-2

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome:

Cargo:



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE.
BOLETIM: 01



Item: 2.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. **SAPATAS PARA PILARES MÓVEIS DA USINA**



Item: 2.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. **SAPATAS PARA PILARES MÓVEIS DA USINA**



Item: 2.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. **BASE PARA MURO DA RAMPA**



Item: 2.1 ESCAVACAO MANUAL EM TERRA ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO. **BASE PARA MURO DA RAMPA**

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandério de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 4.408

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

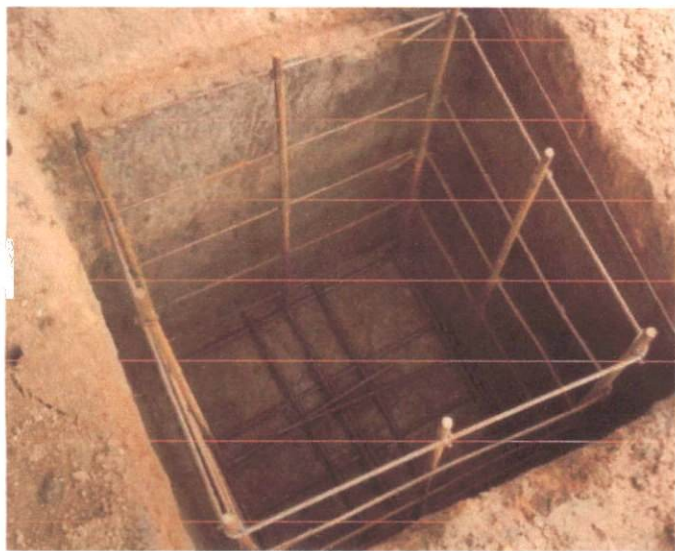
RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE.
BOLETIM: 01



Item 4.1 FABRICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
PILARES DA USINA



Item 4.1 FABRICAÇÃO, FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
PILARES DA USINA



Item: 4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015
PILARES DA USINA



Item: 4.3 AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO
PILARES DA USINA

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181393558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.436

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pimenta de Jesus Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE.
BOLETIM: 01



Item: 4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
PILARES DA USINA

Item: 4.4 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
PILARES DA USINA



Item: 5.2; ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.
BASE DA RAMPA

Item: 5.2; ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.
BASE DA RAMPA

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181.993.558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 48.911

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911



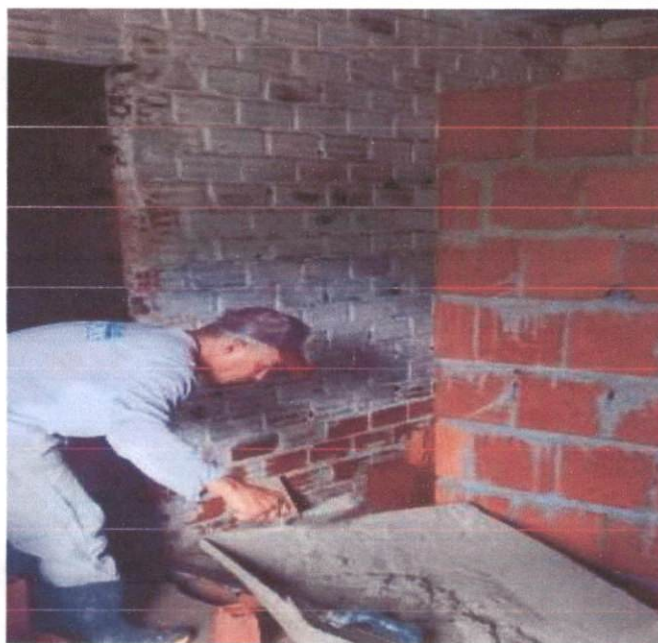
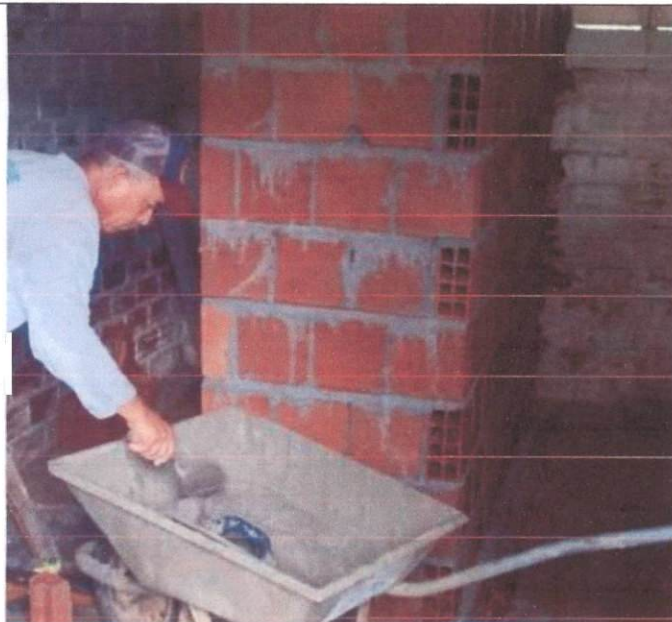
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE.
BOLETIM: 01



Item: 5.2; ALVENARIA EM PEDRA RACHAO
ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.
BASE DA RAMPA

Item: 5.2; ALVENARIA EM PEDRA RACHAO
ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6.
BASE DA RAMPA



Item: 5.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
BANHEIRO DO ESCRITÓRIO

Item: 5.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA
DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
BANHEIRO DO ESCRITÓRIO

Lucas Cândido Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA-PE 184.993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE 184.993558-2

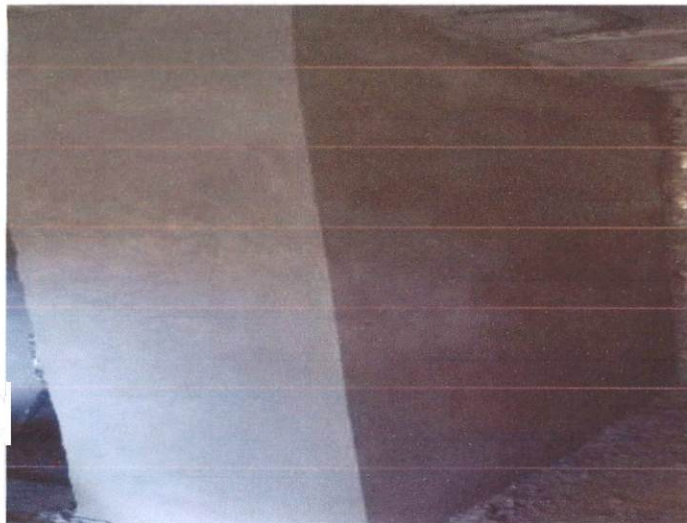
ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Fritzen de Sousa
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911



PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

RELATÓRIO GRÁFICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE
PAUDALHO/PE.
BOLETIM: 01



Item: 5.6; MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
BANHEIRO DO ESCRITÓRIO

Item: 6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017
LASTRO PILARES DA USINA



Item: 6.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017

Item: 6.2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

LASTRO DA CALÇADA DO ESCRITÓRIO

Jucas Cavalcão Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE R1 993558-2

Erick Andrade de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
CREA-PE R1 993558-2

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Figueira dos Santos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

MEMÓRIA DE CALCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES:										
1.0										
1.2	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M						
			LOCAÇÃO RAMPA		41,20					41,20
									TOTAL	41,20
TRABALHOS EM TERRA:										
2.0										
2.1	EMLURB	05.01.010	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³						
			SAPATAS PARA PILARES DA USINA		0,80	0,70	0,65		8	2,91
			MURO DE ARRIMO PARA RAMPA		17,30	0,70	0,6		2	14,53
			MURO DE ARRIMO PARA RAMPA		5,60	0,70	0,6			2,35
			ESCAVAÇÃO DA BASE DO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		2,05	0,30	0,2			0,12
			ESCAVAÇÃO DA BASE DO BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		1,66	0,30	0,2			0,09
									TOTAL	20,00
ESTRUTURA:										
4.0										
4.1	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²						
			PILARES DA USINA (comprimento 0,55x2 + 0,6x2)		2,30		0,20		8,00	3,68
									TOTAL	3,68
4.2	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG						
			FERRAGENS PILARES DA USINA					37,00		37,00
									TOTAL	37,00
4.3	SINAPI	43061	ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG						
			PILARES DA USINA (5 estribos de 1,85m em cada sapata) (taxa de 0,154 kg/m da barra de 5mm) ESTRIBOS		9,25			8,00	0,154	11,39
									TOTAL	11,39
4.4	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³						
			PILARES DA USINA		0,60	0,55	0,8		8	2,11
									TOTAL	2,11
PAREDES E REVESTIMENTOS:										
5.0										
5.2	EMLURB	07.01.005	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO ASSENTADA E REJUNTA DA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6.	M³						
			BASE DA RAMPA		17,30	0,70	0,60		2	14,53
			BASE DA RAMPA		5,60	0,70	0,60			2,35
			ELEVACÃO DA RAMPA LADO ESQUERDO		10,20	0,70	1,80			12,85
			ELEVACÃO DA RAMPA LADO ESQUERDO		7,10	0,70	0,90			4,47
									TOTAL	34,20
5.3	EMLURB	07.01.185	ALVENARIA DE TUIOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 - 1 VEZ.	M²						
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		2,05		0,20			0,41
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		1,66		0,20			0,33
									TOTAL	0,74
5.4	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²						
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		2,05		2,50			5,12
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		1,66		2,50			4,15
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		-0,70		2,10			-1,47
									TOTAL	7,80
5.5	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²						
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		2,05		2,50		2	10,25
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		1,66		2,50		2	8,30
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		-0,70		2,10		2	-2,94
									TOTAL	15,61
5.6	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	M²						
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		2,05		2,50		2	10,25
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		1,66		2,50		2	8,30
			BANHEIRO DO ESCRITÓRIO		-0,70		2,10		2	-2,94
									TOTAL	15,61
PISOS										
6.0										
6.1	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M³						
			SAPATAS PARA PILARES MÓVEIS DA USINA		0,80	0,60	0,05		8	0,19
			LASTRO DA CALÇADA DO ESCRITÓRIO		8,20	1,05	0,03			0,25
			LASTRO DA CALÇADA DO ESCRITÓRIO		5,05	1,05	0,03			0,15
									TOTAL	0,59

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA - PE 181993558-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. nº 390

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Matr.: 48.911

MEMÓRIA DE CALCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
6.2	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²						
			LASTRO DA CALÇADA DO ESCRITÓRIO		8,20	1,05				8,61
			LASTRO DA CALÇADA DO ESCRITÓRIO		5,05	1,05				5,30
									TOTAL	13,91

Prefeitura Municipal do Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 33.118 D/PE

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente
Mat.: 48.911

Lucas Cândido Gonzaga
Engenheiro Civil
CREA-PE 181993558-2

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CONSULTTAB - ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LT:00729550000146 ,

Seu arquivo SEFIP.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 às 17:04:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB9DD43EB08546C5.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CONSULTTAB - ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LT:00729550000146
Inscrição Transmissor:	00.729.550/0001-46
Responsável:	CONSULTTAB LTDA
Inscrição Responsável:	00.729.550/0001-46
Competência:	05/2022
NRA:	Ok1pyks4LYg00000
Base de Processamento:	PE - Sao Lourenco da Mata
Código de Recolhimento:	155
Contato:	MARCOS ANTONIO CANCI
Telefone:	008135194512

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP (00369) Página : 00011
 End. : AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA, 423 SALA 101 B CNPJ/CEI: 03.671.887/0001-38
 Ref.: 01/05/2022 a 31/05/2022 Dpto : USINA DE ASFALTO

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000140	JHONE FRANCISCO DA SILVA		1.460,80	Função :SERVENTE Admissão : 16/05/2022			Livro: 0000 Folha.: 140 Dep IR : 1 Dep SF : 1
001	Salário Base	000:15		730,40			
599	Salário Família	001,00		28,24			
998	Insuficiência de Saldo			54,78			
606	Adiantamento				730,40		
903	INSS Folha				54,78		
				813,42	785,18	*****28,24	

Base INSS: 730,40 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 730,40 (Valor: 58,43) Base IRRF Folha: 486,03

000139	JOSE AMARO GOMES FILHO		1.940,40	Função :PEDREIRO Admissão : 16/05/2022			Livro: 0000 Folha.: 139 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	000:15		970,20			
998	Insuficiência de Saldo			72,76			
606	Adiantamento				970,20		
903	INSS Folha				72,76		
				1.042,96	1.042,96	*****0,00	

Base INSS: 970,20 (Aliq.: 7,5%) Base FGTS: 970,20 (Valor: 77,61) Base IRRF Folha: 897,44

000014	JOSE RENATO DA SILVA		4.559,41	Função :MESTRE DE OBRA Admissão : 01/08/2018			Livro: 0000 Folha.: 014 Dep IR : 0 Dep SF : 0
001	Salário Base	000:30		4.559,41			
606	Adiantamento				2.279,70		
903	INSS Folha				474,49		
914	IRRF Folha				282,98		
				4.559,41	3.037,17	*****1.522,24	

Base INSS: 4.559,41 (Aliq.: 10,4068%) Base FGTS: 4.559,41 (Valor: 364,75) Base IRRF Folha: 4.084,92

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****6.415,79	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****4.865,31	Total Cotas Sal. Família	1
(=) Total Líquido	*****1.550,48	Total INSS	602,03
		Total FGTS	500,79
		Total IRRF	282,98

"Disciplina é liberdade; Compaixão é fortaleza; Ter bondade é ter coragem"

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP
 COMP: 05/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: USINA DE ASFALTO N° CONTROLE: GqOWNTs0nNJ0000-4
 LOGRADOURO: AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 423 SALA 101 B BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4399199
 CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA UF: PE CEP: 54735-000 TELEFONE: 81-35194512 CNAE: 4399199
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	602,03	0,00	0,00	0,00	602,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.013,59	0,00	0,00	0,00	2.013,59
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.013,59	0,00	0,00	0,00	2.013,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 17:02:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP

INSCRIÇÃO: 03.671.887/0001-38

COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	28.733,09
DEPÓSITO	2.298,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.298,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 17:02:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 35194512
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.733,09	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.671.887/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.298,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.298,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 17:02:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP				02-DDD/TELEFONE (0081) 35194512
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.733,09	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.671.887/0001-38	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.298,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.298,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA ME**Conta de débito:** 0876 / 003 / 00001877-3**Representação numérica do código de barras:**

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

CNPJ/CEI empresa: 03.671.887/0001-38**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/06/2022**Competência:** 05/2022**Valor recolhido:** 2.298,64**Identificação da operação:** FGTS MAI 2022**Data / hora:** 07/06/2022 16:07:42**Data de Débito:** 07/06/2022**Código da operação:** 00557655**Chave de segurança:** PG7QQZPVMXW7YVQ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP INSCRIÇÃO: 03.671.887/0001-38 N° ARQUIVO: Oklpyks4LYg0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: IrbeVkwJylV0000-1
COD REC: 155 COMP: 05/2022

TOMADOR/OBRA : USINA DE ASFALTO INSCRIÇÃO: 900102126472 N° CONTROLE: GqOWNTs0nNJ0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RAUL BANDEIRA 21 CENTRO PAUDALHO 55825000 PE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.260,01	REM SEM 13° SALÁRIO	6.260,01
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	500,79
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.260,01	REM SEM 13° SALÁRIO	6.260,01
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	602,03	DEPÓSITO	500,79
VAL DEVIDO PREV SOC	2.013,59	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP
 COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: USINA DE ASFALTO

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 03.671.887/0001-38

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 900102126472

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JHONE FRANCISCO DA SILVA			167.59767.76-5		16/05/2022	01	01		07170
730,40	0,00		0,00		54,78			58,43	0,00
JOSE AMARO GOMES FILHO			123.18156.14-1		16/05/2022	01	01		07152
970,20	0,00		0,00		72,76			77,61	0,00
JOSE RENATO DA SILVA			122.38803.44-2		01/08/2018	01			07102
4.559,41	0,00		0,00		474,49			364,75	0,00
<hr/>									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.260,01	0,00	0,00		602,03			500,79	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000226 986401802200 607665200809 367188700013

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: USINA DE ASFALTO

FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: GqQWNTs0nNJ0000-4

LOGRADOURO: AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 423 SALA 101 B
CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA UF: PE CEP: 54735-000

Nº ARQUIVO: Ok1pyks4LYg0000-0
INSCRIÇÃO: 03.671.887/0001-38
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900102126472

CNAE PREPONDERANTE 4399199
CNAE: 4399199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.260,01	0,00	6.260,01	0,00
TOTAIS:	3	6.260,01	0,00	6.260,01	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP	FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	Nº ARQUIVO: Ok1pyks4LYg0000-0
COMP: 05/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208					INSCRIÇÃO: 03.671.887/0001-38
TOMADOR/OBRA: USINA DE ASFALTO	Nº DE CONTROLE: GqQWNTs0nNJ0000-4				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 423 SALA 101 B	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE	4399199		
CIDADE: SAO LOURENCO DA MATA	UF: PE	CEP: 54735-000	TELEFONE: 0081 3519 4512	CNAE:	4399199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.013,59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	602,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	28,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.671.887/0001-38
Nome	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA
Período de apuração	05/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	14912882810 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	Sem Movimento	
Contribuição Previdenciária Patronal		
Contribuição para Outras Entidades e Fundos		
IRRF		
COFINS		
PIS		
CSRF		
COSIRF		

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui a inscrição de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou corrigir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam os saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JAILSON JOSE DA SILVA
CPF	743.252.804-72
Telefone	9662-8011

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/06/2022 17:46:45
Nº do recibo de entrega	0000050000055612964

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	CNPJ	03.671.887/0001-38
Período apuração	05/2022	Número do Recibo	5000007098940
Data/Hora da Transmissão	08/06/2022 10:29:19	Identificação da Apuração de Débitos	11968280010 / eSocial 20987908 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOUTOR FRANCISCO CORREIA	Número	423
Complemento	SALA 101 B	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Sao Lourenco Da Mata	UF	PE
CEP	54735000	Telefone	8135190640
Correio Eletrônico	CONSTRUTORASANTALEONOR@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JAILSON JOSE DA SILVA	CPF	74325280472
Telefone	96628011		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	1.066,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.066,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	220,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 220,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	0,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 0,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.04681/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	53,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.09919/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	834,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 834,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.004.23621/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	602,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 602,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.79489/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	156,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 156,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.79507/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	602,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 602,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.68940/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	602,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 602,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.11131/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	113,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.11243/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	137,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 137,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	900095812070	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	474,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 474,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	900102126472	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.013,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.013,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	900042370074	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	156,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 156,45		
Saldo a Pagar	0,00		



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA
CNPJ: 03.671.887/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:44:15 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2022.

Código de controle da certidão: **56BB.DCE0.F959.2039**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2022.000003482427-85

Data de Emissão: 02/06/2022

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 03.671.887/0001-38

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **30/08/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA DR. ARAÚJO SOBRINHO, S/N-CENTRO Telefone: (81)3519-2065 CNPJ: 11.251.832/0001-05

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 31/05/2022

Contribuinte: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP		Inscrição Mercantil: 6626 Sequencial: 3361 Referência Loteamento:
Localização: AV. DOUTOR FRANCISCO CORREA, 423, APT.101B, CENTRO		Cadastro Imobiliário: 1.2245.024.02.0174.005
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 50625
Razão Social: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
03.671.887/0001-38		6626
Código Atividade Principal: 4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Código Atividade Sec.: 0 ATIVIDADE INVÁLIDA	
Início Atividade: 01/03/2000	Validade: 30/07/2022	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

D7F652EDEF334F40FFB6579E4D308A461708555A

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.671.887/0001-38

Razão Social: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA EPP

Endereço: AV DOUTOR FRANCISCO CORREIA 423 SALA 101 B / CENTRO / SAO
LOURENCO DA MATA / PE / 54735-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062000521188464597

Informação obtida em 29/06/2022 09:00:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.671.887/0001-38

Certidão nº: 38476/2022

Expedição: 03/01/2022, às 12:48:21

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.671.887/0001-38**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Data da consulta: 02/06/2022 07:46:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.671.887/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2014**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	24/05/2022	Pág	64
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		56	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO DA CALÇADA							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO TANQUE							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			24/05/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33/118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	23/05/2022	Pág	63
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	57	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	CONCRETO DA CALÇADA						
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO TANQUE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			23/05/2022	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118				

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	22/05/2022	Pág	62
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	58	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados							
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 4.446			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	22/05/2022	

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	21/05/2022	Pág	61	
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		59	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			SABADO		Tarde	B			
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro					
	Carpinteiro		1	Eletricista					
	Pedreiro		4	Pintor					
	Armador		1	Vidraceiro					
	Servente		4	Gesseiro					
Serviços Executados									
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118			21/05/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 4.1498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	20/05/2022	Pág	60
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	60	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEXTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	CONCRETO DA CALÇADA						
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO TANQUE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		20/05/2022

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	19/05/2022	Pág	59
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		61	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			QUINTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO DA CALÇADA							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO TANQUE							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA		19/05/2022
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 4.1496				ERICK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL		

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	18/05/2022	Pág	58
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	62	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B			
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO DA CALÇADA							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO TANQUE							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		
						18/05/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	17/05/2022	Pág	57
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	63	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B			
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO DA CALÇADA							
	REBOCO DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			17/05/2022		


Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	16/05/2022	Pág	56
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		64	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO DA CALÇADA							
	REBOCO DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			16/05/2022		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118					

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL



CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	15/05/2022	Pág 55
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		65	Manhã	B
Horário de Trabalho:			DOMINGO		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados							
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			15/05/2022	


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118


 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	14/05/2022	Pág	54
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	66	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SABADO			Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022			Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador		1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:				
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.496				ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		14/05/2022		
				ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL				

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	13/05/2022	Pág	53
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	67	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEXTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO MURO						
	ATERRO DA CALÇADA						
	REBOCO BANHEIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.456			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		13/05/2022
				 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL			

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	12/05/2022	Pág 52
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		68	Manhã	B
Horário de Trabalho:			QUINTA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados							
	ELEVAÇÃO MURO						
	ATERRO DA CALÇADA						
	REBOCO BANHEIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			12/05/2022	



 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.456


ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118

 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118/D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	11/05/2022	Pág 51
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		69	Manhã	B
Horário de Trabalho:			QUARTA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados	ELEVAÇÃO MURO						
	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA CALÇADA						
	REBOCO BANHEIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			11/05/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	10/05/2022	Pág	50
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	70	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO MURO						
	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA CALÇADA						
	REBOCO BANHEIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		10/05/2022


 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA-PE 33118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	09/05/2022	Pág 49
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		71	Manhã	B
Horário de Trabalho:			SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados	ELEVAÇÃO MURO						
	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DA CALÇADA						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			09/05/2022	

Preteltura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	08/05/2022	Pág	48
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		72	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			DOMINGO		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		08/05/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA-PE 33118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	07/05/2022	Pág	47
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	73	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SABADO		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			07/05/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	06/05/2022	Pág	46
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	74	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEXTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados							
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAMPA						
	CHAPISCO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			06/05/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.493

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	05/05/2022	Pág 45
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		75	Manhã	B
Horário de Trabalho:			QUINTA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados							
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAMPA						
	CHAPISCO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			05/05/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33118/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	04/05/2022	Pág	44
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	76	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAMPA						
	CHAPISCO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			04/05/2022	



Prefeitura de Paudalho
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	03/05/2022	Pág	43
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	77	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B			
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	ATERRO DA RAMPA							
	CHAPISCO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		03/05/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	02/05/2022	Pág	42
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	78	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAMPA						
	ALVENARIA DOS BANHEIROS						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderal de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		02/05/2022
				 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118-D/PE ENGENHEIRO CIVIL			

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA		CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	01/05/2022	Pág	41
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		79	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022			Noite	B		
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro					
	Carpinteiro		1	Eletricista					
	Pedreiro		4	Pintor					
	Armador		1	Vidraceiro					
	Servente		4	Gesseiro					
Serviços Executados	DOMINGO								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			01/05/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderelei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33/118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	30/04/2022	Pág	40
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	80	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SABADO			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	SABADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	30/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.496


ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	29/04/2022	Pág 39
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		81	Manhã	B
Horário de Trabalho:			SEXTA-FEIRA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAPA						
	ELEVAÇÃO DA ALVENARIA BANHAIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 41.498			ERICK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118 D/PE ENGENHEIRO CIVIL			29/04/2022	

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	28/04/2022	Pág	38
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	82	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAPA						
	ELEVAÇÃO DA ALVENARIA BANHAIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:		28/04/2022		
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118				



ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33118/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	27/04/2022	Pág	37
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		83	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			QUARTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	ATERRO DA RAPA							
	ELEVAÇÃO DA ALVENARIA BANHAIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			27/04/2022		


 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vitor de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	26/04/2022	Pág	36
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	84	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAPA						
	ELEVAÇÃO DA ALVENARIA BANHAIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vandenberg de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.496			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		26/04/2022
							

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	25/04/2022	Pág	35
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	85	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	ATERRO DA RAPA						
	CONCRETO MAGRO DA ALVENARIA DO BANEIRO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			25/04/2022	
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118/D/PE ENGENHEIRO CIVIL	

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	24/04/2022	Pág	34
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	86	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	DOMINGO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	24/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL



CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	23/04/2022	Pág	33
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	87	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SABADO			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	SABADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Silva Engenheiro Civil Matr.: 41.436			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		23/04/2022

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	22/04/2022	Pág	32
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	88	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SEXTA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			22/04/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	21/04/2022	Pág	31
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	89	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		QUINTA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:				
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498				ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		21/04/2022		
				 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.178/D/PE ENGENHEIRO CIVIL				

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	20/04/2022	Pág	30
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		90	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			QUARTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO ESCAVAÇÃO DA BASE DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		20/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	19/04/2022	Pág	29
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		91	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
	ESCAVAÇÃO DA BASE DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			19/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 4 488

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	18/04/2022	Pág	28
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	92	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados								
	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO ESCAVAÇÃO DA BASE DA ALVENARIA DO BANHEIRO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		18/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118/D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	17/04/2022	Pág	27
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	93	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B			
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	DOMINGO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		17/04/2022

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA-PE 33118/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	16/04/2022	Pág	26
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	94	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SABADO		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	SABADO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			16/04/2022		

Prefeitura de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.438

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	15/04/2022	Pág	25	
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		95	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			SEXTA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B			
Equipam.									
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição				Quant.		
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				1		
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro						
	Carpinteiro	1	Eletricista						
	Pedreiro	4	Pintor						
	Armador	1	Vidraceiro						
	Servente	4	Gesseiro						
Serviços Executados									
	FERIADO SEXTA-FEIRA SANTA								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118			15/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat:41.498


ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-D/PE
ENGENHEIRO CIVIL


CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	14/04/2022	Pág	25
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	95	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	LIPEZA DO ESCRITORIO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	14/04/2022	



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118-PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	13/04/2022	Pág	24
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	96	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
	LIPEZA DO ESCRITORIO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			13/04/2022	


 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118

 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	12/04/2022	Pág	23
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	97	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.496			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118  ERIK ANDRADE DE MENDONÇA CREA 33.118-D/PE ENGENHEIRO CIVIL		12/04/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	11/04/2022	Pág	22
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		98	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		

Proteitoria Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro CIVIL
Mat: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

11/04/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	10/04/2022	Pág	21
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	99	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	DOMINGO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	10/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat:24.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	09/04/2022	Pág	20
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		100	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SABADO		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	SABADO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		09/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	08/04/2022	Pág	19
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	101	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SEXTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022			Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.				
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1				
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	CONCRETAGEM DOS PILARES							
	EXECUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		08/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.486

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33118-PE/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	07/04/2022	Pág	18
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	102	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	CONCRETAGEM DOS PILARES						
	EXECUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	07/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Mat.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	06/04/2022	Pág	17
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	103	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		QUARTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022			Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição				Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	CONCRETAGEM DOS PILARES							
	EXECUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		06/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 4.1438

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	05/04/2022	Pág	16
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		104	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	CONCRETAGEM DOS PILARES							
	EXECUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			05/04/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	04/04/2022	Pág	15
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	105	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SEGUNDA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022			Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	CONCRETAGEM DOS PILARES							
	EXECUÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		
						04/04/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 41.448

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118-0/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	03/04/2022	Pág	14
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	106	Manhã	B			
Horário de Trabalho:	DOMINGO			Tarde	B			
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	DOMINGO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			03/04/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vandenberg de Mendonça Filho
 Engenheiro CIVIL
 Matr: 41.438

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA-PE 33118
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	02/04/2022	Pág	13
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	107	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		SABADO		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição				Quant.	
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador				1	
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro					
	Carpinteiro	1	Eletricista					
	Pedreiro	4	Pintor					
	Armador	1	Vidraceiro					
	Servente	4	Gesseiro					
Serviços Executados	SABADO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:		Visto Contratada:			ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		02/04/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.496

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	01/04/2022	Pág 12
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		108	Manhã	B
Horário de Trabalho:			SEXTA-FEIRTA		Tarde	B	
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B	
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados	EXECUÇÃO BASE DO MURO DE ARRIMO						
	ARMAÇÃO DOS PILARES						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		01/04/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 14146

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	31/03/2022	Pág	11
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		109	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			QUINTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	EXECUÇÃO BASE DO MURO DE ARRIMO							
	ARMAÇÃO DOS PILARES							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		31/03/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 112.015

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 33.118-PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	30/03/2022	Pág	10
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	110	Manhã	B			
Horário de Trabalho:		QUARTA-FEIRA		Tarde	B			
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B			
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				1
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	EXECUÇÃO BASE DO MURO DE ARRIMO							
	CONCRETO MAGRO DAS SAPATAS							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		30/03/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.428

ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118-D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS					
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA		CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	29/03/2022	Pág	9
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		111	Manhã	B		
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022			Noite	B		
Equipam.									
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.			
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1			
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro					
	Carpinteiro		1	Eletricista					
	Pedreiro		4	Pintor					
	Armador		1	Vidraceiro					
	Servente		4	Gesseiro					
Serviços Executados	EXECUÇÃO BASE DO MURO DE ARRIMO								
Anotação da Fiscalização									
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			29/03/2022		

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.488

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118-D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	28/03/2022	Pág 8
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	112	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados	ESCAVAÇÃO DE BASE						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			28/03/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderal de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr: 41.436

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	27/03/2022	Pág	7
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		113	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			DOMINGO		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados	DOMINGO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			27/03/2022		



Prefeitura Municipal de Paudalho - PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1490

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 CREA 33.118/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	26/03/2022	Pág 6
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	114	Manhã	B		
Horário de Trabalho:		SABADO		Tarde	B		
Prazo da Obra		19/07/2022		Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro			
	Carpinteiro		1	Eletricista			
	Pedreiro		4	Pintor			
	Armador		1	Vidraceiro			
	Servente		4	Gesseiro			
Serviços Executados	SABADO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			26/03/2022	

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.498

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118 D/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	25/03/2022	Pág	5
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	115	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	SEXTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS						
	ESCAVAÇÃO DA BASE DO MURO DE ARRIMO						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:	 Paulo Vandergal de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498			Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118 		25/03/2022

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS			
Resp. Técnico	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	24/03/2022	Pág	4
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	120	Prazo Restante:	116	Manhã	B		
Horário de Trabalho:	QUINTA-FEIRA			Tarde	B		
Prazo da Obra	19/07/2022			Noite	B		
Equipam.							
Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.			
	Engenheiro	1	Almoxarife/Apontador	1			
	Mestre de Obras/ Encarregado	1	Bombeiro				
	Carpinteiro	1	Eletricista				
	Pedreiro	4	Pintor				
	Armador	1	Vidraceiro				
	Servente	4	Gesseiro				
Serviços Executados	LOCAÇÃO DAS SAPATAS DE APOIO PARA A USINA						
	LOCAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RAMPA DE ACESSO A USINA						
Anotação da Fiscalização							
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:	ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118	24/03/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr:41.438

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118/DIPE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	23/03/2022	Pág	3
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte	
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		117	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			QUARTA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoa	Descrição		Quant.	Descrição			Quant.	
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador			1	
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	LIMPEZA DO TERRENO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:			23/03/2022	

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
 Engenheiro Civil
 Matr.: 41.466

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
 ENG. CIVIL
 CREA-PE 33118
 ERICK ANDRADE DE MENDONÇA
 CREA 33.118-01/PE
 ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	22/03/2022	Pág	2
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		118	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			TERÇA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador				1
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
	Servente		4	Gesseiro				
Serviços Executados								
	LIMPEZA DO TERRENO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		22/03/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 1.133

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118-D/PE
ENGENHEIRO CIVIL

CONTRUTORA SANTA LEONOR				DIÁRIO DE OBRAS				
Resp. Técnico		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA	CREA	CREA-PE 33118-PE	Data:	21/03/2022	Pág	1
Obra :	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA USINA DE ASFALTO NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE				Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		120	Prazo Restante:		119	Manhã	B	
Horário de Trabalho:			SEGUNDA-FEIRA		Tarde	B		
Prazo da Obra			19/07/2022		Noite	B		
Equipam.								
Pessoal	Descrição		Quant.	Descrição		Quant.		
	Engenheiro		1	Almoxarife/Apontador		1		
	Mestre de Obras/ Encarregado		1	Bombeiro				
	Carpinteiro		1	Eletricista				
	Pedreiro		4	Pintor				
	Armador		1	Vidraceiro				
Servente		4	Gesseiro					
Serviços Executados	LIMPEZA DO TERRENO							
Anotação da Fiscalização								
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		ERIK ANDRADE DE MENDONÇA ENG. CIVIL CREA-PE 33118		21/03/2022

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr.: 41.916

ERIK ANDRADE DE MENDONÇA
CREA 33.118 D/PE
ENGENHEIRO CIVIL
