

PREFEITURA DO PAUDALHO		BM - número 18	BM - Data emissão 29/09/2022	BM - Período de referência da medição De 01/09/2022 até 29/09/2022		Nº do CT 033/2020	Data do CT 13/10/2020
Início da obra - data 26/10/2020	Previsão Término obra 16/10/2022	Empresa Contratada GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - EPP			CNPJ 22.594.155/0001-36	Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	
Valor do contrato (R\$) R\$ 616.885,32	Saldo do contrato (R\$) R\$ 3.820,25	Objeto do CTEF ( resumido) SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE					
Medido no período (R\$) R\$ 101.088,26	Acumulado até o período (R\$) R\$ 613.065,07	Local da obra ( Bairro / Município / UF) DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.				Valor Total - Boletim (R\$) R\$ 101.088,26	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Acumulado
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
1.0	PINTURA				R\$ 589.897,26						R\$ 487.610,82	R\$ 99.280,25	R\$ 586.891,07	99,49%
1.1	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M²	16.114,42	R\$ 11,16	R\$ 179.836,92			11.990,37	4.124,05	16.114,42	R\$ 133.812,44	R\$ 46.024,39	R\$ 179.836,83	100,00%
1.2	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M²	12.113,79	R\$ 13,71	R\$ 166.080,06			10.722,83	1.390,96	12.113,79	R\$ 147.009,92	R\$ 19.070,06	R\$ 166.079,98	100,00%
1.3	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRILICA	M²	17.995,21	R\$ 12,30	R\$ 221.341,08			15.414,21	2.581,00	17.995,21	R\$ 189.594,70	R\$ 31.746,30	R\$ 221.341,00	100,00%
1.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M²	2.126,59	R\$ 6,02	R\$ 12.802,07			1.723,48	229,91	1.953,39	R\$ 10.375,30	R\$ 1.384,05	R\$ 11.759,35	91,88%
1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR, AF_08/2014	M²	566,22	R\$ 11,17	R\$ 6.324,67			362,14	94,49	456,63	R\$ 4.045,08	R\$ 1.055,45	R\$ 5.100,53	80,64%
1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M²	1.162,87	R\$ 2,06	R\$ 2.395,51			961,43		961,43	R\$ 1.980,53		R\$ 1.980,53	82,68%
1.7	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_08/2014	M²	715,99	R\$ 1,56	R\$ 1.116,95			508,25		508,25	R\$ 792,85		R\$ 792,85	70,99%
2.0	ITENS INSERIDOS NA 1ª READEQUAÇÃO				R\$ 7.105,00						R\$ 4.482,94	R\$ 1.808,01	R\$ 6.290,95	88,54%
2.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	700,00	R\$ 10,15	R\$ 7.105,00			441,67	176,13	619,80	R\$ 4.482,94	R\$ 1.808,01	R\$ 6.290,95	88,54%
3.0	ITENS INSERIDOS NO 1º REPLANILHAMENTO				R\$ 19.883,06						R\$ 19.883,05		R\$ 19.883,05	100,00%
3.1	PINTURA DE PISO COM RESINA ACRILICA BASE ÁGUA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	M²	1.184,22	R\$ 16,79	R\$ 19.883,06			1.184,22		1.184,22	R\$ 19.883,05		R\$ 19.883,05	100,00%
BDI INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS														
TOTAIS					R\$ 616.885,32						R\$ 511.976,81	R\$ 101.088,26	R\$ 613.065,07	

Observações

Carlos Pinto Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Matr: 4.1.088

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário

Nome:

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

CREA:

CREA:

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36



## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
1.0			PINTURA							
1.1	COMPOSIÇÃO	CP-001	PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	m²					TOTAL	4124,05
COLÉGIO MUNICIPAL DE PAUDALHO - CMP										
			Circulação		6,41	3,80				24,35
			Circulação		2,70		1,00			2,70
			Circulação		6,00	2,55				15,30
			Corredor		29,30	1,80				52,74
			Corredor		29,30		1,30			38,09
			Dedução de janelas			1,50	0,50	7,00	-1,00	-5,25
			Circulação		4,70	3,10				14,57
			Salas de aula		8,80		1,28	2,00	3,00	67,58
			Salas de aula		6,00		1,28	2,00	3,00	46,08
			Dedução de janelas			1,50	0,50	4,00	-3,00	-9,00
			Dedução de portas			0,80	0,50	3,00	-1,00	-1,20
			Salas de aula - teto		8,80	6,00			3,00	158,40
			Salas dos professores		6,10		1,36	2,00		16,59
			Salas dos professores		4,70		1,36	2,00		12,78
			Salas dos professores		6,10	4,70				28,67
			Dedução de janela			1,00	0,50		-1,00	-0,50
			Dedução de janelas			1,00	0,50	2,00	-1,00	-1,00
			Dedução de portas			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Circulação		6,10	3,00				18,30
			Circulação		1,65		1,28	2,00		4,22
			Circulação		2,35		1,28	2,00		6,01
			Circulação		2,35	1,65				3,87
			Pátio coberto em frente à cantina		18,55	12,36				229,27
			Pátio coberto em frente à cantina		16,74		0,62			10,37
			Pátio coberto em frente à cantina		12,36		0,90	6,00		66,74
			Pátio coberto em frente à cantina		14,80		1,26			18,64
			Pátio coberto em frente à cantina		15,00	8,95				134,25
			Pátio coberto em frente à cantina		8,95		1,26	2,00		22,55
			Pátio coberto em frente à cantina		15,00		1,26			18,90
			Pátio coberto em frente à cantina		6,27	4,91				30,78
			Pilares		1,55		1,27	18,00		35,43
			Sala de aula		8,45		1,26	2,00		21,29
			Sala de aula		5,42		1,26	2,00		13,65
			Dedução de janelas			1,00	0,50	4,00	-1,00	-2,00
			Dedução de portas			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Sala de aula		8,45	5,42				45,79
			Sala de aula		5,42	0,90				4,87
			Sala de aula		8,75		1,25	2,00		21,87
			Sala de aula		5,70		1,25	2,00		14,25
			Dedução de janelas			1,00	0,50	2,00	-1,00	-1,00
			Dedução de porta			0,80	0,50		-1,00	-0,40
			Sala de aula - teto		8,75	5,70				49,87
			Patamar da rampa de acesso ao primeiro andar		3,65	3,65				13,32
			Rampa de acesso ao primeiro andar		7,85	2,55				20,01
			Rampa de acesso ao primeiro andar		7,85		1,00	2,00		15,70
			Rampa de acesso ao primeiro andar		2,55		1,00			2,55
			Rampa de acesso ao primeiro andar		1,05		1,00			1,05
			Banheiros do primeiro andar		5,00		0,60	2,00	2,00	12,00
			Banheiros do primeiro andar		2,86		0,60	2,00	2,00	6,86
			Banheiros do primeiro andar		5,00	2,86			2,00	28,60
			Corredor do primeiro andar		29,89	1,85				55,29
			Salas de aula do primeiro andar		8,80		1,25	2,00	5,00	110,00
			Salas de aula do primeiro andar		6,00		1,25	2,00	5,00	75,00
			Dedução de janelas			1,00	0,50	4,00	-5,00	-10,00
			Dedução de porta			0,90	0,50		-5,00	-2,25
			Salas de aula do primeiro andar - teto		8,80	6,00			5,00	264,00
			Sala no primeiro andar		6,10		1,36	2,00		16,59
			Sala no primeiro andar		4,70		1,36	2,00		12,78
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Sala no primeiro andar - teto		6,10	4,70				28,67
			Corredor do primeiro andar		14,60		1,00			14,60
			Corredor do primeiro andar		12,25		1,00			12,25
			Corredor do primeiro andar		5,30		1,00			5,30
			Salas de aula do primeiro andar		8,80		1,25	2,00	5,00	110,00
			Salas de aula do primeiro andar		6,00		1,25	2,00	5,00	75,00
			Dedução de janelas			1,00	0,50	4,00	-5,00	-10,00
			Dedução de porta			0,90	0,50		-5,00	-2,25
			Corredor da escada de acesso ao segundo andar		6,50	1,65				10,72
			Corredor da escada de acesso ao segundo andar		6,50		0,67	2,00		8,71
			Corredor da escada de acesso ao segundo andar		1,65		0,67			1,10
			Sala da direção		4,92		1,10	2,00		10,82
			Sala da direção		2,87		1,10	2,00		6,31
			Sala da direção - teto		4,92	2,87				14,12
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Sala da coordenação		4,90		1,10	2,00		10,78
			Sala da coordenação		2,80		1,10	2,00		6,16
			Sala da coordenação - teto		4,90	2,80				13,72
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Circulação		13,00	2,05				26,65
			Rampa		3,86	2,05				7,91
			Rampa		13,25	2,05				27,16
			Sala de recepção		6,00		1,25			7,50
			Sala de recepção		3,00		1,25	2,00		7,50
			Sala da merenda		6,00		1,25	2,00		15,00
			Sala da merenda		3,00		1,25	2,00		7,50
			Sala		6,00		1,25	2,00		15,00
			Sala		3,00		1,25	2,00		7,50

Cidade de Paudalho - PE  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho-PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES  
Carlos Pinheiro e Rios Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911  
Página 1 de 9

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE



# MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Salas de aula (12 salas)		7,60		1,87	2,00	12,00	341,08
			Salas de aula (12 salas)		6,80		1,87	2,00	12,00	305,18
			Dedução de janelas (12 salas)			1,00	1,00	2,00	-12,00	-24,00
			Dedução de portas (12 salas)			0,80	0,60	1,00	-12,00	-5,76
			Dedução de quadro (12 salas)			4,10	0,60	1,00	-12,00	-29,52
			Salas de aula (12 salas) - teto		7,60	6,80		12,00		620,16
			Salas de aula (4 salas)		6,90		1,87	2,00	4,00	103,22
			Salas de aula (4 salas)		6,90		1,87	2,00	4,00	103,22
			Dedução de janelas (4 salas)			1,00	1,00	2,00	-4,00	-8,00
			Dedução de portas (4 salas)			0,80	0,60	1,00	-4,00	-1,92
			Dedução de quadro (4 salas)			4,10	0,60	1,00	-4,00	-9,84
			Salas de aula (4 salas) - teto		6,90	6,90		4,00		190,44
			Corredor das salas - 1º andar		41,70		1,50			62,55
			Dedução de janelas			1,00	1,00	12,00	-1,00	-12,00
			Dedução de portas			0,80	0,60	6,00	-1,00	-2,88
			Corredor das salas - 1º andar		41,70	1,72				71,72
			Corredor das salas - 1º andar (parede do cobogó)		12,50		1,88			23,50
			Corredor das salas - 1º andar (parede do cobogó)		1,70		1,88			3,19
			Corredor das salas - 1º andar (parede do cobogó)		6,77		1,30			8,80
			Corredor das salas - 1º andar (parede do fim do corredor)		1,72		1,30			2,23
			Circulação dos WCs		3,00		1,20	2,00		7,20
			Circulação dos WCs		1,00		1,20	2,00		2,40
			Dedução de portas			0,70	0,60	2,00	-1,00	-0,84
			WCs		1,90		0,85	2,00		6,46
			WCs		1,40		0,85	2,00		4,76
			Dedução de portas			0,80	0,60	2,00	-1,00	-0,96
			WCs - teto		1,90	1,40				2,66
			Corredor das salas - 1º andar		45,00		1,00			45,00
			Dedução de janelas			1,00	1,00	12,00	-1,00	-12,00
			Dedução de portas			0,80	0,60	6,00	-1,00	-2,88
			Dedução de vão de circulação			1,20	1,30		-1,00	-1,56
			Corredor das salas - 1º andar - teto		45,00	1,85				83,25
			Escada		3,58		2,00	2,00		14,32
			Escada		3,00		2,00	2,00		12,00
			Dedução de vão de circulação			1,20	1,30		-1,00	-1,56
			Escada - teto		3,58	3,00				10,74
			Corredor das salas - 1º andar		19,00		2,50			47,50
			Corredor das salas - 1º andar - teto		19,00	2,00				38,00
			Dedução de porta de grade do auditório			3,30	2,10		-1,00	-6,93
			Corredor das salas - 1º andar		35,90		1,27			45,59
			Corredor das salas - 1º andar - teto		35,90	1,95				70,00
			Rampa de acesso ao 1º andar - teto (dois lances de rampa)		22,00	1,30		2,00		57,20
			Rampa - primeiro lance		19,00		1,00			19,00
			Rampa - embaixo		22,00	1,30				28,60
			Rampa - embaixo		22,00	1,10				24,20
			Salas de aula (10 salas)		6,85		1,60	2,00	10,00	219,20
			Salas de aula (10 salas)		6,50		1,60	2,00	10,00	208,00
			Dedução de portas (10 salas)			0,80	0,60	10,00	-1,00	-4,80
			Dedução de janelas (10 salas, 2 janelas por sala)			1,00	1,00	20,00	-1,00	-20,00
			Dedução de quadro (10 salas)			4,10	0,60	10,00	-1,00	-24,60
			Salas de aula (10 salas) - teto		6,85	6,50		10,00		445,25
			Sala dos professores		6,80		3,10	2,00		42,16
			Sala dos professores		6,80		3,10	2,00		42,16
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de vão de circulação			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de quadro			2,20	1,60		-1,00	-3,52
			Dedução de armário			3,00	1,80		-1,00	-5,40
			Dedução de armário			4,65	1,80		-1,00	-8,37
			Sala dos professores - teto		6,80	6,80				46,24
			Circulação dos WCs		2,40		1,50	2,00		7,20
			Circulação dos WCs		0,90		1,50	2,00		2,70
			Dedução de porta			0,80	0,60	2,00	-1,00	-0,96
			Dedução de vão de circulação			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Circulação dos WCs - teto		2,40	0,90				2,16
			WC Masculino		2,30		1,50	2,00		6,90
			WC Masculino		1,70		1,50	2,00		5,10
			Dedução de porta			0,80	0,60	3,00	-1,00	-1,44
			WC Masculino - teto		2,30	1,70				3,91
			Box do WC masculino		1,30		1,50	2,00	2,00	7,80
			Box do WC masculino		1,10		1,50	2,00	2,00	6,60
			Dedução de porta			0,80	0,60	2,00	-1,00	-0,96
			Box do WC masculino - teto		1,30	1,10		2,00		2,86
			WC Feminino		2,62		1,70	2,00		8,90
			WC Feminino		2,45		1,70	2,00		8,33
			Dedução de porta			0,80	0,60	3,00	-1,00	-1,44
			Dedução de meia parede			2,45	0,50		-1,00	-1,22
			WC Feminino - teto		2,62	2,45				6,41
			Box do WC feminino		1,45		1,76	2,00		5,10
			Box do WC feminino		1,27		1,76	2,00		4,47
			Dedução de porta			0,80	0,60	1,00	-1,00	-0,48
			Dedução de meia parede			1,45	0,50		-1,00	-0,72
			Dedução de meia parede			1,26	0,50		-1,00	-0,63
			Box do WC feminino - teto		1,45	1,27				1,84
			WC Feminino - Box do chuveiro		1,30		1,70	2,00		4,42
			WC Feminino - Box do chuveiro		0,90		1,70	2,00		3,06
			Dedução de porta			0,80	0,60		-1,00	-0,48
			Dedução de meia parede			1,30	0,50		-1,00	-0,65
			Dedução de meia parede			0,90	0,50		-1,00	-0,45
			Sala das impressoras		7,40		3,15	2,00		46,62
			Sala das impressoras		3,30		3,15	2,00		20,79
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Sala das impressoras - teto		7,40	3,30				24,42
			secretaria		6,80		3,15	2,00		42,84

Gildden Empreendimentos e Obras S.R.L. P  
 CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.259

Secretaria de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 46.911

Eduardo Melo de A. Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1818907542/PE



## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Secretaria		3,33		3,15	2,00		20,97
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de prateleira			2,20	0,90		-1,00	-1,98
			Dedução de balcão			4,25	1,00		-1,00	-4,25
			Dedução de janela			2,00	1,00		-1,00	-2,00
			Dedução de armário			1,10	2,60		-1,00	-2,86
			Dedução de armário			1,00	2,15		-1,00	-2,15
			Dedução de vão de circulação			3,10	2,60		-1,00	-8,06
			Secretaria - teto		6,80	3,33				22,64
			Secretaria		3,40		3,15	2,00		21,42
			Secretaria		3,30		3,15	2,00		20,79
			Dedução de armário			2,00	1,80		-1,00	-3,60
			Dedução de porta			0,80	2,10	2,00	-1,00	-3,36
			Dedução de vão de circulação			3,10	2,60		-1,00	-8,06
			Secretaria - teto		3,40	3,30				11,22
			Sala de materiais		4,80		3,15	2,00		30,24
			Sala de materiais		2,90		3,15	2,00		18,27
			Dedução de porta			0,80	2,10	2,00	-1,00	-3,36
			Sala de materiais - teto		4,80	2,90				13,92
			Circulação dos WCs		3,40		3,15	2,00		21,42
			Circulação dos WCs		1,00		3,15	2,00		6,30
			Dedução de porta			0,80	2,10	2,00	-1,00	-3,36
			Dedução de porta			0,70	2,10	2,00	-1,00	-2,94
			Circulação dos WCs - teto		3,40	1,00				3,40
			WCs (Masc e Fem)		2,20		1,20	2,00	2,00	10,56
			WCs (Masc e Fem)		1,70		1,20	2,00	2,00	8,16
			WCs (Masc e Fem) - teto		2,20	1,70		2,00		7,48
			Sala de aula		6,80		3,15	2,00		42,84
			Sala de aula		3,25		3,15	2,00		20,47
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Sala de aula - teto		6,80	3,25				22,10
			Laboratório		6,80		1,40	2,00		19,04
			Laboratório		6,80		1,40	2,00		19,04
			Dedução de porta			0,80	0,50		-1,00	-0,40
			Dedução de quadro			4,10	0,50		-1,00	-2,05
			Laboratório - teto		6,80	6,80				46,24
			Sala de aula		6,80		3,15	2,00		42,84
			Sala de aula		6,80		3,15	2,00		42,84
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de quadro			4,10	1,20		-1,00	-4,92
			Sala de aula - teto		6,80	6,80				46,24
			Corredor das salas de aula - térreo		32,00		1,50			48,00
			Corredor das salas de aula - térreo - teto		32,00	2,00				64,00
			Dedução de portas			0,80	0,60	8,00	-1,00	-3,84
			Dedução de vão de circulação			3,10	1,00		-1,00	-3,10
			Corredor das salas de aula - térreo - fim do corredor		2,00		1,50			3,00
			Corredor das salas de aula - térreo - fim do corredor		3,00		1,50			4,50
			Dedução de porta			0,80	0,50		-1,00	-0,40
			Corredor - térreo		44,50		1,50			66,75
			Corredor - térreo - teto		44,50	2,00				89,00
			Corredor - térreo		25,00		1,45			36,25
			Corredor - térreo - teto		25,00	1,85				46,25
			Corredor - térreo		7,10		1,47			10,43
			Corredor - térreo - pilares		1,20		0,90	6,00		6,48
			Refeitório - teto		13,70	7,00				95,90
			Refeitório - vigas		7,00		1,90	3,00		39,90
			WCs		6,88		1,85	2,00	2,00	50,91
			WCs		3,35		1,85	2,00	2,00	24,79
			WCs - teto		6,88	3,35		2,00		46,09
			Corredor - térreo - teto		19,00	2,00				38,00
			Corredor - térreo		36,00		1,50			54,00
			Corredor - térreo - teto		36,00	2,00				72,00
			Dedução de portas			0,80	0,50	4,00	-1,00	-1,60
			Dedução de janelas			1,00	1,00	8,00	-1,00	-8,00
			Hall de entrada		7,00		1,55	2,00		21,70
			Hall de entrada - teto		7,00	3,20				22,40
			Dedução de janela			2,00	1,00		-1,00	-2,00
			Hall de entrada - viga		6,20		0,50			3,10
<b>ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA</b>										
			Salas de aula (2 salas)		5,70		1,62	2,00	2,00	36,93
			Salas de aula (2 salas)		4,50		1,62	2,00	2,00	29,16
			Salas de aula (2 salas) - teto		5,70	4,50				51,30
			Dedução de porta			1,00	0,50	2,00	-1,00	-1,00
			Salas de aula (6 salas)		6,50		1,90	2,00	6,00	148,20
			Salas de aula (6 salas)		6,00		1,90	2,00	6,00	136,80
			Salas de aula (6 salas) - teto		6,50	6,00			6,00	234,00
			Dedução de portas			0,90	0,50	6,00	-1,00	-2,70
			Dedução de janelas			2,00	1,20	12,00	-1,00	-28,80
			Dedução de quadro			4,50	0,35	6,00	-1,00	-9,45
			Corredor das salas de aula		36,90		1,95			71,95
			Dedução de portas			0,90	0,50	6,00	-1,00	-2,70
			Corredor das salas de aula		24,00		1,99			47,76
			Dedução de portas			0,90	0,50	2,00	-1,00	-0,90
			Corredor da rampa		20,00		0,87	2,00	2,00	69,60
			Corredor das salas do 1º andar		36,40		1,55			56,42
			Corredor das salas do 1º andar - teto		36,40	1,50				54,60
			Dedução de portas			0,90	0,50	6,00	-1,00	-2,70
			Salas de aula (6 salas)		6,50		1,90	2,00	6,00	148,20
			Salas de aula (6 salas)		6,00		1,90	2,00	6,00	136,80
			Salas de aula (6 salas) - teto		6,50	6,00			6,00	234,00
			Dedução de portas			0,90	0,50	6,00	-1,00	-2,70
			Dedução de janelas			2,00	1,20	12,00	-1,00	-28,80

Gildson Empreendimentos e Locações Ltda - L7  
 CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
**Eng. Civil**  
 CREA-PE 084385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho-PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 46.911

Eduardo Mota de A. Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1818907542/PE



# MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL			
			Dedução de quadro			4,50	0,35	6,00	-1,00	-9,45			
			WCs		2,80		1,00	2,00	2,00	11,20			
			WCs		1,95		1,00	2,00	2,00	7,80			
			Pátio da cozinha		13,75		1,90			26,12			
			Dedução de porta			1,00	2,10		-1,00	-2,10			
			Pátio da cozinha		7,10		1,35	2,00		19,17			
			Dedução de porta			1,00	2,10		-1,00	-2,10			
			Salas de aula		6,00		0,72	2,00		8,64			
			Salas de aula		6,00		0,72	2,00		8,64			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janelas			2,00	1,20		-1,00	-2,40			
			Dedução de quadro			4,50	0,40		-1,00	-1,80			
			Sala dos professores		6,00		0,72	2,00		8,64			
			Sala dos professores		3,00		0,72	2,00		4,32			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			WC ao lado da Sala dos professores		1,70		0,90	2,00		3,06			
			WC ao lado da Sala dos professores		1,00		0,90	2,00		1,80			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Coordenação		5,50		0,90	2,00		9,90			
			Coordenação		3,80		0,90	2,00		6,94			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janelas			2,00	1,20		-1,00	-2,40			
			Recepção		6,00		0,70	2,00		8,40			
			Recepção		6,00		0,70	2,00		8,40			
			Dedução de vão de atendimento			2,00	0,40		-1,00	-0,80			
			Hall em frente à sala dos professores		7,50		0,70	2,00		10,50			
			Corredor		3,80		0,70	2,00		5,32			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Rampa de descida		6,20		1,10			6,82			
			Rampa de descida		2,80		1,10			3,08			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Corredor		3,20		1,55			4,96			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Corredor		18,00		1,50			27,00			
			Dedução de portas			0,90	0,50	3,00	-1,00	-1,35			
			Dedução de vão de circulação			1,15	2,10		-1,00	-2,41			
			Corredor		5,50		0,95			5,22			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Sala		6,00		0,70	2,00		8,40			
			Sala		4,60		0,70	2,00		6,44			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Sala		6,80		0,70	2,00		9,52			
			Sala		3,80		0,70	2,00		5,32			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janela			2,00	1,00		-1,00	-2,00			
			Sala		6,80		0,70	2,00		9,52			
			Sala		6,00		0,70	2,00		8,40			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janela			2,00	1,00	2,00	-1,00	-4,00			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janela			2,00	1,00	2,00	-1,00	-4,00			
			Dedução de quadro			4,50	0,40		-1,00	-1,80			
			Sala		7,50		0,80	2,00		12,00			
			Sala		6,80		0,80	2,00		10,88			
			Dedução de porta			0,90	0,50		-1,00	-0,45			
			Dedução de janela			2,00	1,00	2,00	-1,00	-4,00			
			Dedução de quadro			4,50	0,40		-1,00	-1,80			
			WCs		6,00		0,90	2,00	2,00	21,60			
			WCs		3,30		0,90	2,00	2,00	11,88			
			Dedução de vãos de porta			1,00	0,50	2,00	-1,00	-1,00			
			Guarita (interno)		1,80		2,50	2,00		9,00			
			Guarita (interno)		1,80		2,50	2,00		9,00			
			Guarita (interno) - teto		1,80	1,80				3,24			
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68			
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00			
			<b>CEDECOP</b>										
			Hall de circulação - teto		5,12	2,40				12,28			
			Hall de circulação		5,12		2,44	2,00		24,98			
			Hall de circulação		2,40		2,44	2,00		11,71			
			Dedução de vão de circulação			0,85	2,30		-1,00	-1,95			
			Dedução de porta de vidro			1,70	2,10		-1,00	-3,57			
			Dedução de janela			1,50	1,50		-1,00	-2,25			
			Corredor		10,34		0,98	2,00		20,26			
			Dedução de portas			0,80	0,60	3,00	-1,00	-1,44			
			Dedução de vão de circulação			1,50	0,60		-1,00	-0,90			
			Sala 7		3,31		2,80			9,26			
			Sala 7		2,09		2,80	2,00		11,70			
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68			
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00			
			Sala 8		4,09		2,67	2,00		21,84			
			Sala 8		2,07		2,67	2,00		11,05			
			Dedução de portas			0,80	2,10	2,00	-1,00	-3,36			
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00			
			Sala 8 - teto		4,09	2,07				8,46			
			WC - teto		2,15	0,97				2,08			
			WC - teto		2,12	1,35				2,86			
			Cozinha - teto		4,50	4,00				18,00			
			Hall de circulação - teto		2,70	2,16				5,83			
			Hall de circulação		2,87		2,50	2,00		14,35			
			Hall de circulação		2,05		2,50	2,00		10,25			
			Dedução de vão de circulação			1,30	1,80		-1,00	-2,34			
			Dedução de vão de circulação			0,85	2,10		-1,00	-1,78			
			Hall de circulação - teto		2,87	2,05				5,88			
			<b>TOTAL EXECUTADO</b>										<b>8769,11</b>

Gladden Empreendimentos e Locações EIRELI - LTDA  
 CNPJ: 22.594.1135/0001-36

Robley Marcos Lourenço Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 4.498

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 40.011

Eduardo Melo de A. Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1818907542/PE



## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
<b>SALDO DO CONTRATO (PAGO NESTA MEDIÇÃO)</b>										<b>4124,05</b>
<b>QUANTITATIVO EXCEDENTE</b>										<b>4641,06</b>
1.2	SINAPI NOV/19	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²					TOTAL	1390,96
<b>COLÉGIO MUNICIPAL DE PAUDALHO - CMP</b>										
			Grade da entrada		34,00		1,30			44,20
			Grade da entrada (complemento do portão)		2,40		0,85			2,04
			Grades da fachada lateral direita (janelas)			1,50	1,00	18,00		27,00
			Grades da fachada lateral direita (janelas)			2,20	1,30	2,00		5,72
			Grades da fachada lateral direita (janelas)			2,75	1,30			3,57
			Grades das janelas			1,50	1,00	7,00		10,50
			Corredor		29,30		0,20			5,86
			Pilares		1,10		0,20	7,00		1,54
			Parede da área do pátio		9,70		0,20			1,94
			Parede da área do pátio		4,70		0,20			0,94
			Parede da área do pátio		4,70		0,20			0,94
			Salas de aula		8,80		0,20	2,00	3,00	10,56
			Salas de aula		6,00		0,20	2,00	3,00	7,20
			Salas dos professores		6,10		0,20	2,00		2,44
			Salas dos professores		4,70		0,20	2,00		1,88
			Circulação		1,65		0,20	2,00		0,66
			Circulação		2,35		0,20	2,00		0,94
			Portas das salas			0,80	2,10	11,00	2,00	36,96
			Grades das portas das salas			0,90	2,15	11,00		21,28
			Pátio coberto em frente à cantina		16,74		0,20			3,34
			Pátio coberto em frente à cantina		14,80		0,20			2,96
			Portas do banheiro masculino			0,60	2,00	4,00	2,00	9,60
			Portas do banheiro masculino			0,90	2,10	3,00	2,00	11,34
			Portas do banheiro feminino			0,60	2,00	4,00	2,00	9,60
			Portas do banheiro feminino			0,90	2,10	3,00	2,00	11,34
			Grades das portas dos banheiros			1,10	2,15	4,00		9,46
			Pátio coberto em frente à cantina		8,95		0,20	2,00		3,58
			Pátio coberto em frente à cantina		15,00		0,20			3,00
			Pilares		1,55		0,20	18,00		5,58
			Porta da sala de aula			0,80	2,10	2,00		3,36
			Sala de aula		8,45		0,20	2,00		3,38
			Sala de aula		5,42		0,20	2,00		2,16
			Sala de aula		8,75		0,20	2,00		3,50
			Sala de aula		5,70		0,20	2,00		2,28
			Rampa de acesso ao primeiro andar		7,85		0,20	2,00		3,14
			Rampa de acesso ao primeiro andar		2,55		0,20			0,51
			Rampa de acesso ao primeiro andar		1,05		0,20			0,21
			Portas dos banheiros do primeiro andar			0,60	2,00	3,00	4,00	14,40
			Portas dos banheiros do primeiro andar			0,90	2,10	2,00	4,00	15,12
			Corredor do primeiro andar		29,89		0,20			5,97
			Pilares do corredor do primeiro andar		1,20		0,20	11,00		2,64
			Parapeito do corredor do primeiro andar		29,89		0,20			5,97
			Portas das salas do primeiro andar			0,80	2,10	11,00	2,00	36,96
			Grades das portas das salas do primeiro andar			1,10	2,15	11,00		26,01
			Grades das janelas das salas do primeiro andar			1,50	1,10	17,00		28,05
			Corredor do primeiro andar		30,00		0,20			6,00
			Grade no primeiro andar			2,60	1,80			4,68
			Corredor do primeiro andar		12,25		0,20			2,45
			Corredor do primeiro andar		5,30		0,20			1,06
			Salas de aula do primeiro andar		8,80		0,20	2,00	5,00	17,60
			Salas de aula do primeiro andar		6,00		0,20	2,00	5,00	12,00
			Salas de aula do primeiro andar		8,80		0,20	2,00	5,00	17,60
			Salas de aula do primeiro andar		6,00		0,20	2,00	5,00	12,00
			Corredor da escada de acesso ao segundo andar		6,50		0,20	2,00		2,60
			Corredor da escada de acesso ao segundo andar		1,65		0,20			0,33
			Grade da escada		1,25		2,20			2,75
			Sala da direção		4,92		0,20	2,00		1,96
			Sala da direção		2,87		0,20	2,00		1,14
			Sala da coordenação		4,90		0,20	2,00		1,96
			Sala da coordenação		2,80		0,20	2,00		1,12
			Circulação		13,00		0,20			2,60
			Sala de recepção		6,00		0,20			1,20
			Sala de recepção		3,00		0,20	2,00		1,20
			Portas			0,80	2,10	2,00	2,00	6,72
			Sala da merenda		6,00		0,20	2,00		2,40
			Sala da merenda		3,00		0,20	2,00		1,20
			Sala		6,00		0,20	2,00		2,40
			Sala		3,00		0,20	2,00		1,20
<b>ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES</b>										
			Salas de aula (12 salas)		7,60		1,50	2,00	12,00	273,60
			Salas de aula (12 salas)		6,80		1,50	2,00	12,00	244,80
			Dedução de portas (12 salas)			0,80	1,50	1,00	-12,00	-14,40
			Dedução de quadro (12 salas)			4,10	0,60	1,00	-12,00	-29,52
			Pintura das portas das salas de aula			0,80	2,10	12,00		20,16
			Salas de aula (4 salas)		6,90		1,50	2,00	4,00	82,80
			Salas de aula (4 salas)		6,90		1,50	2,00	4,00	82,80
			Dedução de janelas (4 salas)			1,00	1,00	2,00	-4,00	-8,00
			Dedução de portas (4 salas)			0,80	0,60	1,00	-4,00	-1,92
			Dedução de quadro (4 salas)			4,10	0,60	1,00	-4,00	-9,84
			Pintura das portas das salas de aula			0,80	2,10	4,00		6,72
			Corredor das salas - 1º andar		41,70		0,20			8,34
			Dedução de portas			0,80	0,20	6,00	-1,00	-0,96
			Pintura das portas do corredor das salas de aula			0,80	2,10	6,00		10,08
			Corredor das salas - 1º andar (pilares do coberto)		0,36		0,20	5,00		0,36
			Corredor das salas - 1º andar (parede do coberto)				0,20			1,35

Gibden Empreendimentos e Locações EIRELI - LTDA

CNPJ: 22.594.115/0001-26

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE



# MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Corredor das salas - 1º andar (parede do fim do corredor)		1,72		0,20			0,34
			Circulação dos WCs		3,00		0,20	2,00		1,20
			Circulação dos WCs		1,00		0,20	2,00		0,40
			Dedução de portas			0,70	0,20	2,00	-1,00	-0,28
			Pintura de portas			0,70	2,10	2,00		2,94
			WCs		1,90		0,20	2,00	2,00	1,52
			WCs		1,40		0,20	2,00	2,00	1,12
			Dedução de portas			0,80	0,20	2,00	-1,00	-0,32
			Corredor das salas - 1º andar		45,00		0,20			9,00
			Dedução de portas			0,80	0,20	6,00	-1,00	-0,96
			Dedução de vão de circulação			1,20	0,20		-1,00	-0,24
			Escada		3,58		0,20	2,00		1,43
			Escada		3,00		0,20	2,00		1,20
			Dedução de vão de circulação			1,20	0,20		-1,00	-0,24
			Área do corredor - parede da área descoberta		7,00		0,20			1,40
			Corredor das salas - 1º andar		19,00		0,20			3,80
			Pintura da porta de grade do auditório			3,30	3,75			12,37
			Corredor das salas - 1º andar		35,90		0,20			7,18
			Salas de aula (10 salas)		6,85		1,50	2,00	10,00	205,50
			Salas de aula (10 salas)		6,50		1,50	2,00	10,00	195,00
			Dedução de portas (10 salas)			0,80	1,50	10,00	-1,00	-12,00
			Dedução de quadro (10 salas)			4,10	0,60	10,00	-1,00	-24,60
			Pintura das portas das salas de aula (10 salas)			0,80	2,10	10,00		16,80
			Pintura de porta da sala dos professores			0,80	2,10			1,68
			Pintura de grade de ferro da porta da sala dos professores			1,00	2,10			2,10
			Pintura de portas da circulação dos WCs			0,80	2,10	2,00		3,36
			Pintura das portas do WC Masculino			0,80	2,10	3,00		5,04
			Pintura de porta no Box do WC Feminino			0,80	2,10			1,68
			Pintura de porta no WC Feminino - Box do chuveiro			0,80	2,10			1,68
			Pintura de porta da sala das impressoras			0,80	2,10			1,68
			Pintura de balcão na Secretaria			4,25	1,00			4,25
			Pintura de balcão na Secretaria			4,25	0,45			1,91
			Pintura de porta do armário na Secretaria			1,00	2,15			2,15
			Pintura de portas na Sala de Materiais			0,80	2,10	2,00		3,36
			Pintura de portas na Circulação dos WCs			0,80	2,10	2,00		3,36
			Pintura de portas na Circulação dos WCs			0,70	2,10	2,00		2,94
			WCs (Masc e Fem)		2,20		0,20	2,00	2,00	1,76
			WCs (Masc e Fem)		1,70		0,20	2,00	2,00	1,36
			Porta dos WCs (Masc e Fem)			0,80	2,10	2,00		3,36
			Pintura de porta na Sala de Aula			0,80	2,10			1,68
			Laboratório		6,80		0,20	2,00		2,72
			Laboratório		6,80		0,20	2,00		2,72
			Dedução de quadro			4,10	0,20		-1,00	-0,82
			Pintura de porta no Laboratório			0,80	2,10			1,68
			Pintura de porta na Sala de Aula			0,80	2,10			1,68
			Corredor das salas de aula - térreo		32,00		0,20			6,40
			Pintura de portas do corredor das salas de aula - térreo			0,80	2,10	8,00		13,44
			Jardim/Área descoberta		7,00		0,20			1,40
			Jardim/Área descoberta		3,00		0,20			0,60
			Corredor - térreo		44,50		0,20			8,90
			Pintura de grade no Corredor - térreo			1,30	2,00			2,60
			Corredor - térreo		25,00		0,20			5,00
			Corredor - térreo		7,10		0,20			1,42
			Corredor - térreo - pilares		1,20		0,20	6,00		1,44
			WCs		6,88		0,20	2,00	2,00	5,50
			WCs		3,35		0,20	2,00	2,00	2,68
			Pintura de portas nos WCs			0,60	1,85	4,00	2,00	8,88
			Pintura de portas nos WCs			0,80	2,10	2,00	2,00	6,72
			Corredor - térreo		36,00		0,20			7,20
			Dedução de portas			0,80	0,20	4,00	-1,00	-0,64
			Pintura de portas no corredor do térreo			0,80	2,10	4,00		6,72
			Pintura de grade de ferro das portas no corredor do térreo			1,00	2,10	4,00		8,40
			Hall de entrada		7,00		0,20	2,00		2,80
			Pintura do portão de grade principal			3,10	2,60			8,06
			Fachada Frontal		42,00		1,50			63,00
			Fachada Frontal (detalhe das "entradas" da fachada)		0,60		1,50	8,00		7,20
<b>ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA</b>										
			Pintura de portão de grade na mureta divisória da quadra			1,00	1,60			1,60
			Fachada lateral esquerda (bloco menor)		9,40		0,30	2,00		5,64
			Área externa (bloco menor)		19,40		0,30			5,82
			Área externa (bloco menor)		6,05		0,30			1,81
			Salas de aula (2 salas)		5,70		0,20	2,00	2,00	4,56
			Salas de aula (2 salas)		4,50		0,20	2,00	2,00	3,60
			Pintura de porta das salas de aula			1,00	2,10	2,00		4,20
			Salas de aula (6 salas)		6,50		0,20	2,00	6,00	15,60
			Salas de aula (6 salas)		6,00		0,20	2,00	6,00	14,40
			Dedução de quadro			4,50	0,20	6,00	-1,00	-5,40
			Grades das portas			1,10	2,10	6,00		13,86
			Grades das portas			1,00	2,10	5,00		10,50
			Corredor da rampa		20,00		0,20	2,00	2,00	16,00
			Corredor das salas do 1º andar		36,40		0,20			7,28
			Dedução de portas			0,90	0,20	6,00	-1,00	-1,08
			Pintura de portas			0,90	2,10	6,00		11,34
			Salas de aula (6 salas)		6,50		0,20	2,00	6,00	15,60
			Salas de aula (6 salas)		6,00		0,20	2,00	6,00	14,40
			Dedução de quadro			4,50	0,20	6,00	-1,00	-5,40
			Grades de ferro no corredor do 1º andar			5,90	1,20	4,00		28,32
			Portas dos WCs			0,60	1,50	2,00	2,00	3,60
			Portas dos WCs			0,80	2,10	1,00	2,00	3,36
			Corrimão da área da quadra		15,80		0,20			3,16
			Corrimão da área da quadra		0,90		0,20	9,00		1,62
			Grade da subida da rampa			1,20	2,40			2,88

Gíddet Empreendimentos e Locações DIRELL - LTDA

CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira

Eng. Civil

CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Página 6 de 9

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE



## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Grades - Pátio da cozinha			4,50	1,70	3,00		22,95
			Portão de grade - Pátio da cozinha			4,50	3,30			14,85
			Portão de grade - Pátio da cozinha			2,50	3,30			8,25
			Grades - Pátio da cozinha			3,30	1,50	2,00		9,90
			Pátio da cozinha		13,75		0,20			2,75
			Pintura de portas no pátio da cozinha			1,00	2,10	2,00		4,20
			Pintura de grade de ferro das portas no pátio da cozinha			1,20	2,10	2,00		5,04
			Salas de aula		6,00		0,20	2,00		2,40
			Salas de aula		6,00		0,20	2,00		2,40
			Sala dos professores		6,00		0,20	2,00		2,40
			Sala dos professores		3,00		0,20	2,00		1,20
			Porta do WC ao lado da Sala dos professores			0,90	2,10			1,89
			Porta do WC ao lado da Coordenação			0,90	2,10			1,89
			Recepção		6,00		0,30	2,00		3,60
			Recepção		6,00		0,30	2,00		3,60
			Dedução de vão de atendimento			2,00	0,30		-1,00	-0,60
			Hall em frente à sala dos professores		7,50		0,20	2,00		3,00
			Corredor		3,80		0,20	2,00		1,52
			Rampa de descida		6,20		0,20			1,24
			Pintura de porta			0,90	2,10			1,89
			Corredor		3,20		0,20			0,64
			Corredor		18,00		0,20			3,60
			Corredor		5,50		0,20			1,10
			Sala		6,00		0,20	2,00		2,40
			Sala		4,60		0,20	2,00		1,84
			Dedução de porta			0,90	0,20		-1,00	-0,18
			Pintura de porta			0,90	2,10			1,89
			Sala		6,80		0,20	2,00		2,72
			Sala		3,80		0,20	2,00		1,52
			Dedução de porta			0,90	0,20		-1,00	-0,18
			Pintura de porta			0,90	2,10			1,89
			Sala		6,80		0,20	2,00		2,72
			Sala		6,00		0,20	2,00		2,40
			Dedução de porta			0,90	0,20		-1,00	-0,18
			Dedução de quadro			4,50	0,40		-1,00	-1,80
			Pintura de porta			0,90	2,10			1,89
			Sala		7,50		0,20	2,00		3,00
			Sala		6,80		0,20	2,00		2,72
			Dedução de porta			0,90	0,20		-1,00	-0,18
			Dedução de quadro			4,50	0,40		-1,00	-1,80
			Pintura de porta			0,90	2,10			1,89
			Corrimão		39,30		0,20			7,86
			Corrimão		7,00		0,20			1,40
			Corrimão		7,00		0,20			1,40
			Gradil frontal		12,50		1,40			17,50
<b>CEDECOP</b>										
			Portão frontal			2,55	2,10			5,35
			Portão frontal			0,97	2,10			2,03
			Corredor		10,34		1,50	2,00		31,02
			Dedução de portas			0,80	1,50	3,00	-1,00	-3,60
			Dedução de vão de circulação			1,50	1,50		-1,00	-2,25
<b>TOTAL EXECUTADO</b>										<b>2182,03</b>
<b>SALDO DO CONTRATO (PAGO NESTA MEDIÇÃO)</b>										<b>1390,96</b>
<b>QUANTITATIVO EXCEDENTE</b>										<b>791,07</b>
<hr/>										
1.3	COMPOSIÇÃO	CP-002	PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA ACRÍLICA	m²					TOTAL	2581,00
<b>COLÉGIO MUNICIPAL DE PAUDALHO - CMP</b>										
			Muro externo lateral esquerdo	46,50			6,00			279,00
			Muro externo lateral esquerdo	5,32			6,00			31,92
			Dedução de janelas			2,00	1,05	10,00	-1,00	-21,00
			Área externa	30,10		4,40				132,44
			Fachada frontal	18,10			5,45			98,64
			Parede externa das rampas	6,00			2,10			12,60
			Parede externa das rampas	10,60			1,10			11,66
			Rampa de acesso ao primeiro andar	10,60		2,15				22,79
			Rampa de acesso ao primeiro andar	12,68		4,40				55,79
			Dedução de janelas			1,50	1,00	3,00	-1,00	-4,50
			Área externa	7,00		3,95				27,65
			Muro lateral direito (interno)	51,20			1,45			74,24
			Muro lateral direito (externo)	51,20			2,15			110,08
			Pilares	1,10		1,30	7,00			10,01
			Parede de fora do corredor	26,30			3,60			94,68
			Pátio	24,30		4,70				114,21
			Parede da área do pátio	9,70			4,90			47,53
			Parede da área do pátio	16,95			3,65			61,86
			Parede da área do pátio	4,70			2,55			11,98
			Parede da área do pátio	4,70			4,90			23,03
<b>ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES</b>										
			Área do corredor - paredão da área descoberta	7,00			3,00			21,00
			Área do corredor - mureta no corredor	1,37			1,00			1,37
			Área do corredor - mureta no corredor	6,80			1,00			6,80
			Área do corredor - paredão da área descoberta	1,55			2,60			4,03
			Mureta do corredor - área descoberta	34,20			1,25	2,00		85,50
			Mureta do corredor - área descoberta	18,66			1,25	2,00		46,65
			Rampa de acesso ao 1º andar - Pilares - primeiro lance da rampa	0,68			1,80	9,00		11,01
			Rampa de acesso ao 1º andar - Pilares - segundo lance da rampa	0,68			1,80	16,00		19,58
			Rampa - paredão externo	19,00			2,30			43,70
			Rampa - lado externo	22,00			1,60			35,20
			Rampa - lado externo	3,00			2,10			6,30

Gildete Empreendimentos e Locações Ltda  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
**Eng. Civil**  
CREA-PE 034385-L/PE

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Página 7 de 9  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498





## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FORNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Jardim/Área descoberta		7,00		5,60			39,20
			Jardim/Área descoberta		3,00		5,60			16,80
			Jardim/Área descoberta		7,00		4,20			29,40
			Jardim/Área descoberta		3,00		4,20			12,60
			Fachada Frontal		42,00		1,60			67,20
			Fachada Frontal - teto		42,00	2,00				84,00
			Dedução de portão de grade principal			3,10	2,60		-1,00	-8,06
			Fachada Frontal (detalhe das "entradas" da fachada)		0,60		1,60	8,00		7,68
			Fachada Frontal - vigas		1,30		2,00	13,00		33,80
			Fachada Frontal - 1º andar		42,00		3,10			130,20
			Fachada Frontal - 1º andar - teto		42,00	2,00				84,00
			Fachada Frontal - 1º andar (detalhe das "entradas" da fachada)		0,60		3,10	8,00		14,88

### ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA

			Muro dos fundos/lateral - Área externa da quadra		53,50		2,37			126,79
			Muro dos fundos		69,20		2,50			173,00
			Mureta divisória da quadra		9,00		1,70	2,00		30,60
			Dedução de portão de grade			1,00	1,60		-1,00	-1,60
			Parede divisória/fundos do mercado vizinho		19,30		4,50			86,85
			Fachada lateral direita (bloco menor)		27,40		3,40			93,16
			Fachada dos fundos (bloco menor)		25,20		3,40			85,68
			Fachada dos fundos (bloco menor)		6,10		3,40			20,74
			Fachada lateral esquerda (bloco menor)		9,40		2,30	2,00		43,24
			Área externa (bloco menor)		19,40		2,10			40,74
			Área externa (bloco menor)		6,05		3,00			18,15
			Área da quadra - Paredão da rampa de acesso ao 1º andar		24,00		5,00			120,00
			Arquibancada (mureta abaixo da rampa)		22,00		0,90			19,80
			Arquibancada (degraus da arquibancada)		20,00		1,20			24,00
			Mureta da rampa		15,90		1,00			15,90
			Corredor das salas de aula - vigas		1,47		1,20	7,00		12,34
			Área externa da rampa		1,67		5,00			8,35
			Área externa da frente da escola (entrada da escola)		30,50		2,00			61,00
			Área externa da frente da escola (entrada da escola)		2,00		2,00			4,00
			Área externa da frente da escola (entrada da escola)		0,65		2,90			1,88
			Muro de divisão com supermercado		30,00		7,50			225,00
			Guarita		2,20		3,10	2,00		13,64
			Guarita		2,00		3,10			6,20
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00
			<b>TOTAL EXECUTADO</b>							<b>3214,23</b>
			<b>SALDO DO CONTRATO (PAGO NESTA MEDIÇÃO)</b>							<b>2581,00</b>
			<b>QUANTITATIVO EXCEDENTE</b>							<b>633,23</b>

1.4 SINAPI NOV/19 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF\_06/2014 m² TOTAL 229,91

### COLÉGIO MUNICIPAL DE PAUDALHO - CMP

			Patamar da rampa de acesso ao primeiro andar		3,65	3,65			80,00%	10,65
			Rampa de acesso ao primeiro andar		7,85	2,55			70,00%	14,01
			Rampa de acesso ao primeiro andar		7,85		1,00	2,00	70,00%	10,99
			Rampa de acesso ao primeiro andar		2,55		1,00		70,00%	1,78
			Rampa de acesso ao primeiro andar		1,05		1,00		70,00%	0,73
			Corredor do primeiro andar		29,89	1,85			50,00%	27,64

### ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES

			Sala de aula		6,80		3,15	2,00	25,00%	10,71
			Sala de aula		3,25		3,15	2,00	25,00%	5,11
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Corredor - térreo		25,00		1,45		90,00%	32,62
			Corredor - térreo - teto		25,00	1,85			90,00%	41,62

### CEDECOP

			Hall de circulação		5,12		2,44	2,00		24,98
			Hall de circulação		2,40		2,44	2,00		11,71
			Dedução de vão de circulação			0,85	2,30		-1,00	-1,95
			Dedução de porta de vidro			1,70	2,10		-1,00	-3,57
			Dedução de janela			1,50	1,50		-1,00	-2,25
			Sala 7		3,31		2,80			9,26
			Sala 7		2,09		2,80	2,00		11,70
			Dedução de porta			0,80	2,10		-1,00	-1,68
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00
			Sala 8		4,09		2,67	2,00		21,84
			Sala 8		2,07		2,67	2,00		11,05
			Dedução de portas			0,80	2,10	2,00	-1,00	-3,36
			Dedução de janela			1,00	1,00		-1,00	-1,00

**Roney Marcos Lourenço Moreira**  
**Eng. Civil**  
**CREA PE 034385-D-PE**

1.5 SINAPI NOV/19 88417 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF. 06/2014 m² TOTAL 94,49

### ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA ROSA

			Área externa/frente da escola - escada		4,30		1,00	2,00		8,60
			Área externa/frente da escola - rampa		7,00		0,80			5,60
			Área externa/frente da escola - rampa		7,00		0,90			6,30
			Área externa/frente da escola - rampa		3,00		0,50			1,50
			Área externa/frente da escola - rampa		5,60		0,80			4,48
			Área externa/frente da escola - rampa		5,80		1,10			6,38
			Área externa/frente da escola - rampa		1,50		1,50			2,25
			Área externa/frente da escola - rampa		5,40		0,90			4,86
			Área externa/frente da escola - rampa		2,60		0,90			2,34
			Área externa/frente da escola - rampa		4,50		0,60			2,70
			Área externa/frente da escola - rampa		4,50		0,30			1,35

### CEDECOP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA 181000/542/PE



## MEMÓRIA DE CALCULO - 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO

EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TAXA	TOTAL
			Sala 7		3,31		2,80			9,26
			Hall de circulação		2,60		2,50	2,00		13,00
			Hall de circulação - teto		2,60	1,90				4,94
			Hall de circulação		2,70		2,60	2,00		14,04
			Hall de circulação		2,16		2,60	2,00		11,23
			Dedução de vão de circulação			1,30	1,80		-1,00	-2,34
			Dedução de vão de circulação			1,00	2,00		-1,00	-2,00
2.0			ITENS INSERIDOS NA 1ª READEQUAÇÃO							
2.4	SINAPI NOV/19	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²					TOTAL	178,13
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES										
			Calçada da Fachada Frontal		42,00	1,85				77,70
			Dedução de trecho revestido com cerâmica		3,30	1,85			-1,00	-6,10
CEDECOP										
			Piso do jardim na entrada		14,00	2,10				29,40
			Piso do jardim na entrada		4,00	2,60				10,40
			Piso do jardim na entrada		6,30	2,10				13,23
			Piso do início do corredor		3,80	1,80				6,84
			Piso do hall de circulação		5,12	2,40				12,28
			Piso do corredor		10,34	0,84				8,68
			Piso da sala 7		3,31	2,09				6,91
			Piso da sala 8		4,09	2,07				8,46
			Piso do hall de circulação		2,70	2,16				5,83
			Piso do hall de circulação		2,25	2,00				4,50

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.011

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Caldeas Empreendimentos e Locações EIREL - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHÉS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 1: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 2: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 3: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 4: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandertei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE, CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHÊS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 5: Pintura a óleo (item 1.2) e pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 6: Pintura a óleo (item 1.2) e pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal de Paudalho (CMP)



Foto 7: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal de Paudalho (CMP)



Foto 8: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal de Paudalho (CMP)

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo ~~Mota~~ de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1318907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Página 2 de 16

Glídden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 9: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 10: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 11: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).



Foto 12: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal de Paudalho (CMP).

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Finnie dos Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 90377

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 13: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves.



Foto 14: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 15: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 16: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 40.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 4 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020

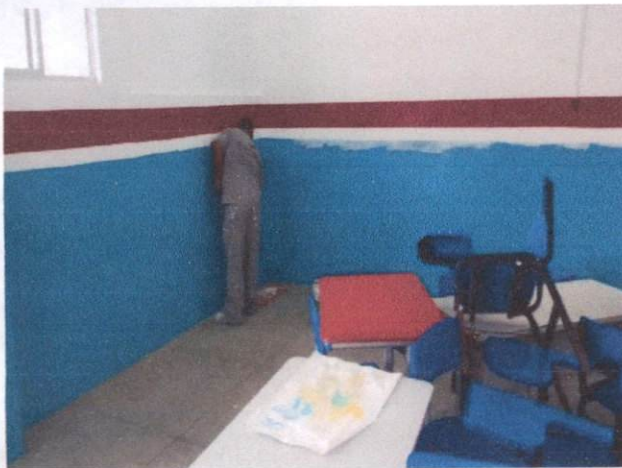


Foto 17: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 18: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 19: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 20: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vasconcelos de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818007642/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 5 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 21: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 22: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 23: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 24: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 6 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI – EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36



**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHÉS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 25: Pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 26: Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 27: Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves



Foto 28: Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 46.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 7 de 16

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 29: Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Tancredo Neves.



Foto 30: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal Tancredo Neves.



Foto 31: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal Tancredo Neves.



Foto 32: Aplicação e lixamento de Massa. (Item 1.4) na Escola Municipal Tancredo Neves.

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Gilberto Augusto dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 8 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Gildden Empreendimentos e Locações EIRELI-EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E URBANISMO

57

Escola Municipal Toninho Mello



Escola Municipal Toninho Mello



Escola Municipal Toninho Mello



Escola Municipal Toninho Mello



EMPRESA:	COMET 25.944.189/0001-28 GRUPO DE ENFERMAGEM E PRODUTOS BIOMÉD - EBF	Nº CONTRATO:	032.3030
LOCAL:	BAURÃO	MEDICAO:	18 DO CONTRATO
CONTRATO DO OBJETO:	SUPORTE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURÃO-PE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS	EMISSÃO DATA:	28/08/2022

Relatório Fotográfico

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Urbanismo



PREFEITURA MUNICIPAL DO BAURÃO

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHÉS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 33: Pintura acrílica em piso (item 2.4) na Escola Municipal Tancredo Neves.



Foto 34: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 35: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 36: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro de Azevedo Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 9 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimento e Locações EIRELI – EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 37: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 38: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 39: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 40: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro dos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHÉS E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 41: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 42: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 43: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 44: Pintura a óleo (item 1.2) e Pintura látex em paredes externas (item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 11 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 45: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 46: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa

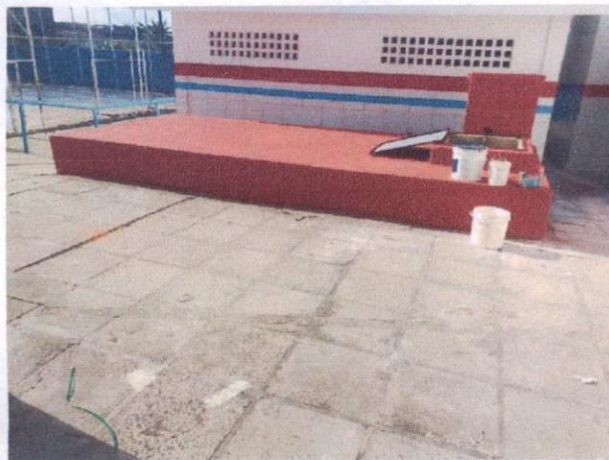


Foto 47: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 48: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 46.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 12 de 16

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA DE EMISSÃO:	DE 29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 49: Pintura látex em paredes externas (Item 1.3) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 50: Aplicação de tinta texturizada (Item 1.5) na Escola Municipal Manoel da Rosa

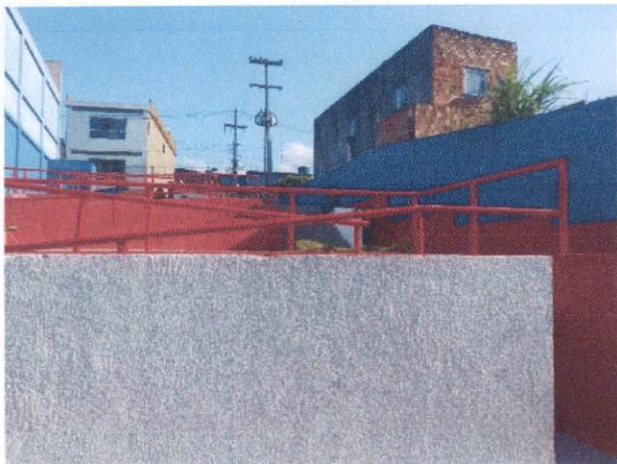


Foto 51: Aplicação de tinta texturizada (Item 1.5) na Escola Municipal Manoel da Rosa



Foto 52: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542 / PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE

Página 13 de 16

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP

CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE



**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº MEDIÇÃO: DA	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 53: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP



Foto 54: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP



Foto 55: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP



Foto 56: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP

Prefeitura Municipal do Paudalho  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos-Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.  
Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Página 14 de 16

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - EPP  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 57: pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP



Foto 58: Pintura látex em paredes internas (item 1.1) e pintura a óleo (item 1.2) no CEDECOP



Foto 59: Aplicação de tinta texturizada (Item 1.5) no CEDECOP



Foto 60: Aplicação de tinta texturizada (Item 1.5) no CEDECOP

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Página 15 de 16

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI- LT7  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

**Relatório Fotográfico**

OBJETO DO CONTRATO	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS, CRECHES E SEUS ANEXOS, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE	DATA EMISSÃO: DE	29/09/2022
LOCAL:	PAUDALHO/PE	Nº DA MEDIÇÃO:	18 DO CONTRATO
EMPRESA:	GLIDDEN EMPREENDIMENTO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP CNPJ: 22.594.155/0001-36	Nº CONTRATO:	033/2020



Foto 61: Pintura acrílica em piso (Item 2.4) no CEDECOP



Foto 62: Pintura acrílica em piso (Item 2.4) no CEDECOP



Foto 63: Pintura acrílica em piso (Item 2.4) no CEDECOP



Foto 64: Pintura acrílica em piso (Item 2.4) no CEDECOP

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Eduardo Melo de A. Lima  
Engenheiro Civil  
CREA 1818907542/PE

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO**

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Página 16 de 16

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - LT  
CNPJ: 22.594.155/0001-36

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA: 03/09/22			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	↓		
		Tarde	↓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Noite			
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.				


Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO	1	ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	1	PINTOR	30
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO	1	OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

Recebemos 15 dias de atraso das pinturas das escolas TARCISO NEVES, CAMP E MANOEL DA ROSA.

Anotação da Fiscalização

CREA-PE 034385-0 PE  
 CNPJ: 22.594.155/0001-36

Visto Fiscalização: \_\_\_\_\_ Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenco Moreir  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-0 PE

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	02/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	+		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	+		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	1	PINTOR	10
	SERVEnte	30	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	iniciados os serviços de raspagem em geral nas partes da escola onde necessita retouros de áreas da escola CMP.

Anotação da Fiscalização	

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - [ ]

CNPJ: 22.594.156/0001-31

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	Roney Marcos Lourenco Eng. Civil
---------------------	-------------------	-------------------------------------

CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderci de Mendouça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

<b>GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI</b>		<b>DIARIO DE OBRAS</b>				
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.</b>		DATA:	03/09/22			
OBRA:	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.</b>		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	↓			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	↓		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite				

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Serviços DE CONSERTO E LIXAMENTO PARA INICIAR AS PINTURAS.

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	CNPJ: 22.594.155/0001-36
---------------------	-------------------	--------------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-07

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	04/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	↓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde		↓	
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	INICIAMOS OS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DA ESCOLA CMP.

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações Eireli  
 CNPJ: 22.846.557/0001-36

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	05/09/22	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA CHUVA FORTE
		Manhã		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	10
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
		Serviços de Pintura de Paredes, Tetos, Grades, Paredes e Pisos.

Anotação da Fiscalização	Descrição

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	Roney Marcos Lourenço Eng. Civil CREA-PE 034385 0-1
---------------------	-------------------	---

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498



<b>GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI</b>		<b>DIARIO DE OBRAS</b>		
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	06/09/22	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA CHUVA FORTE
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Manhã	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prazo Total da Obra		Tarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.		Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Serviços de pinturas nos pavimentos superiores da escola CMP.

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	Roney Marcos Lourenço Moreira <b>Eng. Civil</b> CREA-PE 034385-D-PE
---------------------	-------------------	---

Prefeitura Municipal de Paudalho-PE  
Paulo Vandinei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.496

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	07/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã	<input checked="" type="checkbox"/>		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	<input checked="" type="checkbox"/>		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.		Noite	<input checked="" type="checkbox"/>		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

CONTINUAÇÃO DO GRUPO DO DIA ANTERIOR.

Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:  Visto Contratada:

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenco  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D PE


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA: 08/09/22				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS , EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
			Tarde			
			Noite	X		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H					
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.					

Descrição		Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	10
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE	30	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Revisão geral dos serviços de pintura geral	
	Descrição	Quant.
	70 ChP.	

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização:   
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderli de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Visto Contratada:   
**Roney Marcos Lourival**  
**Eng. Civil**  
 CREA-PE 034365 D-PE


CND: 22.894.1537/0001-06


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	09/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	✓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	✓		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS NO GERAL DO PAVILÃO DA ESCOLA CMP.	

Anotação da Fiscalização		

Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenço Moraes  
Eng. Civil  
CREA-PE 033385-D-PE



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	10/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	✓		
Horário de Trabalho:		Tarde	✓		
7H-12H/13H-17H		Noite			
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.				

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	2

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.	
	SERVIÇOS DE REPARO DE LETREIROS DA ESCOLA		
	C.M.P.		

Anotação da Fiscalização	Descrição

Glidden Empreendimentos e Locações Eireli - E.J.  
 CNPJ: 20.597.153/0001-26

Visto Fiscalização: 	Visto Contratada: 	Roney Marcos Lourenço Moraes Eng. Civil CREA-PE 034385 D-PE
---	---	---



Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	15/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã	✓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	360	DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite		✓	

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO	2	PINTOR	10
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	INICIAMOS OS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NO COLÉGIO TANCREDO NEVES.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:  Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenço

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Eng. Civil  
 CREA-PE 034385 D-12

Glidden Empreendimentos e Locações Eireli  
 CNPJ: 22.594.073/0001-05

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA: 30/09/22			
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã		✓	
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H	Tarde	✓		
Prazo Total da Obra		360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	✓		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

SERVIÇOS DE LIMPAGEM em GERAL E REPAROS DE  
 MANUSEIAMENTOS E LIXAMENTO PARA INICIAR A PINTURA

Anotação da Fiscalização

GLIDDEN Empreendimentos e Locações EIRELI - 217  
 CNPJ: 22.594.155/0001-35

Visto Fiscalização:  Visto Contratada: 

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moreira  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	22/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	X		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	X		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	X		

Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

CONTINUAÇÃO DO SERVIÇO ANTERIOR.

Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização *[assinatura]*

Visto Contratada *[assinatura]* Roney Marcos Laurence Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385 D PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenai de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	14/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	x		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	x		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	50
	SERVENTE	50	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.	
	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS INICIAIS E INICIANDO OS SERVIÇOS GERAL DE PINTURAS.		

Anotação da Fiscalização	Descrição

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	Roney Marcos Lourenço Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE
---------------------	-------------------	--

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandevlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	25/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	<input checked="" type="checkbox"/>		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	<input checked="" type="checkbox"/>		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	<input checked="" type="checkbox"/>		


	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVENTE	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

SOLUÇÕES DE PINTURAS NAS PAREDES, TETO, GRADES E PISOS

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: 

Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenço Virens  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - E. P.  
CNPJ: 02.594.155/0901-36


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	26/09/20		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	+		
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H	Tarde	+	
Prazo Total da Obra		360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite		+


Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	30
	SERVENTE	30	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

SEMPRE DE PINTURAS DAS SALAS DE AULAS

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:  Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Visto Contratada:  Roney Marcos Lourenço  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-0-PE

CNPJ: 22.594.145/0001-00


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA: 17/09/21			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	✓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite		✓	



Pessoal	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	10
	PEDREIRO	10	PINTOR	
	SERVEnte		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

SERVIÇOS DE PINTURA DOS GRADIS EM GERAL.

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: 

Visto Contratada:  Roney Marcos 

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Eng. CIVIL  
 CREA-PE 034355-0-1

<b>GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI</b>		<b>DIARIO DE OBRAS</b>				
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	18/09/22			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
Horário de Trabalho:		7H-12H/13H-17H		Manhã	✓	
Prazo Total da Obra		360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.		Tarde	✓	
				Noite	✓	

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DE AULAS DA PREFEITURA DO PAUDALHO.	

Anotação da Fiscalização	

CNPJ: 22.594.155/0001-36

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

RONY MARCOS LOURENÇO MOREIRA  
 CREA-PE 034385-D-PE  
 ENG. CIVIL

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	19/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde			
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVEnte	10	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM GERAL DO COLEGIO TANCREDO NEVES.

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização

Visto Contratada: *[Assinatura]*

Roney Marcos Lourenço Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034388/0-PE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	20/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	X		
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Tarde	X		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVEANTE		ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	2

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
	SERVIÇOS DE REABERTURA DE LETRINHO DA ESCOLA TANCREDO NEVES.	

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vande Mota de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço Moraes  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - L.P.  
 Cota 1.2022.00000000-00

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	25/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	✓		
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Tarde	✓		
Prazo Total da Obra 360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.		Noite	✓		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	10
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
	INICIAMOS OS SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL DO COLÉGIO MANOEL DA ROSA.	

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização	Visto Contratada: Roney Marcos Lourenço Moraes Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE
--------------------	---

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498



GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	22/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã			
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			2	

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVEnte	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	SERVIÇOS DE ENCAMENHO EM UNIDADES ESCOLARES.	

Anotação da Fiscalização	

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:	Roney Marcos Lourenço Moreira Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE
---------------------	-------------------	--

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandenberg de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	23/09/22	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA
		Manhã	✓	
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	✓	
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	✓	


	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
		SERVICOS DE PINTURAS DE TODOS COLEGIO MANOEL DA ROSA

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

  
 Roney Marcos Lourenco  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385-D-PE

CNPJ: 01.594.155/0001-36

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	24/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	2		
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Tarde	2		
Prazo Total da Obra		Noite	6		
360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.					

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
	SERVIÇOS DE PINTURA DE PISO DA ESCOLA MONTEZUMA	

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034305-L1/E

Códigos Empreendimentos e Itens: 22011-L  
 CNPJ: 02.594.145/0001-88


GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	25/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	2		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H	Tarde	1		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite	2		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	22
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVEANTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES E GADIS

Serviços Executados / Ocorrências

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização:  Visto Contratada: 

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Roney Marcos Lourenço  
 Eng. CIVIL  
 CREA-PE 03411-0/2011

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI			DIARIO DE OBRAS			
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.			DATA:	26/07/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.		TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
			Manhã	✓		
Horário de Trabalho:	7H-12H/13H-17H		Tarde	✓		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.		Noite	✓		

Pessoa	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
		ENGENHEIRO		ARMADOR
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVEANTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
		SERVÍÇOS DE PINTURA EXTERNA

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandeval de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

*Roney Marcos Lourenço*  
 Eng. Civil  
 CREA-PE 034385 D. PE  
 CNPJ: 22.560.570/0001-38

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	27/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	+		
Horário de Trabalho:		Tarde	+		
Prazo Total da Obra		Noite	+		
		7H-12H/13H-17H			
		360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	12
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
	SERVIÇOS DE ACABAMENTO DE PINTURA em GERAL			

Anotação da Fiscalização	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.

Glidden Empreendimentos e Locações EIRELI - 77  
 CNPJ: 22.594.195/0001-35

Visto Fiscalização:	Visto Contratada: Roney Marcos Lourenço Moreira Eng. Civil CREA-PE 034385-D-PE
---------------------	--

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.488

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	28/09/22		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS , EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA	CHUVA FORTE
		Manhã	x		
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Tarde	x		
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite			

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO		ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO		ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	12
	SERVENTE	12	ELETRICISTA	
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências	Descrição	Quant.
	SERVIÇOS DE APROFUNDAMENTO E CIMENTAÇÃO DA	
	MARTEL DA ROSA.	

Anotação da Fiscalização	Descrição

Visto Fiscalização:	Visto Contratada:
---------------------	-------------------

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Menezes Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.488

Roney Marcos Lourenco Moreira  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-D-PE

GLIDDEN Empreendimentos e Locações EIRELI - 217

CNPJ: 22.594.155/0001-20

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI		DIARIO DE OBRAS		
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO - PE.		DATA:	29/09/20	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SEUS ANEXOS, EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO -PE.	TEMPO	SOL	CHUVA FRACA CHUVA FORTE
		Manhã	<input checked="" type="checkbox"/>	
Horário de Trabalho: 7H-12H/13H-17H		Tarde	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prazo Total da Obra	360 DIAS + 180 DIAS DE ADITIVO + 180 DIAS DE ADITIVO.	Noite		

	Descrição	Quant.	Descrição	Quant.
Pessoal	ENGENHEIRO	1	ARMADOR	
	MESTRE / ENCARREGADO	1	ENCANADOR	
	PEDREIRO		PINTOR	
	SERVENTE		ELETRICISTA	1
	CARPINTEIRO		OUTROS	

Serviços Executados / Ocorrências

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ANOEL DA ROSA

Anotação da Fiscalização

Visto Fiscalização: Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Responsável Civil  
Matr.: 11.498

Visto Contratada: Roney Marcos Lourenço  
Eng. Civil  
CREA-PE 034385-0-PE

GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI  
CNPJ: 20.506.187/0001-00
