

**C.I nº 0832/2023**

**Da:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

**Para:** Secretaria Municipal de Educação

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
<b>10º BM - cujo objeto e a Contratação de empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Construção de quadra coberta com vestiário da Escola Municipal MENINO JESUS, no Município de Paudalho - PE. Processo nº 23400.004234/2019-37</b>	<b>OCTAGON EMPREENDEIMENTOS LTDA EPP</b>  <b>CNPJ:08.307.543/0001-68;</b>  <b>Dados Bancário Banco OI SCD (329) Ag. 0001; C/c: 85715-0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nota Fiscal <b>702</b>;</li><li>• Memória de Cálculo;</li><li>• Relatório Fotográfico;</li><li>• Plano de Trabalho.</li></ul>

*Atenciosamente,*



**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Matricula – 48.911



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFSE**

Número da Nota

**00000702**

Data e Hora de Emissão

**09/08/2023 15:05:46**

Código de Verificação

**BZLU-A4RY**

20230809:08307543000168

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



OCTAGON

CPF/CNPJ: **08.307.543/0001-68**

Inscrição Municipal: **504.216-0**

Nome/Razão Social: **OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 5001, APTO 0102 - BOA VIAGEM - CEP: 51020-030**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **octagonitda@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO**

CPF/CNPJ: **29.355.454/0001-67**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **PRAÇA PEDRO COUTINHO 68 - CENTRO - CEP: 55825-000**

Município: **Paudalho**

UF: **PE**

E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS, PROCESSO Nº23400.004234/2019-37 : TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003678-1, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO- PE, CONTRATO Nº049/2021, DURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 à 31/07/2023.

MÃO DE OBRA (40%) : R\$ 27.317,10

MATERIAL (60%) : R\$ 40.975,66

CNO:90.008.86382/71

ART: PE20210701229

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO QI SCD (329)

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE: 85715-0

ATESTO 09/08/2023  
 SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 MATERIAL FOI ENTREGUE

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.:41.498

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 30.004,88

Retenção de IRPJ  
R\$ 819,51

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 68.292,76**

Código da Atividade Prestada

**4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
40.975,66	0,00	27.317,10	5,00%	1.365,86	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será **RETIDO pelo Tomador de Serviço**.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: 90.008.86382/71 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20210701229



G3331712501996561  
17/08/2023 12:59:46

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	673-4
Conta corrente	52659-2 PM PAUDALHO-PAR -

### Creditado

---

Banco	329 QI SCD S.A.
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	857150
CNPJ	08.307.543/0001-68
Nome favorecido	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	81.701
Valor	63.102,51
Destinação	0
Data transferência	17/08/2023

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3EE58582107BEDB

---

Assinada por	JB531065MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA	17/08/202312:55:40
	JF229578TULIO JOSE VIEIRA DUDA	17/08/202312:59:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA.



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente <b>PREFEITURA DO PAUDALHO</b>	BM - número <b>10</b>	BM - Data emissão <b>2/8/2023</b> até <b>1/5/2023</b> até <b>31/7/2023</b>	Nº do CT <b>049/2021</b>	Data do CT <b>27/10/2021</b>
---	--------------------------	---	-----------------------------	---------------------------------

Início da obra - data <b>3/11/2021</b>	Previsão Término obra <b>27/4/2023</b>	Empresa Contratada <b>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA</b>	CNPJ <b>08.307.543/0001-68</b>	Fontes do recurso: <b>FNDE</b>
---	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------

CTEF - Valor do contrato Aditivo (R\$) R\$ CTEF - Valor total inicial - Aditivo (R\$) R\$ CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ R\$	Valor do contrato (R\$) <b>R\$ 876.654,17</b>	Objeto do CTEF ( resumido) <b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.</b> <b>Termo de compromisso:</b> 202003678-1 <b>Local da obra ( Bairro / Município / UF )</b> <b>PAUDALHO/PE</b>	Empreendimento: <b>Construção de Edifícios (também para Reformas)</b>
	Valor do Recurso FNDE (R\$) <b>R\$ 663.166,69</b>		
	Valor a executar do contrato (R\$) <b>R\$ 280.267,99</b>		
	Valor a executar do FNDE (R\$) <b>R\$ 66.780,51</b>		
	Valor do BM-10 (R\$) <b>R\$ 68.292,76</b>		

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 60.330,89</b>							
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	R\$ 377,04	R\$ 3.770,42	10,00		10,00	R\$ 3.770,40	R\$ 0,00	R\$ 3.770,40	100,00%
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m²	66,00	R\$ 108,98	R\$ 7.192,63			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	R\$ 2.059,59	R\$ 2.059,59			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	R\$ 2.998,76	R\$ 2.998,76			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	R\$ 921,67	R\$ 2.322,61			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	R\$ 1.020,79	R\$ 20.415,78	20,00		20,00	R\$ 20.415,80	R\$ 0,00	R\$ 20.415,80	100,00%
1.7	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	R\$ 782,91	R\$ 15.658,24	20,00		20,00	R\$ 15.658,20	R\$ 0,00	R\$ 15.658,20	100,00%
1.8	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	810,03	R\$ 6,86	R\$ 5.557,37	800,40		800,40	R\$ 5.490,74	R\$ 0,00	R\$ 5.490,74	98,80%
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	945,00	R\$ 0,38	R\$ 355,51			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 6.001,35</b>							
2.1.1	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m²	13,20	R\$ 59,37	R\$ 783,69	13,20			R\$ 783,68	R\$ 0,00	R\$ 783,68	100,00%
2.1.2	Escavação mecanizada com previsão de forma	m³	41,08	R\$ 76,06	R\$ 3.124,61	41,08			R\$ 3.124,54	R\$ 0,00	R\$ 3.124,54	100,00%
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	50,00	R\$ 2,77	R\$ 138,60	50,00			R\$ 138,50	R\$ 0,00	R\$ 138,50	99,93%
2.1.4	Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m³	26,64	R\$ 36,21	R\$ 964,75	26,31			R\$ 952,68	R\$ 0,00	R\$ 952,68	98,75%
<b>2.2</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b>											
2.2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)	m²	16,67	R\$ 59,37	R\$ 989,69	16,67			R\$ 989,69	R\$ 0,00	R\$ 989,69	100,00%
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 43.446,90</b>							
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>											
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	16,18	R\$ 32,06	R\$ 518,67	4,11			R\$ 131,76	R\$ 0,00	R\$ 131,76	25,40%
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	68,15	R\$ 134,59	R\$ 9.172,34	35,40			R\$ 4.764,48	R\$ 0,00	R\$ 4.764,48	51,94%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo de Souza Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Aysila Jayne de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Cavalcante Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	126,45	R\$ 18,82	R\$	2.379,78	126,45		R\$ 2.379,78	R\$ 0,00	R\$ 2.379,78	100,00%
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,82	R\$ 16,18	R\$	2.423,58	147,62		R\$ 2.388,49	R\$ 0,00	R\$ 2.388,49	98,55%
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,64	R\$ 19,49	R\$	1.435,47	73,46		R\$ 1.431,73	R\$ 0,00	R\$ 1.431,73	99,74%
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,56	R\$ 566,56	R\$	3.716,62	6,56		R\$ 3.716,62	R\$ 0,00	R\$ 3.716,62	100,00%
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>											
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	33,82	R\$ 30,93	R\$	1.045,97	11,90		R\$ 368,06	R\$ 0,00	R\$ 368,06	35,19%
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	4,07	R\$ 408,11	R\$	1.661,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	134,40	R\$ 66,64	R\$	8.956,00	58,46		R\$ 3.895,77	R\$ 0,00	R\$ 3.895,77	43,50%
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	245,27	R\$ 17,92	R\$	4.394,99	118,32		R\$ 2.120,29	R\$ 0,00	R\$ 2.120,29	48,24%
3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	169,82	R\$ 19,49	R\$	3.310,32	54,58		R\$ 1.063,76	R\$ 0,00	R\$ 1.063,76	32,13%
3.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,92	R\$ 559,62	R\$	4.432,17	2,80		R\$ 1.566,93	R\$ 0,00	R\$ 1.566,93	35,35%
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>R\$</b>	<b>364.961,07</b>						
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>				<b>R\$</b>							
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	28,39	R\$ 36,42	R\$	1.034,02	28,39		R\$ 1.033,96	R\$ 0,00	R\$ 1.033,96	99,99%
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	76,36	R\$ 16,74	R\$	1.278,34	76,36		R\$ 1.278,26	R\$ 0,00	R\$ 1.278,26	99,99%
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,00	R\$ 14,13	R\$	522,71	37,00		R\$ 522,71	R\$ 0,00	R\$ 522,71	100,00%
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,45	R\$ 531,23	R\$	770,29	1,45		R\$ 770,28	R\$ 0,00	R\$ 770,28	100,00%
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES</b>											
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	47,69	R\$ 59,95	R\$	2.859,23	47,69		R\$ 2.859,01	R\$ 0,00	R\$ 2.859,01	99,99%
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	R\$ 18,68	R\$	1.664,32	89,09		R\$ 1.664,20	R\$ 0,00	R\$ 1.664,20	99,99%
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,27	R\$ 16,74	R\$	155,19	9,27		R\$ 155,17	R\$ 0,00	R\$ 155,17	99,99%
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,73	R\$ 20,82	R\$	1.181,10	56,73		R\$ 1.181,10	R\$ 0,00	R\$ 1.181,10	100,00%
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,74	R\$ 512,85	R\$	1.405,21	2,74		R\$ 1.405,20	R\$ 0,00	R\$ 1.405,20	100,00%
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>											
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	4,68	R\$ 4,68	R\$	170,46			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,23	R\$ 14,23	R\$	230,19			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,67	R\$ 3,67	R\$	71,54			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,23	R\$ 0,23	R\$	122,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>											
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	14,27	R\$ 59,95	R\$	855,55			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	29,90	R\$ 18,68	R\$	558,57			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,44	R\$ 20,82	R\$	279,82			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,86	R\$ 512,85	R\$	441,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo de Souza Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Ayslla Jayde de Moraes Silva  
 Eng. CIVIL CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro de Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Mat.: 48.911

4.5 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA													
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	10,80	R\$ 22,80	R\$	246,24	10,51			R\$ 239,62	R\$ 0,00	R\$ 239,62	97,31%
4.5.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	37,25	R\$ 149,01	R\$	5.550,80	35,09			R\$ 5.228,76	R\$ 0,00	R\$ 5.228,76	94,20%
4.5.3	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	745,00	R\$ 10,27	R\$	7.648,39	718,50			R\$ 7.378,99	R\$ 0,00	R\$ 7.378,99	96,48%
4.5.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	745,00	R\$ 16,66	R\$	12.412,97	718,50			R\$ 11.970,21	R\$ 0,00	R\$ 11.970,21	96,43%
4.5.5	Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação	kg	643,46	R\$ 14,13	R\$	9.090,35	643,46			R\$ 9.090,35	R\$ 0,00	R\$ 9.090,35	100,00%
4.5.6	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	m²	745,00	R\$ 77,45	R\$	57.698,54	718,50			R\$ 55.647,82	R\$ 0,00	R\$ 55.647,82	96,45%
4.6 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS													
4.6.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	20,04	R\$ 22,80	R\$	456,91	10,64			R\$ 242,59	R\$ 0,00	R\$ 242,59	53,09%
4.6.2	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	m²	228,16	R\$ 16,66	R\$	3.801,53	79,36			R\$ 1.322,13	R\$ 0,00	R\$ 1.322,13	34,78%
4.6.3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,35	R\$ 535,27	R\$	3.398,98	6,33			R\$ 3.388,25	R\$ 0,00	R\$ 3.388,25	99,68%
4.7 CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES													
4.7.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	47,12	R\$ 36,42	R\$	1.716,21				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.7.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,34	R\$ 531,23	R\$	2.305,56				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.8 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS													
4.8.1	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm	m	25,90	R\$ 32,99	R\$	854,36	18,20			R\$ 600,41	R\$ 0,00	R\$ 600,41	70,28%
4.9 ESTRUTURA METÁLICA													
4.9.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos	kg	11.245,00	R\$ 20,30	R\$	228.217,28	2.868,70			R\$ 58.234,61	R\$ 0,00	R\$ 58.234,61	25,52%
4.9.2	Lanternim em estrutura metálica	m²	206,40	R\$ 25,66	R\$	5.296,39				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.9.3	Estrutura metálica para telhas do vestiário	kg	891,00	R\$ 14,22	R\$	12.666,81	891,00			R\$ 12.666,81	R\$ 0,00	R\$ 12.666,81	100,00%
5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL													
						<b>R\$ 27.008,92</b>							
5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	177,58	R\$ 51,01	R\$	9.059,19	177,58			R\$ 9.058,35	R\$ 0,00	R\$ 9.058,35	99,99%
5.1.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	65,12	R\$ 23,99	R\$	1.562,08				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	14,40	R\$ 519,03	R\$	7.473,99				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.2 ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS													
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	114,58	R\$ 77,79	R\$	8.913,66	114,58			R\$ 8.913,17	R\$ 0,00	R\$ 8.913,17	99,99%
						<b>R\$ 10.850,40</b>							
6 ESQUADRIAS													
6.1 PORTAS DE MADEIRA													
6.1.1	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	R\$ 881,55	R\$	2.644,64	3,00			R\$ 2.644,64	R\$ 0,00	R\$ 2.644,64	100,00%
6.1.2	PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	4,00	R\$ 304,38	R\$	1.217,50				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	2,00	R\$ 362,62	R\$	725,23				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS													
6.2.1	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3	un	2,00	R\$ 314,30	R\$	628,59				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1	m²	0,96	R\$ 266,24	R\$	255,59				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo da Souza Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Ayslla Jaqueline de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paulista/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

6.2.3	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	6,00	R\$ 95,75	R\$	574,52			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>6.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>											
6.3.1	Janela de Alumínio, basculante 50x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	0,50	R\$ 557,26	R\$	278,63	0,50		R\$ 278,63	R\$ 0,00	R\$ 278,63	100,00%
6.3.2	Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	5,60	R\$ 557,26	R\$	3.120,66	5,60		R\$ 3.120,66	R\$ 0,00	R\$ 3.120,66	100,00%
<b>6.4</b>	<b>VIDROS</b>											
6.4.1	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura	m²	2,70	R\$ 520,38	R\$	1.405,04			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>				<b>R\$</b>	<b>152.963,65</b>						
7.1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	819,82	R\$ 103,46	R\$	84.822,59	819,82		R\$ 84.818,57	R\$ 0,00	R\$ 84.818,57	100,00%
7.2	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	165,00	R\$ 103,46	R\$	17.071,71	158,99		R\$ 16.449,10	R\$ 0,00	R\$ 16.449,10	96,35%
7.3	Telha metálica ondulada acabamento natural, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	208,32	R\$ 103,46	R\$	21.553,81	164,12		R\$ 16.979,85	R\$ 0,00	R\$ 16.979,85	78,78%
7.4	Telha metálica ondulada acabamento natural, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	145,78	R\$ 103,46	R\$	15.083,11	145,78		R\$ 15.082,39	R\$ 0,00	R\$ 15.082,39	100,00%
7.5	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	78,66	R\$ 58,64	R\$	4.612,44	77,22		R\$ 4.528,18	R\$ 0,00	R\$ 4.528,18	98,17%
7.6	Ruífo metálico	m	31,68	R\$ 59,41	R\$	1.882,11	29,50		R\$ 1.752,59	R\$ 0,00	R\$ 1.752,59	0,00%
7.7	Calha em chapa metálica para vestiário	m	16,80	R\$ 73,40	R\$	1.233,10	16,80		R\$ 1.233,10	R\$ 0,00	R\$ 1.233,10	100,00%
7.8	Calha em chapa metálica para quadra	m	64,00	R\$ 98,72	R\$	6.318,26	64,00		R\$ 6.318,26	R\$ 0,00	R\$ 6.318,26	100,00%
7.9	Pingadeira de concreto	m	33,60	R\$ 11,50	R\$	386,53			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>9.422,65</b>						
8.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldrame	m²	202,55	R\$ 46,52	R\$	9.422,65	58,73		R\$ 2.732,11	R\$ 0,00	R\$ 2.732,11	29,00%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>				<b>R\$</b>	<b>29.757,70</b>						
<b>9.1</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>											
9.1.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	197,74	R\$ 4,64	R\$	918,13	197,74		R\$ 917,51	R\$ 0,00	R\$ 917,51	99,93%
9.1.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	197,74	R\$ 32,89	R\$	6.503,23	109,08		R\$ 3.587,64	R\$ 0,00	R\$ 3.587,64	55,17%
9.1.3	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	m²	33,98	R\$ 27,77	R\$	943,61	33,98		R\$ 943,61	R\$ 0,00	R\$ 943,61	100,00%
9.1.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40cm - inclusive rejunte - aplicadas à altura inteira das paredes	m²	99,36	R\$ 70,69	R\$	7.023,36		99,36	R\$ 0,00	R\$ 7.023,36	R\$ 7.023,36	100,00%
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>											
9.2.1	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	243,15	R\$ 4,64	R\$	1.128,97	243,15		R\$ 1.128,97	R\$ 0,00	R\$ 1.128,97	100,00%
9.2.2	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	m²	243,15	R\$ 38,02	R\$	9.243,59	243,15		R\$ 9.243,59	R\$ 0,00	R\$ 9.243,59	100,00%
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMENTO TETO</b>											
9.3.1	Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	56,15	R\$ 71,18	R\$	3.996,81		56,15	R\$ 0,00	R\$ 3.996,81	R\$ 3.996,81	100,00%
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$</b>	<b>6.516,48</b>						
10.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	58,15	R\$ 49,70	R\$	2.889,94	57,60		R\$ 2.862,72	R\$ 0,00	R\$ 2.862,72	99,06%
10.2	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	58,15	R\$ 43,99	R\$	2.557,77		57,60	R\$ 0,00	R\$ 2.533,82	R\$ 2.533,82	99,06%
10.3	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	m	0,86	R\$ 106,23	R\$	91,36			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m²	1,82	R\$ 120,95	R\$	220,13		1,44	R\$ 0,00	R\$ 174,16	R\$ 174,16	79,12%
10.5	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas	m²	5,85	R\$ 129,45	R\$	757,30		3,45	R\$ 0,00	R\$ 446,60	R\$ 446,60	58,97%
<b>11</b>	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>				<b>R\$</b>	<b>47.209,81</b>						
11.1	Paintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	47,12	R\$ 55,95	R\$	2.636,59		39,25	R\$ 0,00	R\$ 2.196,03	R\$ 2.196,03	83,29%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jacó de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Preeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

11.2	Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	R\$ 21,38	R\$	6.438,29	45,17	255,91	R\$ 965,73	R\$ 5.472,56	R\$ 6.438,29	100,00%
11.3	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	R\$ 21,38	R\$	6.438,29	45,17	255,91	R\$ 965,73	R\$ 5.472,56	R\$ 6.438,29	100,00%
11.4	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²	984,82	R\$ 21,38	R\$	21.059,39		984,82	R\$ 0,00	R\$ 21.059,39	R\$ 21.059,39	100,00%
11.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	m	275,60	R\$ 12,82	R\$	3.533,33			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	m²	68,76	R\$ 9,82	R\$	675,28		68,76	R\$ 0,00	R\$ 675,28	R\$ 675,28	100,00%
11.7	Pintura PVA, 2 demãos	m²	68,76	R\$ 11,50	R\$	791,00		68,76	R\$ 0,00	R\$ 791,00	R\$ 791,00	100,00%
11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	m²	243,15	R\$ 2,63	R\$	640,31		243,15	R\$ 0,00	R\$ 640,31	R\$ 640,31	100,00%
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	m²	243,15	R\$ 20,55	R\$	4.997,32		243,15	R\$ 0,00	R\$ 4.997,32	R\$ 4.997,32	100,00%
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>R\$</b>	<b>6.366,84</b>						
<b>12.1</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>											
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	38,90	R\$ 5,93	R\$	230,68	35,96		R\$ 213,24	R\$ 0,00	R\$ 213,24	92,44%
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm	m	35,76	R\$ 20,96	R\$	749,47	33,70		R\$ 706,35	R\$ 0,00	R\$ 706,35	94,25%
12.1.3	Curva PVC 45º soldável Ø 50mm	un	4,00	R\$ 23,81	R\$	95,24	4,00		R\$ 95,24	R\$ 0,00	R\$ 95,24	100,00%
12.1.4	Curva PVC 90º soldável Ø 25mm	un	22,00	R\$ 7,64	R\$	168,14	22,00		R\$ 168,14	R\$ 0,00	R\$ 168,14	100,00%
12.1.5	Curva PVC 90º soldável Ø 50mm	un	8,00	R\$ 27,56	R\$	220,49	8,00		R\$ 220,49	R\$ 0,00	R\$ 220,49	100,00%
12.1.6	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2"	un	18,00	R\$ 15,50	R\$	279,06	18,00		R\$ 279,06	R\$ 0,00	R\$ 279,06	100,00%
12.1.7	Tê PVC soldável 25mm	un	10,00	R\$ 6,58	R\$	65,84	10,00		R\$ 65,84	R\$ 0,00	R\$ 65,84	100,00%
12.1.8	Tê PVC soldável 50mm	un	8,00	R\$ 23,67	R\$	189,37	8,00		R\$ 189,37	R\$ 0,00	R\$ 189,37	100,00%
12.1.9	Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm	un	6,00	R\$ 22,12	R\$	132,70	6,00		R\$ 132,70	R\$ 0,00	R\$ 132,70	100,00%
12.1.10	Luva soldável com rosca 25mm x 3/4"	un	8,00	R\$ 4,89	R\$	39,12	8,00		R\$ 39,12	R\$ 0,00	R\$ 39,12	100,00%
12.1.11	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm	un	4,00	R\$ 9,05	R\$	36,19	4,00		R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 36,19	100,00%
<b>12.2</b>	<b>REGISTROS E OUTROS</b>											
12.2.1	Registro de gaveta bruto Ø 1"	un	6,00	R\$ 80,05	R\$	480,31	6,00		R\$ 480,31	R\$ 0,00	R\$ 480,31	100,00%
12.2.2	Registro de gaveta bruto Ø 2"	un	4,00	R\$ 149,48	R\$	597,92	4,00		R\$ 597,92	R\$ 0,00	R\$ 597,92	100,00%
12.2.3	Registro de pressão com canopia Ø 3/4"	un	8,00	R\$ 81,34	R\$	650,71	8,00		R\$ 650,71	R\$ 0,00	R\$ 650,71	100,00%
12.2.4	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x 3/4" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	R\$ 3,87	R\$	30,97	8,00		R\$ 30,97	R\$ 0,00	R\$ 30,97	100,00%
12.2.5	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro	un	12,00	R\$ 5,87	R\$	70,45	12,00		R\$ 70,45	R\$ 0,00	R\$ 70,45	100,00%
12.2.6	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	R\$ 23,41	R\$	187,31	8,00		R\$ 187,31	R\$ 0,00	R\$ 187,31	100,00%
12.2.7	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa d'água	un	4,00	R\$ 97,10	R\$	388,40	1,00		R\$ 97,10	R\$ 0,00	R\$ 97,10	25,00%
12.2.8	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm	un	10,00	R\$ 9,15	R\$	91,48			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.9	Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L	un	1,00	R\$ 1.663,00	R\$	1.663,00	1,00		R\$ 1.663,00	R\$ 0,00	R\$ 1.663,00	100,00%
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>R\$</b>	<b>5.914,88</b>						
13.1	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	24,68	R\$ 18,51	R\$	456,90	24,67		R\$ 456,64	R\$ 0,00	R\$ 456,64	99,94%
13.2	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	9,50	R\$ 27,94	R\$	265,41	9,50		R\$ 265,41	R\$ 0,00	R\$ 265,41	100,00%
13.3	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	28,58	R\$ 54,19	R\$	1.548,82	9,48		R\$ 513,72	R\$ 0,00	R\$ 513,72	33,17%
13.4	Curva curta PVC 90º Ø 40mm	un	6,00	R\$ 10,51	R\$	63,08	6,00		R\$ 63,08	R\$ 0,00	R\$ 63,08	100,00%
13.5	Curva curta PVC 90º Ø 100mm	un	18,00	R\$ 33,65	R\$	605,70	6,00		R\$ 201,90	R\$ 0,00	R\$ 201,90	33,33%
13.6	Joelho PVC 45º Ø 40mm	un	5,00	R\$ 7,00	R\$	35,00	5,00		R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00	100,00%
13.7	Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1 1/2"	un	10,00	R\$ 9,81	R\$	98,11	10,00		R\$ 98,11	R\$ 0,00	R\$ 98,11	100,00%
13.8	Junção PVC simples 40mm, soldável	un	6,00	R\$ 11,90	R\$	71,40	6,00		R\$ 71,40	R\$ 0,00	R\$ 71,40	100,00%
13.9	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm	un	8,00	R\$ 15,10	R\$	120,78	8,00		R\$ 120,78	R\$ 0,00	R\$ 120,78	100,00%
13.10	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	R\$ 91,52	R\$	549,09	6,00		R\$ 549,09	R\$ 0,00	R\$ 549,09	100,00%
13.11	Caixa de inspeção 80x80cm	un	5,00	R\$ 420,12	R\$	2.100,58		5,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,58	R\$ 2.100,58	100,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo de Souza Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Aysilayne de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Jandaího/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911



14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$		7.365,93					
<b>14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>											
14.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	m	104,40	R\$ 30,32	R\$	3.165,79	104,40	R\$ 3.165,79	R\$ 0,00	R\$ 3.165,79	100,00%
14.1.2	Joelho 90 - 100mm	un	20,00	R\$ 24,29	R\$	485,89	20,00	R\$ 485,89	R\$ 0,00	R\$ 485,89	100,00%
<b>14.2 ACESSÓRIOS</b>											
14.2.1	Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi)	un	12,00	R\$ 29,44	R\$	353,31		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	8,00	R\$ 420,12	R\$	3.360,93	8,00	R\$ 3.360,93	R\$ 0,00	R\$ 3.360,93	100,00%
<b>15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>											
<b>15</b>											
15.1	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00	R\$ 227,85	R\$	1.367,09		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.2	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	6,00	R\$ 370,32	R\$	2.221,92		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca	un	6,00	R\$ 147,27	R\$	883,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 142,88	R\$	285,75		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.5	Ducha Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 81,12	R\$	162,24		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	8,00	R\$ 66,56	R\$	532,46		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.7	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	1,00	R\$ 51,04	R\$	51,04		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	R\$ 103,96	R\$	831,68		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 70,55	R\$	423,28		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.10	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	R\$ 66,94	R\$	347,77		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolo	un	2,00	R\$ 37,32	R\$	74,65		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.12	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	R\$ 86,94	R\$	521,65		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.13	Cadeira articulada para banho	un	2,00	R\$ 1.162,50	R\$	2.325,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.14	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00	R\$ 350,36	R\$	2.102,28		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.15	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	4,00	R\$ 335,96	R\$	1.343,83		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>											
<b>16</b>											
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	R\$ 270,09	R\$	540,18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	2,00	R\$ 41,96	R\$	83,91		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.3	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	2,00	R\$ 19,40	R\$	38,81		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	4,00	R\$ 42,04	R\$	168,14		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>											
<b>17</b>											
17.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores	un	1,00	R\$ 686,85	R\$	686,85	1,00	R\$ 686,85	R\$ 0,00	R\$ 686,85	100,00%
17.1.2	Quadro de medição	un	1,00	R\$ 99,34	R\$	99,34		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	7,00	R\$ 14,00	R\$	97,99	7,00	R\$ 97,99	R\$ 0,00	R\$ 97,99	100,00%
17.1.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	8,00	R\$ 15,64	R\$	125,14	8,00	R\$ 125,14	R\$ 0,00	R\$ 125,14	100,00%
17.1.5	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00	R\$ 103,11	R\$	206,22	1,00	R\$ 103,11	R\$ 0,00	R\$ 103,11	50,00%
17.1.6	Dispositivo diferencial residual 25A	un	9,00	R\$ 180,59	R\$	1.625,27	8,00	R\$ 1.444,72	R\$ 0,00	R\$ 1.444,72	88,89%
17.1.7	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V	un	4,00	R\$ 154,76	R\$	619,03	4,00	R\$ 619,03	R\$ 0,00	R\$ 619,03	100,00%
<b>17.2. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>											
<b>17.2</b>											
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm	m	19,80	R\$ 8,82	R\$	174,65	4,50	R\$ 39,69	R\$ 0,00	R\$ 39,69	22,73%
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm	m	21,69	R\$ 11,59	R\$	251,45	21,00	R\$ 243,39	R\$ 0,00	R\$ 243,39	96,79%
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2")	m	5,00	R\$ 7,76	R\$	38,81	5,00	R\$ 38,81	R\$ 0,00	R\$ 38,81	100,00%
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4")	m	113,35	R\$ 9,51	R\$	1.078,40	113,35	R\$ 1.078,40	R\$ 0,00	R\$ 1.078,40	100,00%
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1")	m	17,54	R\$ 13,43	R\$	235,64		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2")	m	7,02	R\$ 17,49	R\$	122,80		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2")	m	23,10	R\$ 26,30	R\$	607,63	3,00	R\$ 78,90	R\$ 0,00	R\$ 78,90	12,98%
17.2.8	Condulete em PVC tipo LB de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 18,76	R\$	93,80	5,00	R\$ 93,80	R\$ 0,00	R\$ 93,80	100,00%
17.2.9	Condulete em PVC tipo TB de 3/4", inclusive acessórios	un	10,00	R\$ 22,31	R\$	223,15	10,00	R\$ 223,15	R\$ 0,00	R\$ 223,15	100,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo da Silva Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Aysilayne de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA n° 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paulista/PE  
 Paulo Vandertei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 544.488

Carlos Pinheiro Santos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

17.2.10	Condulete em PVC tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 37,46	R\$	187,31	5,00		R\$ 187,31	R\$ 0,00	R\$ 187,31	100,00%
17.2.11	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	75,00	R\$ 6,86	R\$	514,55	75,00		R\$ 514,81	R\$ 0,00	R\$ 514,81	100,05%
17.2.12	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	16,00	R\$ 6,86	R\$	109,77	16,00		R\$ 109,77	R\$ 0,00	R\$ 109,77	100,00%
17.2.13	Curva 135° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	R\$ 21,94	R\$	43,88	2,00		R\$ 43,88	R\$ 0,00	R\$ 43,88	100,00%
17.2.14	Curva 90° PVC curta rosca 1/2"	un	1,00	R\$ 8,95	R\$	8,95	1,00		R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 8,95	100,00%
17.2.15	Curva 90° PVC longa rosca 1/2"	un	1,00	R\$ 8,95	R\$	8,95	1,00		R\$ 8,95	R\$ 0,00	R\$ 8,95	100,00%
17.2.16	Curva 90° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	R\$ 21,94	R\$	43,88	2,00		R\$ 43,88	R\$ 0,00	R\$ 43,88	100,00%
17.2.17	Luva PVC rosca 1/2"	un	2,00	R\$ 4,61	R\$	9,23	2,00		R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 9,23	100,00%
17.2.18	Luva PVC rosca 3/4"	un	18,00	R\$ 6,15	R\$	110,66	18,00		R\$ 110,66	R\$ 0,00	R\$ 110,66	100,00%
17.2.19	Luva PVC rosca 1"	un	4,00	R\$ 8,15	R\$	32,59	4,00		R\$ 32,59	R\$ 0,00	R\$ 32,59	100,00%
17.2.20	Luva PVC rosca 1 1/2"	un	5,00	R\$ 14,30	R\$	71,48	5,00		R\$ 71,48	R\$ 0,00	R\$ 71,48	100,00%
17.2.21	Caixa de PVC 4x2	un	16,00	R\$ 9,98	R\$	159,67	15,00		R\$ 149,70	R\$ 0,00	R\$ 149,70	93,76%
17.2.22	Caixa octogonal de PVC 3x3	un	9,00	R\$ 11,77	R\$	105,94			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>17.3 CABOS E FIOS CONDUTORES</b>												
17.3.1	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	519,26	R\$ 4,25	R\$	2.205,35	519,26		R\$ 2.205,35	R\$ 0,00	R\$ 2.205,35	100,00%
17.3.2	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	179,61	R\$ 6,98	R\$	1.253,59	179,61		R\$ 1.253,59	R\$ 0,00	R\$ 1.253,59	100,00%
17.3.3	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	99,42	R\$ 9,60	R\$	954,73			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>												
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	R\$ 31,47	R\$	62,94	2,00		R\$ 62,94	R\$ 0,00	R\$ 62,94	100,00%
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa	un	1,00	R\$ 34,22	R\$	34,22	1,00		R\$ 34,22	R\$ 0,00	R\$ 34,22	100,00%
17.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa	un	1,00	R\$ 26,74	R\$	26,74	1,00		R\$ 26,74	R\$ 0,00	R\$ 26,74	100,00%
17.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	R\$ 47,10	R\$	94,21	2,00		R\$ 94,21	R\$ 0,00	R\$ 94,21	100,00%
17.4.5	Placa cega de PVC 4x2	un	8,00	R\$ 14,15	R\$	113,18	8,00		R\$ 113,18	R\$ 0,00	R\$ 113,18	100,00%
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa	un	9,00	R\$ 125,32	R\$	1.127,92		9,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,92	R\$ 1.127,92	100,00%
17.4.7	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W	un	20,00	R\$ 443,15	R\$	8.863,07	20,00		R\$ 8.863,07	R\$ 0,00	R\$ 8.863,07	100,00%
<b>18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>												
18.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m	un	6,00	R\$ 79,76	R\$	478,59	6,00		R\$ 478,59	R\$ 0,00	R\$ 478,59	100,00%
18.2	Caixa de equalização de potências de embutir	un	1,00	R\$ 259,45	R\$	259,45			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
18.3	Cabo de cobre nu 35mm²	m	21,00	R\$ 65,85	R\$	1.382,95	21,00		R\$ 1.382,95	R\$ 0,00	R\$ 1.382,95	100,00%
18.4	Cabo de cobre nu 50mm²	m	120,00	R\$ 85,49	R\$	10.258,38	120,00		R\$ 10.258,38	R\$ 0,00	R\$ 10.258,38	100,00%
18.5	Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm	m	11,40	R\$ 17,49	R\$	199,42	2,50		R\$ 43,72	R\$ 0,00	R\$ 43,72	21,92%
18.6	Escavação de vala para aterramento	m³	18,00	R\$ 76,06	R\$	1.369,11	18,00		R\$ 1.369,11	R\$ 0,00	R\$ 1.369,11	100,00%
18.7	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	18,00	R\$ 36,21	R\$	651,86	18,00		R\$ 651,86	R\$ 0,00	R\$ 651,86	100,00%
18.8	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	R\$ 34,09	R\$	204,51	6,00		R\$ 204,51	R\$ 0,00	R\$ 204,51	100,00%
18.9	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35 mm²	un	6,00	R\$ 19,46	R\$	116,78	6,00		R\$ 116,78	R\$ 0,00	R\$ 116,78	100,00%
18.10	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	R\$ 25,74	R\$	154,44	6,00		R\$ 154,44	R\$ 0,00	R\$ 154,44	100,00%
18.11	Terminal ou conector de pressão - para cabo 35mm2	un	6,00	R\$ 19,76	R\$	116,78			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>												
<b>19.1 GERAL</b>												
19.1.1	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	2,10	R\$ 308,06	R\$	646,92			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.1.2	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²	4,35	R\$ 308,06	R\$	1.340,05			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
19.1.3	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	un	1,00	R\$ 5.822,53	R\$	5.822,53		1,00	R\$ 0,00	R\$ 5.822,53	R\$ 5.822,53	100,00%
19.1.4	Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes	un	1,00	R\$ 1.146,50	R\$	1.146,50		1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.146,50	R\$ 1.146,50	100,00%
19.1.5	Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes	un	1,00	R\$ 461,79	R\$	461,79		1,00	R\$ 0,00	R\$ 461,79	R\$ 461,79	100,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 067.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayme de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

19.1.6	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	9,60	R\$ 224,40	R\$	2.154,27	9,60	R\$ 0,00	R\$ 2.154,24	R\$ 2.154,24	100,00%
19.1.7	Peitoril em granito cinza, largura=15cm	m	12,20	R\$ 77,91	R\$	950,54	12,20	R\$ 950,54	R\$ 0,00	R\$ 950,54	100,00%
<b>19.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO</b>											
19.2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	149,52	R\$ 193,96	R\$	29.001,02	149,52	R\$ 29.001,02	R\$ 0,00	R\$ 29.001,02	100,00%
19.2.2	Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada	m²	7,56	R\$ 369,76	R\$	2.795,35	7,56	R\$ 2.795,35	R\$ 0,00	R\$ 2.795,35	100,00%
<b>20 SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.291,15</b>					
20.1	Limpeza de obra	m²	810,03	R\$ 1,86	R\$	1.507,63		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
20.2	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	R\$ 783,53	R\$	783,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>BDI(%) INCLUSOS NOS PREÇOS</b>			<b>TOTAIS</b>			<b>R\$ 876.654,17</b>		<b>R\$ 528.093,42</b>	<b>R\$ 68.292,76</b>	<b>R\$ 596.386,18</b>	<b>68,03%</b>

Observações

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo de Souza Leão e Silva  
 CPF: 007.741.304-07  
 Representante: Responsável legal da empresa

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanden de Mendonça Filho  
 Representante: Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro dos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911

Nome:  
Cargo:

Nome:  
Cargo:  
CREA Nº:

Nome:  
Cargo:

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Rysilda Jayme de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Representante: Responsável pelo Aportamento

Nome:  
Cargo:

Nome:  
Cargo:  
CREA Nº:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - FNDE - BM-10

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCAL: PAUDALHO-PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÁLCULO						
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
9.0			<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>							
9.1.4			Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	M²						
			VESTIÁRIO 1 E 2							
			PAREDES MAIORES (LADO PORTA)	2,00	8,70		1,80		2,00	62,64
			PAREDES MENORES (LATERIAS EXTERNAS E DO CHUVEIRO)	2,00	3,00		1,80		2,00	21,60
			DIVISÓRIA ENTRE OS BWC	2,00	2,00		1,80		2,00	14,40
				2,00	0,15		1,80		1,00	0,54
			DIVISÓRIA ENTRE BWC E PIA	2,00	2,10		1,80		2,00	15,12
				2,00	0,15		1,80		1,00	0,54
			DESCONTOS PORTAS	2,00		0,80	1,80		-1,00	-2,88
			<b>TOTAL</b>							<b>111,88</b>
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							99,36
			EM ADITIVO							12,52
9.3			<b>REVESTIMENTO TETO</b>	UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
9.3.1			Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	m²						
			VESTIÁRIOS - 1 E 2		8,70	3,00			2,00	52,20
			DEPÓSITO		2,00	2,70				5,40
			<b>TOTAL</b>							<b>57,60</b>
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							56,15
			EM ADITIVO							1,45
10			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
10.2			Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante	M²						
			VESTIÁRIOS - 1 E 2		8,70	3,00			2,00	52,20
			DEPÓSITO		2,00	2,70				5,40
			<b>TOTAL</b>							<b>57,60</b>
10			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
10.4			Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m²	B	b	h	espessura		
			Área do formato em trapézio $A = ((B+b) \cdot h) / 2$		2,10	1,60	3,90	0,20		1,44
			<b>TOTAL</b>							<b>1,44</b>
10.5			Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas	m²					QTD	
			Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas		0,30	0,30			30,00	2,70
			Piso tátil de direção em placas pré-moldadas		0,25	0,25			12,00	0,75
			<b>TOTAL</b>							<b>3,45</b>
11			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>	UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
11.1			Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²						
			Envolvimento dos pilares	20,00		0,65	1,00		2,000	26,00
			Envolvimento dos pilares	20,00		0,25	1,00		2,000	10,00
			Topo dos pilares	20,00	0,65	0,25			1,000	3,25
			<b>TOTAL</b>							<b>39,25</b>
11.2			Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos	m²						
			Total em planilha							301,08
			Pago no BM03 15% da pintura							45,17
			Pagar saldo de 85% da pintura da estrutura neste BM10							<b>255,91</b>
11.3			Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	m²						
			Total em planilha							301,08
			Pago no BM03 15% da pintura							45,17
			Pagar saldo de 85% da pintura da estrutura neste BM09							<b>255,91</b>
11.4			Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²						
			Telhas das laterais do arco 1	1,10	12,87				31,00	438,86
			Telhas das laterais do arco 2	1,10	12,87				31,00	438,86
			Forma da elipse (a x b TT) (apenas 1 frontal)		11,68	8,67		PJ	2,000	158,99
			<b>TOTAL</b>							<b>1036,71</b>
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							984,82
			EM ADITIVO							51,89
11.6			Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	m²						
			VESTIÁRIO INTERNO		8,75		0,75		4,000	26,25
					3,00		0,75		4,000	9,00
					2,10		0,75		4,000	6,30
			DEPÓSITO		2,00		2,60		2,000	10,40
					2,70		2,60		2,000	14,04
			ARQUIBANCADAS		26,50		1,30		2,000	68,90
			<b>TOTAL</b>							<b>134,89</b>
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							68,76
			EM ADITIVO							66,13
11.7			Pintura PVA, 2 demãos	m²						
			VESTIÁRIO INTERNO		8,75		0,75		4,000	26,25
					3,00		0,75		4,000	9,00
					2,10		0,75		4,000	6,30
			DEPÓSITO		2,00		2,60		2,000	10,40
					2,70		2,60		2,000	14,04
			ARQUIBANCADAS		26,50		1,30		2,000	68,90
			<b>TOTAL</b>							<b>134,89</b>
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							68,76
			EM ADITIVO							66,13
				UNID/QUANT.	LARG.	COMP.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Larne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	m²						
	VESTIÁRIO - EXTERNO	20,00		3,30			2,000	132,00
	DESCONTOS JANELAS	1,60		0,50			-7,000	-5,60
		0,50		0,50			-2,000	-0,50
	DESCONTOS PORTAS	0,80		2,10			-3,000	-5,04
		3,30		3,30			2,000	21,78
	FRONTAL	20,00		2,51			2,000	100,40
	ARQUIBANCADAS	26,50		1,30			2,000	68,90
		0,90					6,000	5,40
							<b>TOTAL</b>	<b>317,34</b>
	EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							243,15
	EM ADITIVO							<b>74,19</b>
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	m²						
	VESTIÁRIO - EXTERNO	20,00		3,30			2,000	132,00
	DESCONTOS JANELAS	1,60		0,50			-7,000	-5,60
		0,50		0,50			-2,000	-0,50
	DESCONTOS PORTAS	0,80		2,10			-3,000	-5,04
		3,30		3,30			2,000	21,78
	FRONTAL	20,00		2,51			2,000	100,40
	ARQUIBANCADAS	26,50		1,30			2,000	68,90
		0,90					6,000	5,40
							<b>TOTAL</b>	<b>317,34</b>
	EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							243,15
	EM ADITIVO							<b>74,19</b>
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>							
13.11	Caixa de inspeção 60x60cm	und						
	Caixas de inspeção esgoto do vestiário						5,00	5,00
							<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	UND						
	NO VESTIÁRIO 1 E 2	2,00	4,00					8,00
	DEPÓSITO	1,00	1,00					1,00
							<b>TOTAL</b>	<b>9,00</b>
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							
19.1.3	Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas	UND						
	Duas unidades colocadas na área de jogo							1,00
							<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
19.1.4	Conjunto metálico de travessia para futsal, inclusive redes	UND						
	Duas unidades colocadas na área de jogo							1,00
							<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
19.1.5	Conjunto metálico de travessia para vôlei, inclusive redes	UND						
	Duas unidades colocadas na área de jogo							1,00
							<b>TOTAL</b>	<b>1,00</b>
19.1.6	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
	Colocado na rampa de acesso em dupla altura e duas etapas-direito		2,10				2,00	4,20
	Colocado na rampa de acesso em dupla altura e duas etapas-esquerdo		3,70				2,00	7,40
							<b>TOTAL</b>	<b>11,60</b>
	EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							9,6
	EM ADITIVO							<b>2,00</b>

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo de Souza Leão e Silva  
 CPF: 067.741.304-07

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Ayslla Jayne de Moraes Silva  
 Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911



**PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
Construindo um novo amanhã!

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



9.1.4 Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes

9.1.4 Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes



9.1.4 Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes

9.1.4 Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes



9.3.1 Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação

9.3.1 Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 00.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

MUNICIPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023

PREPONENTE	OBJETO
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.



9.3.1 Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação



9.3.1 Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação



10.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante



10.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante



10.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante



10.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 003.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderleide Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.486

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

Carlos Pimenta Campos Gouveia  
Secretaria de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 40.911

MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023

PREPONENTE	OBJETO
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.



10.4 Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural

10.4 Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural



10.5 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas

10.5 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas



11.1 Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos

11.1 Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 067.731.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 31.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CRBA nº 181726131-2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 40.911



MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



11.2 Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos



11.2 Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos



11.2 Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos



11.3 Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos



11.3 Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos



11.3 Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos







OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 067.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderci de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayme de Moraes Silva  
Eng. Civil CPF: 067.741.304-07

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretaria de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			

	
11.4 Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	11.4 Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos
	
11.4 Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	11.4 Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos
	
11.4 Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	11.4 Telhas das laterais do arco 2


OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Pinho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2


Carlos Pinheiro Santos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 43.011

MUNICIPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV.RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			

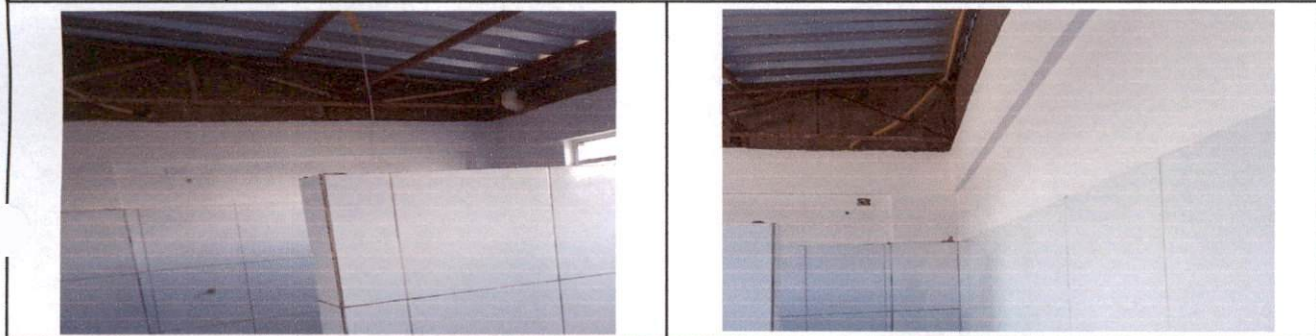


11.6 Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA

11.6 Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA

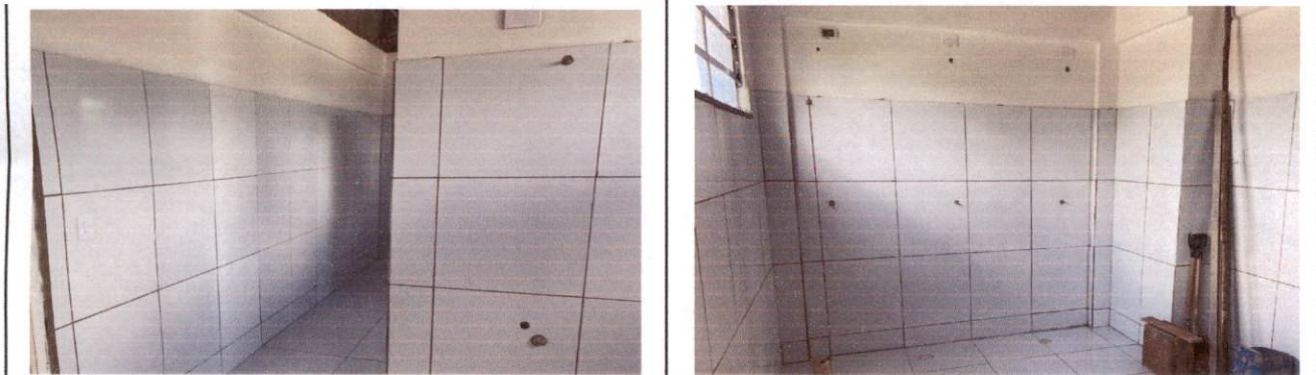

11.6 Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA

11.7 Pintura PVA, 2 demãos

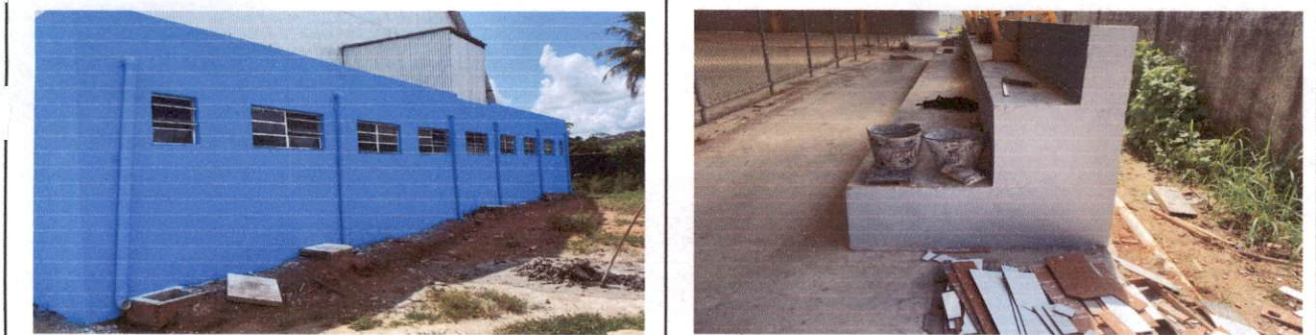

11.8 Fundo selador acrílico para grafiato

11.8 Fundo selador acrílico para grafiato

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.111.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlinda Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 21.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayse de Moraes Silva  
Eng. CIVIL CREM nº 181726131-2

Carlos Filipe Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat: 21.498

MUNICIPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			




11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)

11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)



11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)

11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)

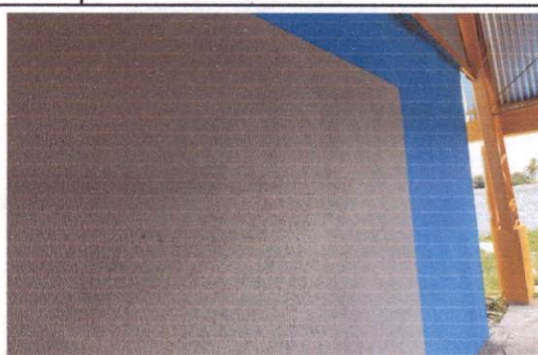

11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)

11.9 Pintura texturizada acrílica (grafiato)

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911


OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



13.11	Caixa de inspeção 60x60cm	13.11	Caixa de inspeção 60x60cm
-------	---------------------------	-------	---------------------------

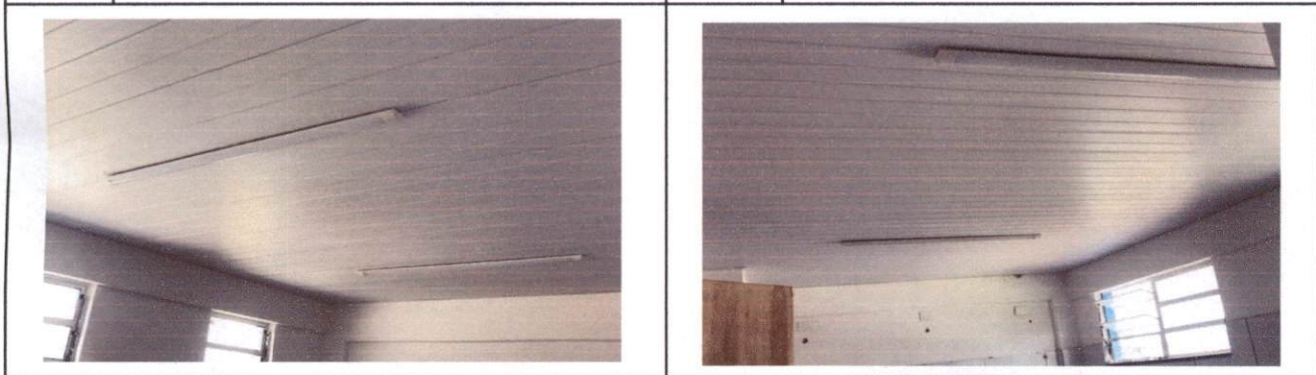

17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação
--------	--	--------	--

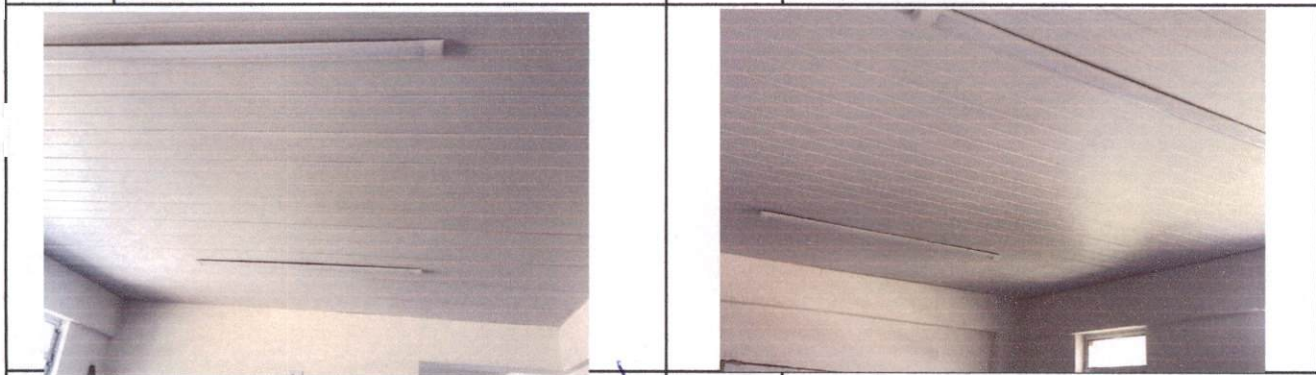

17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação	17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa, fornecimento e instalação
--------	--	--------	--

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 003.711.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlyde Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 51.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREM nº 181726131-2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


MUNICIPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM:	10
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	DATA EMISSÃO:	02/08/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			



19.1.3 Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas



19.1.4 Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes

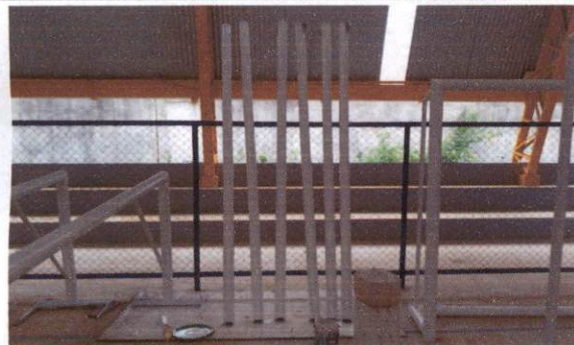

19.1.5 Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes



19.1.6 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"



19.1.6 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"



19.1.6 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 00 741 304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 44.498

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA: 181726131-2

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Contrato

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/05/2023 à 07/05/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	FERIADO - 01/05/2023						
	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NOS VESTIARIOS- PAREDE						
	DESCANSO SEMNAL - 06/05 À 07/05/2023						
Fiscalização	<del>                     Prefeitura Municipal de Paudalho/PE                      Paulo Vanderlei de Mendonça Filho                      Engenheiro Civil                      Matr. 41.498                 </del>						
	GOMSON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
	Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 08/05/2023 à 14/05/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO NOS VESTIARIOS- PAREDE						
	DESCANSO SEMANLA - 13/05 À 14/05/2023						
Fiscalização	<del>                     Prefeitura Municipal de Paudalho/PE                      Paulo Vanderlei de Mendonça Filho                      Engenheiro Civil                      Matr. 41.498                 </del>						
	GOMSON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
	Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 15/05/2023 à 21/05/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	APLICAÇÃO DE FORRO DE PVC VESSTIARIOS E DEPOSITO						
	DESCANSO SEMANAL - 20/05 Á 21/05/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 11.493			OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayme de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2			
	Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 22/05/2023 à 28/05/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	Chuva
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO						
	DESCANSO SEMANAL - 27/05 Á 28/05/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr: 11.493			OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayme de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2			
	Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data



				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 29/05/2023 à 04/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
					Prazo Decorrido:		Prazo Restante:
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO VESTIARIOS E DEPOSITO- PISO						
	DESCANSO SEMANAL - 03/06 À 04/06/2023						
Fiscalização	<p style="text-align: center;"> <i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i>  <i>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho</i>  <i>Engenheiro Civil</i>  <i>Mat: 14.498</i> </p>						
	<p style="text-align: right;"> <i>CCRASON EMPREENDIMENTOS LTDA</i>  <i>Ayslla Janyne de Moraes Silva</i>  <i>Eng. Civil CREA n° 181726131-2</i> </p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 05/06/2023 à 11/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
					Prazo Decorrido:		Prazo Restante:
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO VESTIARIOS E DEPOSITO- PISO						
	DESCANSO SEMNAL - 10/06 À 11/06/2023						
Fiscalização	<p style="text-align: center;"> <i>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE</i>  <i>Paulo Vanderlei de Mendonça Filho</i>  <i>Engenheiro Civil</i>  <i>Mat: 14.498</i> </p>						
	<p style="text-align: right;"> <i>CCRASON EMPREENDIMENTOS LTDA</i>  <i>Ayslla Janyne de Moraes Silva</i>  <i>Eng. Civil CREA n° 181726131-2</i> </p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/06/2023 à 18/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	PINTURA EPOX PARA ESTRUTURA DE CONCRETO						
	DESCANSO SEMANAL -						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 1.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				19/06/2023 à 25/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE CAIXA SANITARIA DE INPENSÃO E CAIXAS DE ESGOTO						
	DESCANSO SEMANAL - 25/06 À 25/06/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 1.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/06/2023 à 02/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
	Prazo Decorrido:		Prazo Restante:			Manhã	X
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE CAIXA SANITARIA DE INPENSÃO E CAIXAS DE ESGOTO						
	DESCANSO SEMANAL - 01/07 Á 02/07/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/07/2023 à 09/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
	Prazo Decorrido:		Prazo Restante:			Manhã	X
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE CAIXA SANITARIA DE INPENSÃO E CAIXAS DE ESGOTO						
	DESCANSO SEMANAL - 08/07 Á 09/07/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/07/2023 à 16/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE JOGOS DE BARRA DE FUTSAL, VOLÊI E BASQUETE						
	DESCANSO SEMANAL - 15/07 À 16/07/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
	Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/07/2023 à 23/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva	
						Fraca	Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	EXECUÇÃO DE JOGOS DE BARRA DE FUTSAL, VOLÊI E BASQUETE						
	DESCANSO SEMANAL - 22/07 À 23/07/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
	Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/07/2023 à 31/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: MENINO JESUS - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
				Manhã	X		
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Tarde	X		
Horário de Trabalho:				Noite			
Prazo da Obra							
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES						
Serviços Executados	EXECUÇÃO DO CORRIMÃO DA RAMPA						
	FERIADO 27/07/2023						
	DESCANSO SEMANAL - 29/07/ À 30/07/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  Paulo Vandertei de Albuquerque Filho  Engenheiro Civil  Mat.: 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  Ayslla Janyne Moraes Silva  Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
	Visto Fiscalização:	Visto Contratada:			Data		
