

**C.I nº 1041/2023**

**Da:** Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

**Para:** Secretaria Municipal de Educação

Venho através desta, encaminhar documentos descritos na tabela abaixo, para **análise e conhecimentos**, conforme documentos em anexo.

Descrição	Dados da Empresa	Documentos em anexo
10º BM do Contrato 013/2022- cujo objeto e a Contratação de empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Construção de quadra coberta com vestiário da Escola Municipal Sinhô Bandeira, no Município de Paudalho - PE.	<b>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP</b>  <b>CNPJ:08.307.543/0001-68;</b>  <b>Dados Bancário Banco OI SCD (329) Ag. 0001; C/c: 85715-0</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nota Fiscal nº <b>727</b>;</li><li>• Memória de Cálculo;</li><li>• Relatório Fotográfico;</li><li>• Plano de Trabalho.</li></ul>

*Atenciosamente,*



**Carlos Pinheiro Campos Gouveia**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Matricula – 48.911

Recbi 17-10-23  
Silvia Guimarães



PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS

**NFS-e**  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota  
**00000727**  
Data e Hora de Emissão  
**10/10/2023 11:31:31**  
Código de Verificação  
**YHQ3-Q1TI**

20231010/08307543000168

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **08.307.543/0001-68** Inscrição Municipal: **504.216-0**  
Nome/Razão Social: **OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**  
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 5001, APTO 0102 - BOA VIAGEM - CEP: 51020-030**  
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **octagonitda@hotmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO**  
CPF/CNPJ: **29.355.454/0001-67** Inscrição Municipal: **----**  
Endereço: **PRAÇA PEDRO COUTINHO 68 - CENTRO - CEP: 55825-000**  
Município: **Paudalho** UF: **PE** E-mail: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL, SINHO BANDEIRA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE, CONTRATO Nº 013/2022, DURANTE O PERÍODO 01/06/2023 A 30/09/2023.

MAO DE OBRA (40%) R\$ 12.351,80  
MATERIAL (60%) R\$ 18.527,71

CNO - 90.008-85029/77  
ART - PE20220779792

DADOS BANCARIOS:  
BANCO QI SCD (329)  
AGENCIA: 0001  
CONTA CORRENTE: 85715-0

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 41.498

ATESTO 10/10/2023  
 SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 1.358,70	Retenção de IRPJ R\$ 370,55	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.879,51**

Código da Atividade Prestada  
**4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**  
**07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
18.527,71	0,00	12.351,80	5,00%	617,59	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.008.85029/77 / Anotação de Responsabilidade Técnica: PE20220779792

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 673-4  
Conta corrente 25123-2 PM PAUDALHO -FEB

**Creditado**

Banco 329 QI SCD S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 857150  
CNPJ 08.307.543/0001-68  
Nome favorecido OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.005  
Valor 28.532,67  
Destinação 0  
Data transferência 20/10/2023

**"C" - CNPJ diferente**

Autenticação SISBB B8222DFC3104E222

Assinada por	JF229578 TULIO JOSE VIEIRA DUDA	20/10/2023 14:36:07
	JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA	20/10/2023 14:36:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB531065 MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA.



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA DO PAUDALHO	10	05/10/2023 01/06/2023 até 30/09/2023	013/2022	24/2/2022

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	CNPJ	Fontes do recurso:
25/04/2022	20/04/2023	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	08.307.543/0001-68	RECURSO PRÓPRIO

CTEF: Valor do contrato + Aditivo (R\$)	Valor do contrato (R\$)	Objeto do CTEF ( resumido)	Empreendimento:
R\$ 841.233,79	R\$ 841.233,79	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHO BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.	Construção de Edifícios (também para Reformas)
R\$ 30.879,51	R\$ 30.879,51		
R\$ 45.138,44	R\$ 45.138,44	Local da obra ( Bairro / Município / UF)	
		PAUDALHO/PE	

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsão no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	(%)
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 57.834,50</b>						
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	R\$ 361,81	R\$ 3.618,10	10,00			R\$ 3.618,10	R\$ 0,00	R\$ 3.618,10 100,00%
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m²	66,00	R\$ 104,58	R\$ 6.902,28				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%
1.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	R\$ 1.976,37	R\$ 1.976,37	1,00			R\$ 1.976,37	R\$ 0,00	R\$ 1.976,37 100,00%
1.4	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	R\$ 2.822,19	R\$ 2.822,19	1,00			R\$ 2.822,19	R\$ 0,00	R\$ 2.822,19 100,00%
1.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	R\$ 884,43	R\$ 2.228,76	2,52			R\$ 2.228,76	R\$ 0,00	R\$ 2.228,76 100,00%
1.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	R\$ 979,55	R\$ 19.591,00	20,00			R\$ 19.591,00	R\$ 0,00	R\$ 19.591,00 100,00%
1.7	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	R\$ 751,28	R\$ 15.025,60	20,00			R\$ 15.025,60	R\$ 0,00	R\$ 15.025,60 100,00%
1.8	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	810,03	R\$ 6,58	R\$ 5.330,00	810,03			R\$ 5.330,00	R\$ 0,00	R\$ 5.330,00 100,00%
1.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	945,00	R\$ 0,36	R\$ 340,20	944,40			R\$ 339,98	R\$ 0,00	R\$ 339,98 99,94%
<b>2.</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 5.758,86</b>						
2.1.1	Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrame)	m³	13,20	R\$ 56,97	R\$ 752,00	13,20			R\$ 752,00	R\$ 0,00	R\$ 752,00 100,00%
2.1.2	Escavação mecanizada com previsão de forma	m³	41,08	R\$ 72,99	R\$ 2.998,43	36,36			R\$ 2.653,90	R\$ 0,00	R\$ 2.653,90 88,51%
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	50,00	R\$ 2,66	R\$ 133,00	50,00			R\$ 132,99	R\$ 0,00	R\$ 132,99 99,99%
2.1.4	Realterro mecanizado de valas com retroescavadeira	m³	26,64	R\$ 34,75	R\$ 925,74	24,28			R\$ 843,72	R\$ 0,00	R\$ 843,72 91,14%
<b>2.2</b>	<b>ARQUIBANCADAS</b>										
2.2.1	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias)	m³	16,67	R\$ 56,97	R\$ 949,69	13,20			R\$ 752,00	R\$ 0,00	R\$ 752,00 79,18%
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>R\$ 41.692,74</b>						
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>										
3.1.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	16,18	R\$ 30,76	R\$ 497,70	16,18			R\$ 497,70	R\$ 0,00	R\$ 497,70 100,00%
3.1.2	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	68,15	R\$ 129,15	R\$ 8.801,57	35,40			R\$ 4.571,90	R\$ 0,00	R\$ 4.571,90 51,94%
3.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	126,45	R\$ 18,06	R\$ 2.283,69	126,45			R\$ 2.283,68	R\$ 0,00	R\$ 2.283,68 100,00%
3.1.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	149,82	R\$ 15,52	R\$ 2.325,21	147,62			R\$ 2.291,05	R\$ 0,00	R\$ 2.291,05 98,53%
3.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	73,64	R\$ 18,71	R\$ 1.377,80	73,46			R\$ 1.374,43	R\$ 0,00	R\$ 1.374,43 99,76%
3.1.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,56	R\$ 543,67	R\$ 3.566,48	6,56			R\$ 3.566,47	R\$ 0,00	R\$ 3.566,47 100,00%
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES</b>										
3.2.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	33,82	R\$ 29,68	R\$ 1.003,78	33,82			R\$ 1.003,77	R\$ 0,00	R\$ 1.003,77 100,00%
3.2.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	4,07	R\$ 391,62	R\$ 1.593,89				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 0,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jaynne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.041.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderle de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat. 48.911

3.2.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	134,40	R\$ 63,94	R\$	8.593,54	124,88		R\$ 7.984,82	R\$ 0,00	R\$ 7.984,82	92,92%
3.2.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	245,27	R\$ 17,20	R\$	4.218,64	245,27		R\$ 4.218,64	R\$ 0,00	R\$ 4.218,64	100,00%
3.2.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	169,82	R\$ 18,71	R\$	3.177,33	146,48		R\$ 2.740,63	R\$ 0,00	R\$ 2.740,63	86,26%
3.2.6	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	7,92	R\$ 537,01	R\$	4.253,12	7,76		R\$ 4.167,18	R\$ 0,00	R\$ 4.167,18	97,98%
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>R\$ 350.272,40</b>						
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>											
4.1.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	28,39	R\$ 34,95	R\$	992,23	28,39		R\$ 992,23	R\$ 0,00	R\$ 992,23	100,00%
4.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	76,36	R\$ 16,06	R\$	1.226,34	76,36		R\$ 1.226,34	R\$ 0,00	R\$ 1.226,34	100,00%
4.1.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,00	R\$ 13,56	R\$	501,72	37,00		R\$ 501,72	R\$ 0,00	R\$ 501,72	100,00%
4.1.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,45	R\$ 509,77	R\$	739,17	1,45		R\$ 739,16	R\$ 0,00	R\$ 739,16	100,00%
<b>4.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES</b>											
4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	47,69	R\$ 57,53	R\$	2.743,61	47,69		R\$ 2.743,60	R\$ 0,00	R\$ 2.743,60	100,00%
4.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	R\$ 17,93	R\$	1.597,38	89,09		R\$ 1.597,38	R\$ 0,00	R\$ 1.597,38	100,00%
4.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,27	R\$ 16,06	R\$	148,88	9,27		R\$ 148,87	R\$ 0,00	R\$ 148,87	99,99%
4.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	56,73	R\$ 19,98	R\$	1.133,47	56,73		R\$ 1.133,46	R\$ 0,00	R\$ 1.133,46	100,00%
4.2.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	2,74	R\$ 492,13	R\$	1.348,44	2,74		R\$ 1.348,43	R\$ 0,00	R\$ 1.348,43	100,00%
<b>4.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>											
4.3.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	4,68	R\$ 34,95	R\$	163,57	3,70		R\$ 129,31	R\$ 0,00	R\$ 129,31	79,05%
4.3.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	14,23	R\$ 15,52	R\$	220,85	13,82		R\$ 214,48	R\$ 0,00	R\$ 214,48	97,12%
4.3.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	3,67	R\$ 18,71	R\$	68,67	3,67		R\$ 68,67	R\$ 0,00	R\$ 68,67	100,00%
4.3.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,23	R\$ 509,77	R\$	117,25	0,16		R\$ 81,56	R\$ 0,00	R\$ 81,56	69,56%
<b>4.4</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA</b>											
4.4.1	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	14,27	R\$ 57,53	R\$	820,95			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	29,90	R\$ 17,93	R\$	536,11			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,44	R\$ 19,98	R\$	268,53			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.4.4	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,86	R\$ 492,13	R\$	423,23			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA</b>											
4.5.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	10,80	R\$ 21,88	R\$	236,30	10,51		R\$ 229,95	R\$ 0,00	R\$ 229,95	97,31%
4.5.2	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m²	37,25	R\$ 142,99	R\$	5.326,38	35,09		R\$ 5.017,51	R\$ 0,00	R\$ 5.017,51	94,20%
4.5.3	Lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	745,00	R\$ 9,85	R\$	7.338,25	718,50		R\$ 7.077,22	R\$ 0,00	R\$ 7.077,22	96,44%
4.5.4	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	745,00	R\$ 15,99	R\$	11.912,55	718,50		R\$ 11.488,81	R\$ 0,00	R\$ 11.488,81	96,44%
4.5.5	Barra de transferência para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø 12,5mm, com fornecimento e instalação	kg	643,46	R\$ 13,56	R\$	8.725,32	643,46		R\$ 8.725,32	R\$ 0,00	R\$ 8.725,32	100,00%
4.5.6	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação)	m²	745,00	R\$ 74,32	R\$	55.368,40	718,50		R\$ 53.398,92	R\$ 0,00	R\$ 53.398,92	96,44%
<b>4.6</b>	<b>CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS</b>											
4.6.1	Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	20,04	R\$ 21,88	R\$	438,48	10,64		R\$ 232,79	R\$ 0,00	R\$ 232,79	53,09%
4.6.2	Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação	m²	228,16	R\$ 15,99	R\$	3.648,28	79,36		R\$ 1.268,96	R\$ 0,00	R\$ 1.268,96	34,78%
4.6.3	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	6,35	R\$ 513,65	R\$	3.261,68	6,33		R\$ 3.251,40	R\$ 0,00	R\$ 3.251,40	99,68%
<b>4.7</b>	<b>CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES</b>											
4.7.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	47,12	R\$ 34,95	R\$	1.646,84	39,60		R\$ 1.384,02	R\$ 0,00	R\$ 1.384,02	84,04%
4.7.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,34	R\$ 509,77	R\$	2.212,40	3,58		R\$ 1.824,97	R\$ 0,00	R\$ 1.824,97	82,49%
<b>4.8</b>	<b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>											
4.8.1	Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm	m	25,90	R\$ 31,65	R\$	819,74	17,70		R\$ 560,20	R\$ 0,00	R\$ 560,20	68,34%
<b>4.9</b>	<b>ESTRUTURA METALICA</b>											

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 067.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

4.9.1	Estrutura metálica para colunas e travamentos	kg	11.245,00	R\$ 19,48	R\$	219.052,60	11.194,91		R\$ 218.076,84	R\$ 0,00	R\$ 218.076,84	99,55%
4.9.2	Lanterim em estrutura metálica	m²	206,40	R\$ 24,62	R\$	5.081,57	206,40		R\$ 5.081,56	R\$ 0,00	R\$ 5.081,56	100,00%
4.9.3	Estrutura metálica para telhas do vestiário	kg	891,00	R\$ 13,64	R\$	12.153,24	891,00		R\$ 12.153,24	R\$ 0,00	R\$ 12.153,24	100,00%
<b>5</b>	<b>SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>				<b>R\$</b>	<b>26.917,06</b>						
<b>5.1</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>											
5.1.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	m²	177,58	R\$ 48,95	R\$	8.692,54	177,58		R\$ 8.692,54	R\$ 0,00	R\$ 8.692,54	100,00%
5.1.2	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	65,12	R\$ 23,02	R\$	1.499,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1.3	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	14,40	R\$ 498,06	R\$	7.172,06		14,40	R\$ 0,00	R\$ 7.172,06	R\$ 7.172,06	100,00%
<b>5.2</b>	<b>ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS</b>											
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	114,58	R\$ 74,65	R\$	8.553,40	114,58		R\$ 8.553,39	R\$ 0,00	R\$ 8.553,39	100,00%
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>R\$</b>	<b>10.412,04</b>						
<b>6.1</b>	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>											
6.1.1	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	3,00	R\$ 945,93	R\$	2.537,79	3,00		R\$ 2.537,79	R\$ 0,00	R\$ 2.537,79	100,00%
6.1.2	PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	4,00	R\$ 292,08	R\$	1.168,32		4,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,32	R\$ 1.168,32	100,00%
6.1.3	PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças	un	2,00	R\$ 347,97	R\$	695,94		2,00	R\$ 0,00	R\$ 695,94	R\$ 695,94	100,00%
<b>6.2</b>	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>											
6.2.1	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3	un	2,00	R\$ 301,60	R\$	603,20			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para a porta PM1	m²	0,98	R\$ 255,48	R\$	245,26			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.2.3	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	6,00	R\$ 91,88	R\$	551,28		6,00	R\$ 0,00	R\$ 551,28	R\$ 551,28	100,00%
<b>6.3</b>	<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>											
6.3.1	Janela de Alumínio, basculante 50x50cm, JA-1.conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	0,50	R\$ 534,75	R\$	267,38	0,50		R\$ 267,37	R\$ 0,00	R\$ 267,37	100,00%
6.3.2	Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2.conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	5,60	R\$ 534,75	R\$	2.994,60	5,60		R\$ 2.994,60	R\$ 0,00	R\$ 2.994,60	100,00%
<b>6.4</b>	<b>VIDROS</b>											
6.4.1	Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura	m²	2,70	R\$ 499,36	R\$	1.348,27	2,70		R\$ 0,00	R\$ 1.348,27	R\$ 1.348,27	100,00%
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					<b>146.777,14</b>						
7.1	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	819,82	R\$ 99,28	R\$	81.391,73	819,82		R\$ 81.391,73	R\$ 0,00	R\$ 81.391,73	100,00%
7.2	Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	165,00	R\$ 99,28	R\$	16.381,20	158,99		R\$ 15.784,52	R\$ 0,00	R\$ 15.784,52	96,36%
7.3	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco)	m²	208,32	R\$ 99,28	R\$	20.682,01	208,32		R\$ 20.682,01	R\$ 0,00	R\$ 20.682,01	100,00%
7.4	Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral)	m²	145,78	R\$ 99,28	R\$	14.473,04	145,78		R\$ 14.473,04	R\$ 0,00	R\$ 14.473,04	100,00%
7.5	Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação	m²	78,66	R\$ 96,27	R\$	4.426,20	77,22		R\$ 4.345,16	R\$ 0,00	R\$ 4.345,16	98,17%
7.6	Rufo metálico		31,68	R\$ 97,01	R\$	1.806,08	29,50		R\$ 1.681,79	R\$ 0,00	R\$ 1.681,79	93,12%
7.7	Calha em chapa metálica para vestiário	m	16,80	R\$ 70,43	R\$	1.183,22	16,80		R\$ 1.183,22	R\$ 0,00	R\$ 1.183,22	100,00%
7.8	Calha em chapa metálica para quadra		64,00	R\$ 94,73	R\$	6.062,72	64,00		R\$ 6.062,72	R\$ 0,00	R\$ 6.062,72	100,00%
7.9	Pingadeira de concreto	m	33,60	R\$ 11,04	R\$	370,94			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>9.041,83</b>						
8.1	Impermeabilização com emulsão asfáltica 2 demãos, baldrame	m²	202,55	R\$ 44,64	R\$	9.041,83	202,55		R\$ 9.041,82	R\$ 0,00	R\$ 9.041,82	100,00%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>					<b>28.557,92</b>						
<b>9.1</b>	<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>											
9.1.1	Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	197,74	R\$ 4,46	R\$	881,92	197,74		R\$ 881,92	R\$ 0,00	R\$ 881,92	100,00%
9.1.2	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	197,74	R\$ 31,56	R\$	6.240,67	109,08		R\$ 3.442,56	R\$ 0,00	R\$ 3.442,56	55,16%
9.1.3	Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm	m²	33,98	R\$ 26,65	R\$	905,57	33,98		R\$ 905,56	R\$ 0,00	R\$ 905,56	100,00%
9.1.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40cm - inclusive rejunte - aplicadas à altura inteira das paredes	m²	99,36	R\$ 67,83	R\$	6.739,59	99,36		R\$ 6.739,58	R\$ 0,00	R\$ 6.739,58	100,00%
<b>9.2</b>	<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>											
9.2.1	Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	243,15	R\$ 4,46	R\$	1.084,45	243,15		R\$ 1.084,44	R\$ 0,00	R\$ 1.084,44	100,00%
9.2.2	Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm	m²	243,15	R\$ 36,48	R\$	8.870,11	243,15		R\$ 8.870,10	R\$ 0,00	R\$ 8.870,10	100,00%
<b>9.3</b>	<b>REVESTIMENTO TETO</b>											
9.3.1	Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	m²	56,15	R\$ 68,31	R\$	3.835,61		56,15	R\$ 0,00	R\$ 3.835,60	R\$ 3.835,60	100,00%
<b>10</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>6.253,27</b>						
10.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	58,15	R\$ 47,69	R\$	2.773,17	58,04		R\$ 2.767,92	R\$ 0,00	R\$ 2.767,92	99,81%
10.2	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	58,15	R\$ 42,21	R\$	2.454,51	57,60		R\$ 2.431,29	R\$ 0,00	R\$ 2.431,29	99,05%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysla Jaynara Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Sá Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

10.3	Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm	m	0,86	R\$ 101,94	R\$	87,67			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.4	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	m²	1,82	R\$ 116,06	R\$	211,23		0,68	R\$ 0,00	R\$ 78,92	R\$ 78,92	37,36%
10.5	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas	m²	5,85	R\$ 124,22	R\$	726,69		2,64	R\$ 0,00	R\$ 327,94	R\$ 327,94	45,13%
11	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					<b>45.301,60</b>						
11.1	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	47,12	R\$ 53,69	R\$	2.529,87	39,25		R\$ 2.107,33	R\$ 0,00	R\$ 2.107,33	83,30%
11.2	Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	R\$ 20,52	R\$	6.178,16	301,08		R\$ 6.178,16	R\$ 0,00	R\$ 6.178,16	100,00%
11.3	Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos	m²	301,08	R\$ 20,52	R\$	6.178,16	301,08		R\$ 6.178,16	R\$ 0,00	R\$ 6.178,16	100,00%
11.4	Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos	m²	984,82	R\$ 20,52	R\$	20.208,51	984,82		R\$ 20.208,50	R\$ 0,00	R\$ 20.208,50	100,00%
11.5	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva	m	275,60	R\$ 12,30	R\$	3.389,88			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.6	Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA	m²	68,76	R\$ 9,42	R\$	647,72	68,76		R\$ 647,71	R\$ 0,00	R\$ 647,71	100,00%
11.7	Pintura PVA, 2 demãos	m²	68,76	R\$ 11,04	R\$	759,11	68,76		R\$ 759,11	R\$ 0,00	R\$ 759,11	100,00%
11.8	Fundo selador acrílico para grafiato	m²	243,15	R\$ 2,53	R\$	615,17	243,15		R\$ 615,16	R\$ 0,00	R\$ 615,16	100,00%
11.9	Pintura texturizada acrílica (grafiato)	m²	243,15	R\$ 19,72	R\$	4.794,92	243,15		R\$ 4.794,91	R\$ 0,00	R\$ 4.794,91	100,00%
12	<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>					<b>6.109,42</b>						
12.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>											
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	38,90	R\$ 5,69	R\$	221,34	35,96		R\$ 204,61	R\$ 0,00	R\$ 204,61	92,44%
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 50mm	m	35,76	R\$ 20,11	R\$	719,13	33,70		R\$ 677,70	R\$ 0,00	R\$ 677,70	94,24%
12.1.3	Curva PVC 45º soldável Ø 50mm	un	4,00	R\$ 22,85	R\$	91,40	4,00		R\$ 91,40	R\$ 0,00	R\$ 91,40	100,00%
12.1.4	Curva PVC 90º soldável Ø 25mm	un	22,00	R\$ 7,33	R\$	161,26	22,00		R\$ 161,26	R\$ 0,00	R\$ 161,26	100,00%
12.1.5	Curva PVC 90º soldável Ø 50mm	un	8,00	R\$ 26,45	R\$	211,60	8,00		R\$ 211,60	R\$ 0,00	R\$ 211,60	100,00%
12.1.6	Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2"	un	18,00	R\$ 14,88	R\$	267,84	18,00		R\$ 267,84	R\$ 0,00	R\$ 267,84	100,00%
12.1.7	Tê PVC soldável 25mm	un	10,00	R\$ 6,32	R\$	63,20	10,00		R\$ 63,20	R\$ 0,00	R\$ 63,20	100,00%
12.1.8	Tê PVC soldável 50mm	un	8,00	R\$ 22,71	R\$	181,68	8,00		R\$ 181,68	R\$ 0,00	R\$ 181,68	100,00%
12.1.9	Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm	un	6,00	R\$ 21,22	R\$	127,32	6,00		R\$ 127,32	R\$ 0,00	R\$ 127,32	100,00%
12.1.10	Luva soldável com rosca 25mm x 3/4"	un	8,00	R\$ 4,69	R\$	37,52			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.1.11	Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm	un	4,00	R\$ 8,68	R\$	34,72	4,00		R\$ 34,72	R\$ 0,00	R\$ 34,72	100,00%
12.2	<b>REGISTROS E OUTROS</b>											
12.2.1	Registro de gaveta bruto Ø 1"	un	6,00	R\$ 76,82	R\$	460,92	6,00		R\$ 460,92	R\$ 0,00	R\$ 460,92	100,00%
12.2.2	Registro de gaveta bruto Ø 2"	un	4,00	R\$ 143,44	R\$	573,76	4,00		R\$ 573,76	R\$ 0,00	R\$ 573,76	100,00%
12.2.3	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	8,00	R\$ 78,05	R\$	624,40	8,00		R\$ 624,40	R\$ 0,00	R\$ 624,40	100,00%
12.2.4	Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x 3/4" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	R\$ 3,71	R\$	29,68	8,00		R\$ 29,68	R\$ 0,00	R\$ 29,68	100,00%
12.2.5	Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro	un	12,00	R\$ 5,63	R\$	67,56	12,00		R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 67,56	100,00%
12.2.6	Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro	un	8,00	R\$ 22,47	R\$	179,76	8,00		R\$ 179,76	R\$ 0,00	R\$ 179,76	100,00%
12.2.7	Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa água	un	4,00	R\$ 93,18	R\$	372,72	1,00		R\$ 93,18	R\$ 0,00	R\$ 93,18	25,00%
12.2.8	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm	un	10,00	R\$ 8,78	R\$	87,80		8,00	R\$ 0,00	R\$ 70,24	R\$ 70,24	80,00%
12.2.9	Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L	un	1,00	R\$ 1.595,81	R\$	1.595,81	1,00		R\$ 1.595,81	R\$ 0,00	R\$ 1.595,81	100,00%
13	<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>					<b>5.675,94</b>						
13.1	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	24,68	R\$ 17,77	R\$	438,56	24,67		R\$ 438,38	R\$ 0,00	R\$ 438,38	99,96%
13.2	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	9,50	R\$ 26,81	R\$	254,70	9,50		R\$ 254,69	R\$ 0,00	R\$ 254,69	100,00%
13.3	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	28,58	R\$ 52,00	R\$	1.486,16	9,48		R\$ 492,96	R\$ 0,00	R\$ 492,96	33,17%
13.4	Curva curta PVC 90º Ø 40mm	un	6,00	R\$ 10,09	R\$	60,54	6,00		R\$ 60,54	R\$ 0,00	R\$ 60,54	100,00%
13.5	Curva curta PVC 90º Ø 100mm	un	18,00	R\$ 32,29	R\$	581,22	12,00		R\$ 387,48	R\$ 0,00	R\$ 387,48	66,67%
13.6	Joelho PVC 45º Ø 40mm	un	5,00	R\$ 6,72	R\$	33,60	5,00		R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60	100,00%
13.7	Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1 1/2"	un	10,00	R\$ 9,41	R\$	94,10	10,00		R\$ 94,10	R\$ 0,00	R\$ 94,10	100,00%
13.8	Junção PVC simples 40mm, soldável	un	6,00	R\$ 11,42	R\$	68,52	6,00		R\$ 68,52	R\$ 0,00	R\$ 68,52	100,00%
13.9	Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm	un	8,00	R\$ 14,49	R\$	115,92	8,00		R\$ 115,92	R\$ 0,00	R\$ 115,92	100,00%
13.10	Caixa Sifonada 150x150x50mm	un	6,00	R\$ 87,82	R\$	526,92	6,00		R\$ 526,92	R\$ 0,00	R\$ 526,92	100,00%
13.11	Caixa de inspeção 60x60cm	un	5,00	R\$ 403,14	R\$	2.015,70	5,00		R\$ 2.015,70	R\$ 0,00	R\$ 2.015,70	100,00%
14	<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					<b>7.068,36</b>						
14.1	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>											
14.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	m	104,40	R\$ 29,10	R\$	3.038,04	104,40		R\$ 3.038,04	R\$ 0,00	R\$ 3.038,04	100,00%
14.1.2	Joelho 90 - 100mm	un	20,00	R\$ 23,31	R\$	466,20	20,00		R\$ 466,20	R\$ 0,00	R\$ 466,20	100,00%
14.2	<b>ACESSÓRIOS</b>											
14.2.1	Ralo hemisférico de ferro fundido Ø 100mm (tipo abacaxi)	un	12,00	R\$ 28,25	R\$	339,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	8,00	R\$ 403,14	R\$	3.225,12	8,00		R\$ 3.225,12	R\$ 0,00	R\$ 3.225,12	100,00%
15	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>					<b>12.929,66</b>						
15.1	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	6,00	R\$ 218,64	R\$	1.311,84		6,00	R\$ 0,00	R\$ 1.311,84	R\$ 1.311,84	100,00%
15.2	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	6,00	R\$ 355,36	R\$	2.132,16		6,00	R\$ 0,00	R\$ 2.132,16	R\$ 2.132,16	100,00%
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca	un	6,00	R\$ 141,32	R\$	847,92		6,00	R\$ 0,00	R\$ 847,92	R\$ 847,92	100,00%
15.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 137,10	R\$	274,20		2,00	R\$ 0,00	R\$ 274,20	R\$ 274,20	100,00%
15.5	Ducha Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	2,00	R\$ 77,84	R\$	155,68			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	8,00	R\$ 63,87	R\$	510,96		8,00	R\$ 0,00	R\$ 510,96	R\$ 510,96	100,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayme de Moraes Silva  
Eng. Civil - CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marta de Souza Leão e Silva  
CPT - 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Mendonça Filho  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 48.911

Carlos Pinheiro Ramos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat. 48.911

15.7	Tomadeira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	1,00	R\$ 48,96	R\$	48,96			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	R\$ 99,76	R\$	798,08		8,00	R\$ 0,00	R\$ 798,08	R\$ 798,08	100,00%
15.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	6,00	R\$ 67,70	R\$	406,20		6,00	R\$ 0,00	R\$ 406,20	R\$ 406,20	100,00%
15.10	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	4,00	R\$ 83,43	R\$	333,72		4,00	R\$ 0,00	R\$ 333,72	R\$ 333,72	100,00%
15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolo	un	2,00	R\$ 35,82	R\$	71,64		2,00	R\$ 0,00	R\$ 71,64	R\$ 71,64	100,00%
15.12	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	R\$ 83,43	R\$	500,58		6,00	R\$ 0,00	R\$ 500,58	R\$ 500,58	100,00%
15.13	Cadeira articulada para banho	un	2,00	R\$ 1.115,53	R\$	2.231,06			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15.14	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	6,00	R\$ 336,22	R\$	2.017,32		6,00	R\$ 0,00	R\$ 2.017,32	R\$ 2.017,32	100,00%
15.15	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	4,00	R\$ 322,38	R\$	1.289,52		4,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,52	R\$ 1.289,52	100,00%
<b>16</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>				<b>R\$</b>	<b>797,48</b>						
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	2,00	R\$ 259,18	R\$	518,36			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	2,00	R\$ 40,26	R\$	80,52		2,00	R\$ 0,00	R\$ 80,52	R\$ 80,52	100,00%
16.3	Marcação de piso com tinta retrorefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	2,00	R\$ 18,62	R\$	37,24			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16.4	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	4,00	R\$ 40,34	R\$	161,36			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>				<b>R\$</b>	<b>21.525,07</b>						
17.1.1	Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores	un	1,00	R\$ 659,10	R\$	659,10	1,00		R\$ 659,10	R\$ 0,00	R\$ 659,10	100,00%
17.1.2	Quadro de medição	un	1,00	R\$ 95,32	R\$	95,32			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.1.3	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	7,00	R\$ 13,43	R\$	94,01	7,00		R\$ 94,01	R\$ 0,00	R\$ 94,01	100,00%
17.1.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	8,00	R\$ 15,01	R\$	120,08	8,00		R\$ 120,08	R\$ 0,00	R\$ 120,08	100,00%
17.1.5	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00	R\$ 98,94	R\$	197,88	1,00		R\$ 98,94	R\$ 0,00	R\$ 98,94	50,00%
17.1.6	Dispositivo diferencial residual 25A	un	9,00	R\$ 173,29	R\$	1.559,61	8,00		R\$ 1.386,32	R\$ 0,00	R\$ 1.386,32	88,89%
17.1.7	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V	un	4,00	R\$ 148,50	R\$	594,00	4,00		R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00	100,00%
<b>17.2</b>	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>											
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm	m	19,80	R\$ 8,46	R\$	167,51	4,50		R\$ 38,07	R\$ 0,00	R\$ 38,07	22,73%
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm	m	21,69	R\$ 11,12	R\$	241,19	21,00		R\$ 233,52	R\$ 0,00	R\$ 233,52	96,82%
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2")	m	5,00	R\$ 7,45	R\$	37,25	5,00		R\$ 37,25	R\$ 0,00	R\$ 37,25	100,00%
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4")	m	113,35	R\$ 9,13	R\$	1.034,89	113,35		R\$ 1.034,89	R\$ 0,00	R\$ 1.034,89	100,00%
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1")	m	17,54	R\$ 12,89	R\$	226,09			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.2.6	Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1. 1/2")	m	7,02	R\$ 16,79	R\$	117,87			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17.2.7	Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2")	m	23,10	R\$ 25,24	R\$	583,04	3,00		R\$ 75,72	R\$ 0,00	R\$ 75,72	12,99%
17.2.8	Condutete em PVC tipo LB de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 18,00	R\$	90,00	5,00		R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	100,00%
17.2.9	Condutete em PVC tipo TB de 3/4", inclusive acessórios	un	10,00	R\$ 21,41	R\$	214,10	10,00		R\$ 214,10	R\$ 0,00	R\$ 214,10	100,00%
17.2.10	Condutete em PVC tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	R\$ 35,95	R\$	179,75	5,00		R\$ 179,75	R\$ 0,00	R\$ 179,75	100,00%
17.2.11	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	75,00	R\$ 6,58	R\$	493,50	75,00		R\$ 493,50	R\$ 0,00	R\$ 493,50	100,00%
17.2.12	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	16,00	R\$ 6,58	R\$	105,28	16,00		R\$ 105,28	R\$ 0,00	R\$ 105,28	100,00%
17.2.13	Curva 135° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	R\$ 21,05	R\$	42,10	2,00		R\$ 42,10	R\$ 0,00	R\$ 42,10	100,00%
17.2.14	Curva 90° PVC curta rosca 1/2"	un	1,00	R\$ 8,59	R\$	8,59	1,00		R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 8,59	100,00%
17.2.15	Curva 90° PVC longa rosca 1/2"	un	1,00	R\$ 8,59	R\$	8,59	1,00		R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 8,59	100,00%
17.2.16	Curva 90° PVC rosca 1 1/2"	un	2,00	R\$ 21,05	R\$	42,10	2,00		R\$ 42,10	R\$ 0,00	R\$ 42,10	100,00%
17.2.17	Luva PVC rosca 1/2"	un	2,00	R\$ 4,43	R\$	8,86	2,00		R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86	100,00%
17.2.18	Luva PVC rosca 3/4"	un	18,00	R\$ 5,90	R\$	106,20	18,00		R\$ 106,20	R\$ 0,00	R\$ 106,20	100,00%
17.2.19	Luva PVC rosca 1"	un	4,00	R\$ 7,82	R\$	31,28	4,00		R\$ 31,28	R\$ 0,00	R\$ 31,28	100,00%
17.2.20	Luva PVC rosca 1 1/2"	un	5,00	R\$ 13,72	R\$	68,60	5,00		R\$ 68,60	R\$ 0,00	R\$ 68,60	100,00%
17.2.21	Caixa de PVC 4x2	un	16,00	R\$ 9,58	R\$	153,28	15,00		R\$ 143,70	R\$ 0,00	R\$ 143,70	93,75%
17.2.22	Caixa octogonal de PVC 3x3	un	9,00	R\$ 11,30	R\$	101,70	9,00		R\$ 101,70	R\$ 0,00	R\$ 101,70	100,00%
<b>17.3</b>	<b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>											
17.3.1	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	519,26	R\$ 4,08	R\$	2.118,58	519,26		R\$ 2.118,58	R\$ 0,00	R\$ 2.118,58	100,00%
17.3.2	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	179,61	R\$ 6,70	R\$	1.203,39	179,61		R\$ 1.203,39	R\$ 0,00	R\$ 1.203,39	100,00%
17.3.3	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V	m	99,42	R\$ 9,22	R\$	916,65			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>17.4</b>	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>											
17.4.1	Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	R\$ 30,20	R\$	60,40	2,00		R\$ 60,40	R\$ 0,00	R\$ 60,40	100,00%
17.4.2	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa	un	1,00	R\$ 32,84	R\$	32,84	1,00		R\$ 32,84	R\$ 0,00	R\$ 32,84	100,00%
17.4.3	Interruptor simples 10A, com suporte e placa	un	1,00	R\$ 25,66	R\$	25,66	1,00		R\$ 25,66	R\$ 0,00	R\$ 25,66	100,00%
17.4.4	Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa	un	2,00	R\$ 45,20	R\$	90,40	2,00		R\$ 90,40	R\$ 0,00	R\$ 90,40	100,00%
17.4.5	Placa cega de PVC 4x2	un	8,00	R\$ 13,58	R\$	108,64	8,00		R\$ 108,64	R\$ 0,00	R\$ 108,64	100,00%
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa	un	9,00	R\$ 120,26	R\$	1.082,34		9,00	R\$ 0,00	R\$ 1.082,34	R\$ 1.082,34	100,00%
17.4.7	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W	un	20,00	R\$ 425,25	R\$	8.505,00	20,00		R\$ 8.505,00	R\$ 0,00	R\$ 8.505,00	100,00%

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayme de Moraes Silva  
Eng. Civil CRB nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Itaipava/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 413498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911





BM - 10 MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECURSO PRÓPRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.

LOCAL: PAUDALHO/PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÁLCULO							
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
5.1.3			Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4								
				m <sup>2</sup>							
			DIVISÓRIA DO CHUVEIRO	2,00	1,00		1,80		2,00		7,20
			DIVISÓRIA VASO SANITÁRIO	2,00	1,40		1,80		1,00		5,04
			DIVISÓRIA VASO SANITÁRIO (BONECA PAREDE)	2,00	0,20		1,80		2,00		1,44
		DIVISÓRIA VASO SANITÁRIO (BONECA MEIO)	2,00	0,25		1,80		1,00		0,90	
									TOTAL		14,58
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10								14,4
			MEDIR EM ADITIVO								0,18
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
6.1.2			PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças								
			Portas vestiário 1 e 2 - bwc social	un							
				2,00					2,00		4,00
									TOTAL		4,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
6.1.3			PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças								
			Portas vestiário 1 e 2 bwc deficiente	un							
				1,00					2,00		2,00
									TOTAL		2,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
6.2.3			Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm								
				un							
			Portas vestiário 1 e 2 - bwc social	2,00					2,00		4,00
			Portas vestiário 1 e 2 bwc deficiente	1,00					2,00		2,00
									TOTAL		6,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
6.4.1			Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura								
				m <sup>2</sup>							
			VESTIÁRIOS - 1	1,00		2,11	0,80				1,67
			VESTIÁRIOS - 2	1,00		2,09	0,82				1,69
									TOTAL		3,36
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10								2,7
			MEDIR EM ADITIVO								0,66
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
9.3.1			Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação								
				m <sup>2</sup>							
			VESTIÁRIOS - 1 E 2		8,70	3,00			2,00		52,20
			DEPÓSITO		2,00	2,70					5,40
									TOTAL		57,60
			EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10								56,15
			MEDIR EM ADITIVO								1,45
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
10.4			Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural								
			Rampa de acesso a quadra - formato de trapézio	m <sup>2</sup>							
				2,50		2,00	3,00	0,10			0,68
									TOTAL		0,68
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
10.5			Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas								
				m <sup>2</sup>							
			Piso alerta em rampa		0,30	0,30			21,00		1,89
			Piso direcional		0,25	0,25			12,00		0,75
									TOTAL		2,64
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
12.2.8			Engate flexível plástico 1/2" x 30cm								
				un							
			Engates colocados nas pias do vestiário 1 e 2	3,00					2,00		6,00
			Engates colocados nas pias do BWC deficientes	1,00					2,00		2,00
									TOTAL		8,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
15.1			Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios								
				un							
			Bacia no vestiário 1 e 2	2,00					2,00		4,00
			Bacia no BWC deficientes	1,00					2,00		2,00
									TOTAL		6,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
15.2			Válvula de descarga com duplo acionamento								
				un							
			Bacia no vestiário 1 e 2	2,00					2,00		4,00
			Bacia no BWC deficientes	1,00					2,00		2,00
									TOTAL		6,00
				UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL	
15.3			Cuba de embutir oval em louca branca								
				un							
			Bacia no vestiário 1 e 2	3,00					2,00		6,00

								TOTAL	6,00
			UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
15.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un							
	Lavatório no BWC de deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	2,00
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un							
	Pias no vestiário 1 e 2	3,00						2,00	6,00
	Pia no BWC deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	8,00
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un							
	Chuveiros no vestiário 1 e 2	3,00						2,00	6,00
	Chuveiros no BWC deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	8,00
15.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un							
	Papeleira no vestiário 1 e 2	2,00						2,00	4,00
	Papeleira no BWC deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	6,00
15.10	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un							
	Dispenser no vestiário 1 e 2	2,00						2,00	4,00
								TOTAL	4,00
15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolão	m							
	Dispenser papel higiênico no BWC deficiente	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	2,00
15.12	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un							
	Papeleira no vestiário 1 e 2	2,00						2,00	4,00
	Papeleira no BWC deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	6,00
15.14	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un							
	Barra horizontal no BWC deficientes	3,00						2,00	6,00
								TOTAL	6,00
15.15	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un							
	Barra vertical no BWC deficientes	2,00						2,00	4,00
								TOTAL	4,00
16.2	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un							
	Barra vertical no BWC deficientes	1,00						2,00	2,00
								TOTAL	2,00
17.4.6	Luminárias 2x40W de sobrepor completa	un							
	Luminárias vestiário 1 e 2	4,00						2,00	8,00
	Luminária depósito	1,00						1,00	1,00
								TOTAL	9,00
19.1.1	Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²							
	BANCADA (TAMPO) vestiário 1 e 2	2	2,10	0,50					2,10
								TOTAL	2,10
19.1.2	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm	m²							
	BANCO - ENCOSTO	2,00	1,80		1,60			1,00	5,76

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysla Jayne de Moraes Silva  
Eng. CIVIL CRE nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF nº 741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

		BANCO - ACENTO	2,00	1,8	0,46			1,00	1,66
		BANCO - LATERAIS E APOIO CENTRAL	2,00	0,43		0,43		3,00	1,11
								<b>TOTAL</b>	<b>8,53</b>
		EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							4,35
		MEDIR EM ADITIVO							4,18
			UNID/QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	ESP.	UND/TAXA	TOTAL
19.1.6		Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m						
		Colocado na rampa de acesso rua/quadra em dupla altura e dois lados	2,00	2,80				2,00	11,20
								<b>TOTAL</b>	<b>11,20</b>
		EM PLANILHA - MEDIR NESTE BM 10							9,6
		MEDIR EM ADITIVO							1,60

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CRP nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de S. Carneão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 47.498



Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: 10	DATA EMISSÃO: 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



5.1.3 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4

5.1.3 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4

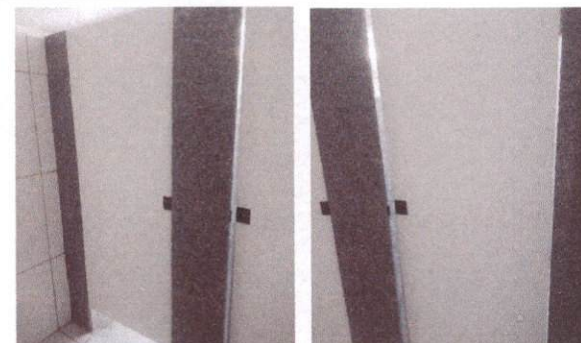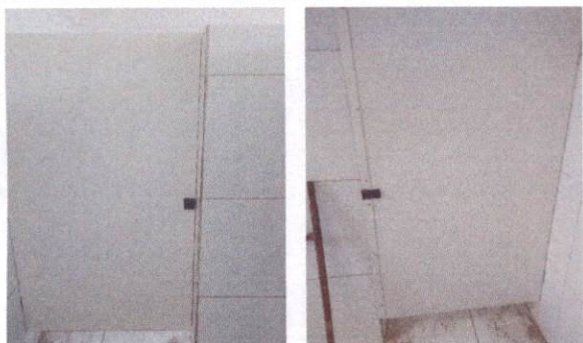

6.1.2/6.2.3 PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças/Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado

6.1.3/6.2.3 PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças/Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado



6.4.1 Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura

6.4.1 Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 067.744.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderci de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: DATA EMISSÃO:	10 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			
				
9.3.1	Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	9.3.1	Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação	
				
10.4	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	10.4	Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural	
				
10.5	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas	12.2.8	Engate flexível plástico 1/2" x 30cm	

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Aysila Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil CREM 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 0570741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandelei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Carlos de Souza  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: DATA EMISSÃO:	10 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			
				
15.1/15.2	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios/Válvula de descarga com duplo acionamento	15.1	Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios/Válvula de descarga com duplo acionamento	
				
15.3	Cuba de embutir oval em louça branca	15.3	Cuba de embutir oval em louça branca	
				
15.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	15.4	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 087.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat.: 48.911

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: DATA EMISSÃO:	10 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHO BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			
				
15.6	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	
				
15.8	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	15.9	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	
				
15.10	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	15.11	Dispenser papel higiênico tipo rolão	

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayme de Moraes Silva  
Eng. Civil CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.441.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. nº 256

Carlos Pinheiro Campos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 49.911



MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: DATA EMISSÃO:	10 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



15.12 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente



15.14 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente



15.14/15.15 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente/Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente



16.2 Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h



17.4.6 Luminárias 2x40W de sobrepor completa



17.4.6 Luminárias 2x40W de sobrepor completa

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Ayslla Jayne de Moraes Silva  
 Eng. CIV. CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Marcelo da Silva Leão e Silva  
 CPF nº 741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

Carlos Pinheiro Góes Gouveia  
 Secretário Municipal de Desenvolvimento  
 Urbano e Agrário  
 Matr.: 48.911

MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO AV. RAUL BANDEIRA 21, CENTRO, PAUDALHO/PE	BM: DATA EMISSÃO:	10 05/10/2023
PREPONENTE PREFEITURA DE PAUDALHO	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL: SINHÔ BANDEIRA - NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE.			



19.1.1 Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm

19.1.1 Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2cm



19.1.2 Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm

19.1.2 Banco em granito cinza andorinha, espessura 2cm



19.1.6 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"

19.1.6 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Ayslla Jayne de Moraes Silva  
Eng. Civil - CREA nº 181726131-2

OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA  
Marcelo de Souza Leão e Silva  
CPF: 007.741.304-07

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat: 48.911

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia  
Secretário Municipal de Desenvolvimento  
Urbano e Agrário  
Mat: 48.911

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 12/06/2023 A 18/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
	Descrição						
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BANCADAS E BANCOS DE GRANITO						
	DESCANSO SEMANAL ( 17 À 18/06/2023)						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysla Jayne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 19/06/2023 E 25/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
	Descrição						
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
	DESCANSO SEMANAL (24 À 25/06/2023)						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysla Jayne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 26/06/2023 A 02/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Descrição							
Pessoal	1 PEDREIRO						
	2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						
	DESCANSO SEMANAL ( 01 À 02/07/2023)						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.499						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 03/07/2023 E 09/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Descrição							
Pessoal	1 PEDREIRO						
	2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	PARALIZAÇÃO DEVIDO A CHUVA						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.499						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 10/07/2023 A 16/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE RAMP						
	DESCANSO SEMANAL (15 À 16/07/2023)						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysila Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 17/07/2023 E 22/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO DE RAMP						
	DESCANSO SEMANAL (22 À 23/07/2023)						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr.: 41.498						
	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysila Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2						
Visto Fiscalização:			Visto Contratada:			Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 24/07/2023 A 31/07/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO						
	DESCANSO SEMANAL (30 À 31/07/2023 )						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 01/08/2023 E 06/08/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO						
	DESCANS SEMANAL 05 À 06/08/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 07/07/2023 A 13/08/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO						
	DESCANSO SEMANAL 12 À 13/08/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 14/08/2023 E 20/08/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:	Prazo Restante:			Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO						
	DESCANSO SEMANAL 19 À 20/08/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysla Janyne Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 21/08/2023 A 27/08/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
	Descrição						
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Execução	PARALIZAÇÃO POR FALTA DE FUNCINARIO						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	
				OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2			

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO				Data: 28/08/2023 E 03/09/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
	Descrição						
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Execução	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DO VESTIÁRIO DESCANSO SEMANAL 01 Á 03/09/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Matr. 41.498						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	
				OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2			



				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 04/09/2023 A 10/09/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Descrição							
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	PARALIZAÇÃO DEVIDO A AUSENCIA DE FUNCIONARIOS						
	DIA 7/09/2023 - FERIADO DESCANSO SEMANAL 09 À 10/09/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498						
	OCEACON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysila Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 11/09/2023 E 17/09/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Descrição							
Pessoal	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DO VESTIÁRIO						
	DESCANSO SEMANAL 16 À 17/09/2023						
Fiscalização	Prefeitura Municipal de Paudalho-PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498						
	OCEACON EMPREENDIMENTOS LTDA Aysila Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 18/09/2023 A 24/09/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO						
	DESCANSO SEMANAL 23 À 24/09/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayme de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 25/09/2023 E 30/09/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	30/09/2023 - APLICAÇÃO DAS PORTAS DE MDF NOS VESTIÁRIOS						
	DESCANSO SEMANAL 30/09/2023						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat. 41.498</p>						
	<p>OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Jayme de Moraes Silva Eng. Civil CREA nº 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 01/06/2023 E 04/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BANCADAS E BANCOS DE GRANITO						
	DESCANSO SEMANAL ( 03À/04/2023)						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.281</p>						
	<p>OCRASON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.				DIARIO DE OBRAS			
<b>ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO</b>				Data: 05/06/2023 E 11/06/2023			
Obra :	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA: SINHÔ BANDEIRA - PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE PAUDALHO-PE.			Tempo	Bom/ Ruim	Chuva Fraca	Chuva Forte
Prazo Decorrido:		Prazo Restante:		Manhã	X		
Horário de Trabalho:				Tarde	X		
Prazo da Obra				Noite			
Pessoal	Descrição						
	1 PEDREIRO 2 SERVENTES 1 MARMORISTA						
Serviços Executados	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BANCADAS E BANCOS DE GRANITO						
	DESCANSO SEMANAL (10 À 11/06/2023)						
Fiscalização	<p>Prefeitura Municipal de Paudalho/PE Paulo Vanderlei de Mendonça Filho Engenheiro Civil Mat.: 41.281</p>						
	<p>OCRASON EMPREENDIMENTOS LTDA Ayslla Janyne de Moraes Silva Eng. Civil CREA n° 181726131-2</p>						
Visto Fiscalização:				Visto Contratada:		Data	
